

	DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ	
	Informe de Seguimiento del PEI	Versión 1.0 17/01/2020

Informe de Seguimiento al Plan Estratégico de Inversiones – PEI

Fecha de inicio periodo informe: **01 de marzo de 2025**

Fecha de terminación periodo informe: **30 de abril de 2025**

No. Informe **2**

1. Justificación

De acuerdo con el Decreto 1425 de 2019, Artículo 2.3.3.1.2.3. Funciones del Gestor, Numeral 14.2. **"Informe bimestral (marzo - abril de 2025)** de la ejecución y seguimiento del Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento y de sus instrumentos de planeación, de acuerdo con el formato y medios que el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio determine para tal fin. En el informe también se señalará el avance del Plan Estratégico de Inversiones, detallando el cumplimiento de los **cronogramas** allí fijados, las **metas** propuestas, el **estado de avance de los proyectos en ejecución** y de los **procesos de contratación**", el Gestor, presenta el siguiente informe a los **Miembros del Comité Directivo del PDA del departamento del Caquetá**.

De conformidad al Decreto 1425 de 2019, Artículo 2.3.3.1.5.3 ítems 6.6 Párrafo Tercero, establece *"La vigencia del Plan Estratégico de Inversiones (PEI) será la misma del periodo de gobierno de las entidades territoriales y del capítulo anual será hasta el 31 de diciembre del año de aprobación"*; Por lo tanto, el PEI 2024-2027, se encuentra en proceso de formulación, conforme lo establece el Decreto en mención.

Es importante mencionar que en razón a las modificaciones realizadas por el MVCT a la metodología de estructuración del PEI 2024 - 2027, se ha presentado el siguiente desarrollo: **1-** En Comité Directivo en sesión virtual No. 51 del 14 de febrero de 2024, se asignan recursos únicamente para los costos del Gestor. Los soportes del PEI, incluidos la proyección de fuentes y el cierre financiero no se les asigno por el momento recursos; **2 –** En Comité Directivo Virtual No.52 de 12 de junio de 2024, se asignaron recursos a los proyectos viabilizados en el Comité Técnico No. 5 del 16 de noviembre del 2023, para la ejecución de los proyectos para los municipios de Albania, Cartagena del Chaira y Solano;; **3 –** En Comité Directivo Virtual No.53 del 04 de julio de 2024, a) Se aprueba el PEI (2024 – 2027) capítulo 2024, **4 –** En Comité Directivo Virtual No.54 de 16 de agosto de 2024, a) Se aprueba la modificación al el PEI (2024 – 2027) capítulo 2024, y b) Se solicita la asignación de recursos para Plan de Gestión Social; **5 –** En Comité Directivo Virtual No.55 del 25 de octubre de 2024, se aprueba la modificación al el PEI (2024 – 2027) capítulo 2024 y **6 –** En . Comité Directivo Virtual No.56 del 13 de diciembre de 2024, a) Se aprueba la modificación al el PEI (2024 – 2027) capítulo 2024, b) Se solicita la aprobación y asignación de recursos al Plan Ambiental, c) Se solicita la aprobación y asignación de recursos al Plan de Gestión del Riesgo y b) Se solicita la aprobación y delegación de contratación a los municipios de El Doncello, San José del Fragua y Solano, como ejecutores de los proyectos aprobados. **7.** En Comité Directivo No. 57 se aprueba: a) Presentación

Informe de Avance del PEI 2024-2027-Capítulo 2025.

Componente	Subcomponente	Valor Comprometido	Municipios		Departamento			Nación	Autoridad Ambiental	Valor Ejecutado Financiero (Expedición de Documento de Compromiso)	Soporte Documento Compromiso	Valor Ejecutado (Pagos Realizados)
			SGP	Otros Recursos	SGP	Regalías Directas 60%	Recursos Propios					
Inversión en Infraestructura	Total Inversión en Infraestructura	34.416.858.060,51	12.561.554.923,15	164.972.924,67	13.227.780.958,76	6.482.378.125,00	205.570.793,41	1.774.600.335,52	CAR	5.623.150.144,00	17976-17977-17978 - 17972-17973-17974-17975- 17979-17980-17981	-
	Infraestructura en AAA	29.628.481.312,91	11.124.941.251,15	-	12.021.161.936,76	6.482.378.125,00	205.570.793,41	-	-	4.373.150.144,00	-	-
	Reformulaciones	2.145.144.053,60	-	164.972.924,67	-	-	-	1.774.600.335,52	-	-	-	-
	Preinversiones	2.493.232.694,00	1.436.613.672,00	-	1.056.619.022,00	-	-	-	-	1.100.000.000,00	17966 -17967 -17968 - 17969 -17970 -17971	-
Aseguramiento de la Prestación	Mecanismo Departamental	150.000.000,00	-	-	150.000.000,00	-	-	-	-	150.000.000,00	-	-
	Total Aseguramiento	975.000.000,00	300.000.000,00	-	675.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Ambiental	Total Ambiental	12.633.798.302,95	330.000.000,00	-	1.200.000.000,00	-	1.938.491.602,95	-	9.165.306.700,00	1.505.673.225,00	17994-17995 - 18057-18058 - 18038-18039	-
	Plan Ambiental	12.633.798.302,95	330.000.000,00	-	1.200.000.000,00	-	1.938.491.602,95	-	9.165.306.700,00	1.505.673.225,00	-	-
Gestión del Riesgo Sectorial	Total Gestión del Riesgo	2.024.613.510,00	694.198.000,00	-	1.330.415.510,00	-	-	-	-	980.000.000,00	-	-
	Gestión Social	350.000.000,00	-	-	350.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL VALOR COMPROMETIDO		50.400.269.873,46	13.885.752.923,15	164.972.924,67	16.783.196.468,76	6.482.378.125,00	2.144.062.396,36	1.774.600.335,52	9.165.306.700,00	8.108.823.369,00	-	-

Costos Gestor		Valor	Fuente	Soportes	Valor Ejecutado Financiero (Expedición de Documento de Compromiso)	Valor Ejecutado (Pagos Realizados)
Costos Gestor	Los Costos del Gestor del PEI Capítulo 2025 se asignan conforme a la Aprobación del Gobernador o Gobernadora del Departamento de Cauca, de acuerdo con lo establecido en el ARTICULO 2.3.3.1.5.3. Plan Estratégico de Inversiones (PEI) del Decreto 1077 de 2015 Es pertinente manifestar que de acuerdo a lo establecido en dicho artículo, en caso de que el porcentaje de los Costos Gestor supere el 5%, la certificación de aprobación de los Costos Gestor para la vigencia suscrita por el Gobernador, deberá contener una justificación motivada que contenga el detalle de las acciones que generan un mayor costo, el cual debe estar relacionado con las funciones del Gestor, metas y cronograma establecidos para la respectiva vigencia así como las particularidades presentes en cada territorio.		1.800.000.000,00	SGP DPTO	Certificación Aprobación de Costos Gestor Capítulo 2025 Suscrita por el Gobernador del Departamento de Cauca Fecha 07/01/2025	1.800.000.000,00
					Certificación Cumplimiento de Costos Gestor Capítulo 2024 Suscrita por el Gobernador del Departamento de Cauca Supervisor del Gestor del PDA Fecha 07/01/2025	\$-

2. Informe Financiero marzo – abril de 2025.

2.2. Aportes del bimestre marzo – abril de 2025.

En el Seguimiento a los recursos enmarcados en el plan departamental de agua, con respecto a los Aportes del Sistema de Participaciones para Agua Potable y Saneamiento Básico (SGP-APSB):

DEPARTAMENTO MUNICIPIO	RECAUDO VIGENCIA 2024
DEPARTAMENTO	568.905.753,00
ALBANIA	0,00
BELEN DE LOS ANDAQUIES	0,00
CARTAGENA DEL CHAIRA	0,00
CURILLO	0,00
EL DONCELLO	0,00
EL PAUJIL	0,00
FLORENCIA	0,00
LA MONTAÑITA	0,00
MILAN	0,00
MORELIA	150.000.000,00
PUERTO RICO	0,00
SAN JOSE DEL FRAGUA	00,00
SAN VICENTE DEL CAGUAN	0,00
SOLANO	43.015.192,00
SOLITA	0,00
VALPARAISO	0,00

(Componente Financiero PEI, 2025 – PDA Caquetá)

2.2. Informe de Rendimientos Financieros a marzo de 2025.

El Patrimonio Autónomo FIA, encargado de gestionar, administrar y reportar la asignación de rendimientos Financieros a cada Fideicomitente, Directo o Indirecto, de conformidad con las políticas establecidas para tal fin, reporta informes para el mes de marzo del 2025, de la siguiente manera, puesto que a la fecha del presente informe el consorcio no ha reportado el mes de abril de 2025:

DPTO/MUNICIPIO	MARZO 2025
DEPARTAMENTO SGP	127.075.475,34
NACION AUDIENCIAS	21.340.850,98
DEPARTAMENTO RECURSOS PROPIOS	10.702.510,51
ALBANIA	7.491.553,72
BELEN DE LOS ANDAQUIES	4.509.074,54
CARTAGENA DEL CHAIRA	11.397.836,19
CURILLO	4.828.988,10

EL DONCELLO	3.683.355,16
EL PAUJIL	678.377,02
FLORENCIA	24.193.659,40
LA MONTAÑITA	4.357.960,97
MILAN	3.958.338,33
MORELIA	5.794.929,36
MORELIA RECURSOS PROPIOS	1.035.213,02
PUERTO RICO	6.562.354,06
SAN JOSE DEL FRAGUA	3.833.470,42
SAN VICENTE DEL CAGUAN	3.835.673,20
SOLANO	23.815.872,65
SOLITA	5.794.784,17
VALPARAISO	6.351.663,51

(Componente Financiero PEI, 2025 – PDA Caquetá)

2.3. CDRs Emitidos durante la vigencia 2024

DESCRIPCION EMPRESA	NUMERO DE CDR	TIPO DE GASTO	VALOR FINAL CDR	DESCRIPCION DEL CDR
CAQUETA	17966	PRE-INVERSION	\$300.000.000,00	ACTUALIZACIÓN Y AJUSTE DE LA FORMULACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA BOCATOMA Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SOLANO, DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ.
SOLANO-CAQUETA	17967	PRE-INVERSION	\$255.555.556,00	ACTUALIZACIÓN Y AJUSTE DE LA FORMULACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA BOCATOMA Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SOLANO, DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ.
SOLANO-CAQUETA	17968	INTERVENTORIA	\$44.444.444,00	INTERVENTORIA A LA ACTUALIZACIÓN Y AJUSTE DE LA FORMULACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA BOCATOMA Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SOLANO, DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ.
CAQUETA	17969	PRE-INVERSION	\$165.000.000,00	ACTUALIZACIÓN Y AJUSTE DE LA FORMULACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN ETAPA UNO DEL COLECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO SOBRE LA RIVERA DE LA QUEBRADA LA SARDINA, MUNICIPIO DE FLORENCIA, DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ.
FLORENCIA - CAQUETA	17970	PRE-INVERSION	\$300.000.000,00	ACTUALIZACIÓN Y AJUSTE DE LA FORMULACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN ETAPA UNO DEL COLECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO SOBRE LA RIVERA DE LA QUEBRADA LA SARDINA, MUNICIPIO DE FLORENCIA, DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ.
CAQUETA	17971	INTERVENTORIA	\$35.000.000,00	INTERVENTORIA A LA ACTUALIZACIÓN Y AJUSTE DE LA FORMULACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN ETAPA UNO DEL COLECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO SOBRE LA RIVERA DE LA QUEBRADA LA SARDINA, MUNICIPIO DE FLORENCIA, DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ.
CAQUETA	17972	INVERSION	\$550.869.752,26	REPOSICIÓN PARCIAL DEL ALCANTARILLADO BARRIO OASIS DEL MUNICIPIO DE PUERTO RICO -CAQUETÁ
PUERTO RICO - CAQUETA	17973	INVERSION	\$50.649.423,74	REPOSICIÓN PARCIAL DEL ALCANTARILLADO BARRIO OASIS DEL MUNICIPIO DE PUERTO RICO -CAQUETÁ
CAQUETA	17974	INTERVENTORIA	\$49.130.247,74	INTERVENTORIA A LA REPOSICIÓN PARCIAL DEL ALCANTARILLADO BARRIO OASIS DEL MUNICIPIO DE PUERTO RICO -CAQUETÁ
PUERTO RICO - CAQUETA	17975	INTERVENTORIA	\$4.517.254,26	INTERVENTORIA A LA REPOSICIÓN PARCIAL DEL ALCANTARILLADO BARRIO OASIS DEL MUNICIPIO DE PUERTO RICO -CAQUETÁ
CAQUETA	17976	INVERSION	\$1.516.315.956,78	OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ALCANTARILLADO URBANO EN EL MUNICIPIO DE ALBANIA DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
ALBANIA	17977	INVERSION	\$272.255.472,22	OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ALCANTARILLADO URBANO EN EL MUNICIPIO DE ALBANIA DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
CAQUETA	17978	INTERVENTORIA	\$89.428.571,00	INTERVENTORIA A LA OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ALCANTARILLADO URBANO EN EL MUNICIPIO DE ALBANIA DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ

CAQUETA	17979	INVERSION	\$1.679.610.716,00	OPTIMIZACIÓN TRAMOS DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE MORELIA DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
MORELIA	17980	INVERSION	\$40.000.000,00	OPTIMIZACIÓN TRAMOS DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE MORELIA DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
CAQUETA	17981	INTERVENTORIA	\$120.372.750,00	INTERVENTORIA A LA OPTIMIZACIÓN TRAMOS DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE MORELIA DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
CAQUETA	17994	INVERSION	\$800.000.000,00	ADQUISICIÓN DE VEHICULO COMPACTADOR RECOLECTOR DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ
SAN VICENTE DEL CAGUAN	17995	INVERSION	\$175.673.225,00	ADQUISICIÓN DE VEHICULO COMPACTADOR RECOLECTOR DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ
CAQUETA	18037	ESTRUCTURA OPERATIVA	\$1.800.000.000,00	COSTOS DEL GESTOR CAPÍTULO 2025
CAQUETA	18038	OTROS	\$200.000.000,00	FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE APROVECHAMIENTO DEL PGIRS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA
SAN JOSE DE LA FRAGUA	18039	OTROS	\$30.000.000,00	FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE APROVECHAMIENTO DEL PGIRS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA
CAQUETA	18047	PRE-INVERSION	\$150.000.000,00	IMPLEMENTACIÓN DEL MECANISMO DEPARTAMENTAL DE VIABILIZACIÓN DE PROYECTOS
CAQUETA	18052	INVERSION	\$427.909.407,00	DESARROLLO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DEL RIESGO POR EL DESABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA BOCATOMA SOBRE LA QUEBRADA LAS MARGARITAS LÍNEA DE ADUCCIÓN Y PTAP LOS NARANJOS DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
LA MONTAÑITA	18053	INVERSION	\$479.498.000,00	DESARROLLO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DEL RIESGO POR EL DESABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA BOCATOMA SOBRE LA QUEBRADA LAS MARGARITAS LÍNEA DE ADUCCIÓN Y PTAP LOS NARANJOS DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
CAQUETA	18054	INTERVENTORIA	\$72.592.593,00	INTERVENTORIA AL DESARROLLO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DEL RIESGO POR EL DESABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA BOCATOMA SOBRE LA QUEBRADA LAS MARGARITAS LÍNEA DE ADUCCIÓN Y PTAP LOS NARANJOS DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
CAQUETA	18057	PRE-INVERSION	\$200.000.000,00	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS AMBIENTALES PARA EL TRÁMITE DE LA LICENCIA AMBIENTAL DEL PROYECTO -CONSTRUCCIÓN DEL RELLENO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE CARTAGENA DEL CHAIRÁ DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ-
CARTAGENA DEL CHAIRA	18058	PRE-INVERSION	\$100.000.000,00	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS AMBIENTALES PARA EL TRÁMITE DE LA LICENCIA AMBIENTAL DEL PROYECTO -CONSTRUCCIÓN DEL RELLENO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE CARTAGENA DEL CHAIRÁ DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ-

(Componente Financiero PEI, 2024 – PDA Caquetá)

3 COMPONENTE DE ASEGURAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

En relación al proyecto Plan de Aseguramiento de Calidad de Agua "PACA", que fue aprobado en el 2018, por el MVCT, me permito allegar un informe que permita visibilizar el estado de la ejecución de los ocho (8) programas del PACA, teniendo en cuenta que no se ha dado cierre al mismo.

A continuación, se relacionan los programas que comprenden el PACA:

1. Programa de capacitación y Asistencia Técnica a los prestadores de servicio de acueducto. (3.1.1)
2. Programa de implementación de un equipo básico de control de calidad de agua. (3.1.2)
3. Programa de optimización del equipamiento de las PTAP. (3.1.3)
4. Programa de optimización de sistemas de desinfección en las PTAP. (3.1.4)
5. Programa de optimización de sistema de dosificación de químicos (coagulantes y ayudantes de coagulación y/o estabilizadores de pH), para las PTAP convencionales. (3.1.5)
6. Programa de instalación de macro medición en las PTAP. (3.1.6)

	DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ	
	Informe de Seguimiento del PEI	Versión 1.0 17/01/2020

7. Programa de optimización de puntos de toma de muestras concertados en red de distribución. **(3.1.7)**
8. Programa de análisis de laboratorios fisicoquímicos y bacteriológicos para seguimiento y control de calidad de agua. **(3.1.8)**

Respecto a su ejecución y desarrollo, se consolido la información en la tabla 1.

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL AGUA - PACA.

PROGRAMA/SUBPROGRAMAS PACA	APROBADO PACA	CONTRATISTA	VALOR EJECUTADO	SALDO	VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO
3.1.1. Programa de Capacitación y Asistencia Técnica a los prestadores de Servicio de Acueducto	52.500.000,00		89.750.000,00	-37.250.000,00	
3.1.1.1. Subprograma de capacitación para operarios de planta de tratamiento.		María Angélica Losada Olarte	81.000.000,00		OK
3.1.1.2. Subprograma de capacitación para fontaneros		María Angélica Losada Olarte			OK
3.1.1.3. Subprograma de certificación en competencias laborales para operarios de acueducto		María Elza Morales García	8.750.000,00		OK
		María Elza Morales García		22.500.000,00	OK
3.1.2. Programa de Implementación equipo básico de control de calidad de agua	449.724.871,00		43.812.896,00	405.911.975,00	
3.1.2.1. Subprograma de mantenimiento y calibración externa de equipos existentes	43.812.896,00	CM y CIA Compañía Limitada	43.812.896,00		OK
3.1.2.2. Subprograma dotación kit básico de laboratorio	405.911.975,00	INGEODER PHARMA	491.521.838	54.950.360,36	EN EJECUCION
3.1.3. Programa de optimización del equipamiento de las PTAP	1.554.292.800,00	UTP PACA 2019	1.475.808.669,40	78.484.130,60	
Reposición de válvulas					OK
Reposición de módulos de sedimentación					
Reposición de lechos filtrantes					
3.1.4. Programa de optimización de sistemas de desinfección en las PTAP	306.450.000,00	UTP PACA 2019	326.053.080,60	-19.603.080,60	
3.1.4.1. Instalación de sistema de cloración de solución al vacío para la dosificación de gas cloro					OK
3.1.4.2. Instalación de bomba dosificadora para cloración con hipoclorito de calcio en solución					
3.1.4.3. Dotación de elementos de seguridad personales y colectivos para el manejo del cloro					

	DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ	
	Informe de Seguimiento del PEI	Versión 1.0 17/01/2020

3.1.5. Programa de optimización de sistema dosificación de químicos (coagulantes y ayudantes de coagulación y/o estabilizadores de pH), para las PTAP convencionales.	262.536.000,00		175.045.000,00	87.491.000,00	
3.1.5.1. Realización de pruebas de tratabilidad		EN EJECUCIÓN		45.040.310,00	OK
3.1.5.2. Dotación de sistema de dosificación de productos químico		UTP PACA 2019	175.045.000,00		OK
3.1.6. Programa de macromedición para las PTAP	699.840.000,00	UTP PACA 2019	595.218.000,00	104.622.000,00	
Instalación de macromedición en entradas y salidas de las PTAP			595.218.000,00		OK
3.1.7. Programa de optimización de puntos de toma de muestras concertados en red de distribución	280.000.000,00		250.000.000,00	30.000.000,00	
construcción de puntos de toma de muestras concertados		CONTRATAR SAS	250.000.000,00		OK
3.1.8. Programa de análisis de laboratorios fisicoquímicos y microbiológicos para seguimiento y control de calidad de agua, en laboratorio autorizado por INS.	173.905.000,00	SERVAF S.A. E.S.P	147.116.992,36	26.788.007,64	OK
Interventoría a programas de: optimización del equipamiento de las PTAP, sistemas de desinfección en las PTAP, optimización de sistemas de dosificación de químicos para las PTAP convencionales (subprograma dotación de sistemas de dosificación de productos químicos) y macro medición.		JOSE MAURICIO ESPINEL GARNICA	166.972.800,00		OK

De acuerdo a lo anterior, el único programa pendiente por ser ejecutado es:

3.1.2. PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE UN EQUIPO BÁSICO DE CONTROL DE CALIDAD DE AGUA.

Actualmente, este proceso se encuentra contratado bajo la modalidad de compraventa N° 202400001078, con el número de proceso DC-PDA-SIE-022-2024. El acta de inicio fue suscrita el 23 de enero de 2025 con la empresa INGEODER PHARMA S.A.S., estableciéndose un plazo de ejecución de 5 meses, hasta el 23 de junio de 2025. La supervisión del contrato está siendo realizada por el Plan Departamental de Agua ya fueron programadas las visitas de entrega y capacitación.

Realizar acompañamiento al Gestor PDA Caquetá en la asistencia técnica operativa de fortalecimiento, mejoramiento, monitoreo y control de los sistemas de potabilización de agua para los prestadores de servicios públicos vinculados a PDA Caquetá.

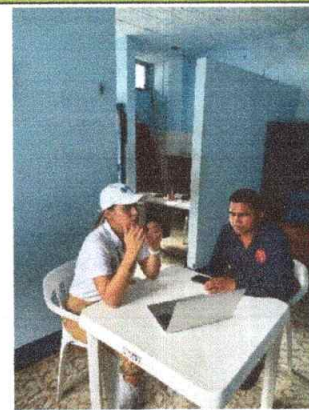
- El objetivo de realizar asistencias técnicas operativas a las E.S.P de los Municipios del Departamento, es identificar falencias y/o debilidades en el proceso de potabilidad y/o en el funcionamiento operativo de la PTAP, con el fin de apoyar a los prestadores en la atención de las mismas, proponiendo alternativas y soluciones a corto plazo, y de ser posible, de manera

inmediata para mitigar alteraciones en la calidad de agua, que afecten la prestación del Servicio. Durante el mes de marzo y abril se realizaron las siguientes asistencias:

PERIODO	ACTIVIDAD REALIZADA	IMAGENES
MARZO DEL 2025	a) Asistencia técnica a la Empresa de Servicios Públicos del municipio de Paujil EMSEPAUJIL S.A. E.S.P. b) Asistencia técnica a la Empresa de Servicios públicos del municipio de Curillo ESERCU S.A E.S.P.	
ABRIL DEL 2025	a) Asistencia técnica a la Empresa de Servicios públicos del municipio de Curillo ESERCU S.A E.S.P. b) Asistencia técnica a la Empresa prestadora de los servicios públicos domiciliarios de acueducto alcantarillado y aseo del municipio de Valparaíso Caquetá AGUASVALP S.A.S E.S.P.	

Realizar acompañamiento al Gestor PDA Caquetá en las capacitaciones a los municipios y operadores de los servicios públicos en lo concerniente a la operación de los sistemas de Tratamiento de Agua Potable y Aguas Residuales.

Durante el mes de marzo y abril se realizaron las siguientes Capacitaciones técnico operativas:

PERIODO	ACTIVIDAD REALIZADA	IMAGENES
MARZO DEL 2025	a) Se realizó capacitación técnica operativa a personal operativo de la Empresa de Servicios Públicos del municipio de Paujil EMSEPAUJIL S.A.E.S.P. acerca del Proceso de Potabilización del Agua para consumo humano. b) Se realizó capacitación técnica operativa a personal operativo de La Empresa de Servicios Públicos de El Doncello acerca del "Marco Legal del Agua para consumo humano". c) Se realizó capacitación técnica operativa a personal operativo de La Empresa de Servicios Públicos de El Doncello acerca del Proceso de Potabilización del Agua para consumo humano	

ABRIL DEL 2025	a) Se realizó capacitación técnica operativa a la gerente y al personal operativo de Empresa prestadora de los servicios públicos domiciliarios de acueducto alcantarillado y aseo del municipio de Valparaíso Caquetá AGUASVALP S.A.S E.S.P b) Se realizó capacitación técnica operativa virtual al personal operativo pendiente por certificarse en competencias laborales de Empresa prestadora de los servicios públicos domiciliarios de acueducto alcantarillado y aseo del municipio de Valparaíso Caquetá AGUASVALP S.A.S E.S.P con el siguiente temario: Proceso de Potabilización del Agua para consumo humano c) Se realizó capacitación técnica operativa al personal operativo pendiente por certificarse en competencias laborales de Empresa de servicios de Curillo ESERCU S.A E.S.P con el siguiente temario: Proceso de Potabilización del Agua para consumo humano d) Se realizó capacitación técnica operativa al personal operativo pendiente por certificarse en competencias laborales de Empresa de servicios de Curillo ESERCU S.A E.S.P con el siguiente temario: Marco legal de agua potable	
---------------------------	---	---

ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

RESULTADOS			
Se logró coordinar la logística y brindar acompañamiento a espacios de aprendizaje y aseguramiento para la prestación de los servicios públicos del AAA, como las que se ilustran a continuación:			
TEMA	MUNICIPIO	PARTICIPANTES	REGISTRO FOTOGRÁFICO
El propósito de la reunión fue brindar asistencia técnica a la gerencia de la empresa ESERCU S.A. con el fin de fortalecer sus capacidades y, de esta manera, contribuir al aseguramiento en la prestación de los servicios, con base en el estudio de los indicadores sectoriales y del nivel de riesgo (IUS) establecido por la Superintendencia de Servicios Públicos	Curillo	Gerente empresa de Servicios Públicos	

RESULTADOS

Se logró coordinar la logística y brindar acompañamiento a espacios de aprendizaje y aseguramiento para la prestación de los servicios públicos del AAA, como las que se ilustran a continuación:

Fortalecimiento institucional y diagnóstico a la empresa de servicios públicos del municipio de El Paujil Caquetá EMSERPAUJIL S.A. E.S.P. al nuevo gerente, sobre, cargue al SUI, funciones del PDA y proyectos priorizados vigencia 2024-2027	El Paujil	Gerente empresa de Servicios Públicos	
Fortalecimiento institucional a EMSERVALP S.A. E.S.P., enfocándonos en aspectos comerciales, operativos y la revisión de indicadores sectoriales para optimizar su gestión y mejorar la prestación de servicios.	Valparaíso	Gerente empresa de Servicios Públicos	
Fortalecimiento institucional en Aguas del Fragua, E.S.P. Se centró en aspectos comerciales, operativos y la revisión de indicadores sectoriales, buscando optimizar la gestión y mejorar la calidad del servicio.	San José del Fragua	Gerente empresa de Servicios Públicos	

(Aseguramiento, 2025)

OK

PROYECTOS

Proyectos Viabilizados.

Municipio	Nombre del Proyecto/Actividad	Número de Comité	Servicio(s)	Ubicación	Valor (Pesos)	Valor por Fuente			Fecha de Presentación al Comité Técnico	Estado
						Municipio	Departamento	Nación	Otro	
Albania	Construcción Tanque de Almacenamiento de Agua Potable para el municipio de Albania.	Comité Técnico 05	Acueducto	Urbano	1.324.561.409	553.561.409	771.000.000			16 de noviembre de 2023
Cartagena del Chairá	Construcción de Alcantarillado Pluvial Para Recolección de Aguas Lluvias Provenientes de los barrios Camilo Torres, Villa Chaira y Gailán del municipio de Cartagena del Chairá departamento del Cauca	Comité Técnico 05	Alcantarillado	Urbano	1.129.913.510	1.000.000.000	129.913.510			16 de noviembre de 2023
Solano	Construcción del Relleno Sanitario y Obras Complementarias en el municipio de Solano – Cauca Fase 1	Comité Técnico 05	Aseo	Urbano	1.299.265.979	1.299.265.979	0			16 de noviembre de 2023
Curillo	Construcción de Alcantarillado Sanitario entre las calles 9ª al 11 y entre las carreras del 2º al 4º del municipio.	Comité Técnico 01	Alcantarillado	Urbano	667.603.489	393.987.677	273.615.812			02 de octubre de 2024
Milán	Adecuación y Canalización de Aguas Lluvias en la Calle 4, entre Cra 2 a la Cra 6, del casco urbano de la inspección de San Antonio de Getachá, en el municipio de Milán, departamento del Cauca.	Comité Técnico 01	Alcantarillado	Urbano	1.057.248.000	555.248.000	502.000.000			02 de octubre de 2024
San José del Fragua	Construcción Celda de Disposición Final Relleno Sanitario El Cairo, municipio de San José del Fragua.	Comité Técnico 02	Aseo	Urbano	929.730.612	529.730.612	400.000.000			31 de octubre de 2024
Solano	Adquisición de Vehículo Compactador Recolector de Residuos Sólidos para el municipio de Solano departamento del Cauca.	Comité Técnico 02	Aseo	Urbano	975.673.225	500.000.000	475.673.225			31 de octubre de 2024
Albania	Optimización de las Redes de Distribución de Alcantarillado Urbano en el municipio de Albania, departamento del Cauca	Comité Técnico 03	Alcantarillado	Urbano	1.878.000.000	272.255.472,22	1.605.744.527,78			23 de diciembre de 2024
San Vicente del Caguán	Adquisición de Vehículo Recolector de Residuos Sólidos para la Prestación del Servicio Público de Aseo en el municipio de San Vicente del Caguán del departamento de Cauca	Comité Técnico 03	Aseo	Urbano	975.673.225	175.673.225	800.000.000			23 de diciembre de 2024
La Montañita	Desarrollo Ejecución de Obras de Mitigación del Riesgo por el Desabastecimiento de Agua	Comité Técnico 03	Acueducto	Urbano	980.000.000	479.498.000	500.502.000			23 de diciembre de 2024

[illegible]

Proyectos en Proceso de Contratación.

Municipio	Nombre del Proyecto/Actividad	Estado	Servicio(s)	Ubicación	Valor (Pesos)	Fuente(s)	Fecha de Publicación en el SECOP	Observaciones
San Vicente del Caguán Caquetá	Adquisición de Vehículo Compactador Recolector de Residuos Sólidos para el municipio de San Vicente del Caguán, departamento de Caquetá.	verificación de requisitos habilitantes	Aseo	Urbano	975.673.225	Componente en Infraestructura en Agua y Saneamiento PA FIA - SGP - Agua Potable y Saneamiento Básico	09/04/2025	
Solano	Realizar la Interventoría Integral, la cual efectuará el seguimiento de los aspectos Contractuales, Técnicos, Administrativos, Financieros, Sociales y Ambientales al Contrato de Obra cuyo Objeto es: "Construcción del Relleno Sanitario y Obras Complementarias en el municipio de Solano departamento del Caquetá Fase	contrato celebrado	Aseo	Urbano	85.019.003	Componente de la prestación de los servicios de agua y saneamiento y desarrollo institucional. Plan de aseguramiento de calidad de agua "PACA"	18/03/2025	Se encuentra en cumplimiento de requisitos de ejecución del contrato.
san José del Fragua	Realizar la Interventoría Integral, la cual efectuará el seguimiento de los aspectos Contractuales, Técnicos, Administrativos, Financieros, Sociales y Ambientales al Contrato de Obra cuyo Objeto es: Construcción Celda Disposición Final Relleno Sanitario El Cairo, municipio de San José del Fragua.	Contrato celebrado	Aseo	Urbano	68.868.934	Componente en Infraestructura en Agua y Saneamiento PA FIA - SGP - Agua Potable y Saneamiento Básico	21/03/2025	Se encuentra en cumplimiento de requisitos de ejecución del contrato.

Proyectos en Ejecución y/o Suspendidos

Municipio(s)	Nombre del Proyecto/Actividad	Estado	Ubicación	Valor Contratado	Valor Adiciones	% de Ejecución	Avance Financiero	No de Prórrogas	No de Suspensiones	Fecha de Terminación (Real o Estimado)
San José del Fragua	Realiza la Interventoría Técnica, Administrativa y Financiera al Contrato que tiene por Objeto "Reposición y Mejoramiento de la Segunda Etapa de la Red de Alcantarillado Sanitario de la Inspección de Fragua municipio de San José del Fragua, Caquetá"	Proceso de Liquidación	Urbano	46.300.144,5	0	100%	0%	0	0	26/12/2023
Albania	Construcción de Box Coulvert 2.00 X 1.50 m en el barrio Villa Demo, Calle 1ra y 2da sur del municipio de Albania, departamento de Caquetá	Liquidado	Rural	554.237.748	0	100%	86,72%	0	0	16/11/2023
Albania	Realizar la Interventoría Técnica, administrativa y Financiera al contrato que tiene por Objeto "Construcción de Box Coulvert 2.00 X 1.50 m - barrio Villa Demo calle 1ra y 2da sur del municipio de Albania, departamento de Caquetá	Liquidado	Rural	41.626.200	0	100%	0%	0	0	16/11/2023
Belén de los Andaquíes	Optimización del Sistema de Acueducto (Adecuación Bocatoma, Desarenador, Cambio Red de Conducción, Adecuación PTAP) para el municipio de Belén de los Andaquíes – Caquetá	Suspendido	Urbano	1.973.850.210	984.238.953	84%	79%	3	4	20/07/2025
Belén de los Andaquíes	Interventoría para la Optimización del Sistema de Acueducto (Adecuación Bocatoma, Desarenador, Cambio de Red de Conducción, Adecuación PTAP) para el municipio de Belén de los Andaquíes. - Caquetá	Suspendido	Urbano	157.862.574	78.840.401	84%	58%	3	4	20/07/2025
Milán	Construcción del Acueducto Incluye PTAP de San Antonio de Getutchá - municipio de Milán - departamento del Caquetá	Liquidado	Rural	1.735.052.751	0	100%	0%	3	2	20/12/2023
Milán	Interventoría Integral (Técnica, Administrativa, Contable, Financiera, Jurídica y Ambiental) al Contrato de obra que tiene por Objeto: "Construcción del Acueducto Incluye PTAP de San Antonio de Getutchá - municipio de Milán - departamento del Caquetá	Liquidado	Rural	93.677.847	0	100%	0%	3	2	20/12/2023
Valparaiso	Interventoría Integral (Técnica, Administrativa, Financiera, Contable y Jurídica) del contrato que tiene por Objeto "Optimización del Sistema de Acueducto para el casco urbano del municipio de Valparaiso – Caquetá	Liquidado	Rural	110.148.311	0	100%	100%			06/10/2022

Municipio(s)	Nombre del Proyecto/Actividad	Estado	Ubicación	Valor Contratado	Valor Adiciones	% de Ejecución	Avance Financiero	No de Prorrogas	No de Suspensiones	Fecha de Terminación (Real o Estimado)
Florencia	Mejoramiento de la Calidad de Vida de la Población Vulnerable de Florencia en el departamento del Cauquetá, a través de la Ampliación del Sistema de Acueducto para los barrios: Villa Clara, Nápoles, Villa Real y El Timmy. Florencia.	En ejecución	Urbano	8.178.120.849	0	59%	44,46%	2	1	17/08/2025
Florencia	Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera y Ambiental al contrato de Obra Civil que tiene por Objeto "El Mejoramiento de la Calidad de Vida de la Población Vulnerable de Florencia en el departamento del Cauquetá, a través de la Ampliación del Sistema de Acueducto para los barrios: Villa Clara, Nápoles, Villa Real y El Timmy – Cauquetá.	En ejecución	Urbano	817.839.648	0	59%	44,46%	2	1	17/08/2025
Florencia	Interventoría Integral (Técnica, Administrativa, Contable, Jurídica y Ambiental) Al Contrato de Obra que por Objeto: Construcción de Box Couvert de Canal Cerrado en el Caño Brisas del Hacha ubicado en la Comuna Norte del municipio de Florencia, Cauquetá.	Liquidado	Urbano	252.381.150	126.190.575	100%	90,49%	4	4	08/10/2021
Florencia	Realizar los Estudios y Diseños para la Construcción del Sistema de Alcantarillado del Barrio La Esmeralda del municipio de Florencia, departamento del Cauquetá	Liquidado	Urbano	55.000,000	0	100%	100%	1	1	31/10/2024
La Montañita	"Construcción de la Red de Distribución de Agua Potable barrio Las Palmas en el municipio de La Montañita Cauquetá"	Liquidado	Urbano	584.457.962	0	100%	0%	0	2	09/02/2024
La Montañita	Realizar Interventoría Técnica, Administrativa y Financiera al Contrato que tiene por Objeto "Construcción de la Red de Distribución de Agua Potable barrio Las Palmas en el municipio de La Montañita Cauquetá"	Proceso de Liquidación	Urbano	58.295.125.00	0	100%	0%	0	2	09/02/2024
Morelia	Construcción Red de Acueducto y Planta de Tratamiento de Agua Potable para el casco urbano del municipio de Morelia - departamento de Cauquetá	Ejecución	Urbano	3.500.000.000	0	97,5%	86,1%	3	0	22/05/2025
Morelia	"Interventoría Integral Técnica, Administrativa, Financiera, Contable, Jurídica y Ambiental al Contrato de Obra cuyo Objeto es "Construcción Red de Acueducto y Planta de Tratamiento de Agua Potable para el casco urbano del municipio de Morelia - departamento de Cauquetá"	Ejecución	Urbano	332.343.200	0	94,4%	0%	3	0	22/05/2025

Municipio(s)	Nombre del Proyecto/Actividad	Estado	Ubicación	Valor Contratado	Valor Adiciones	% de Ejecución	Avance Financiero	No de Prórrogas	No de Suspensiones	Fecha de Terminación (Real o Estimado)
Morelia	Realizar la Interventoría, Técnica, Jurídica, Administrativa y Contable del Contrato que tiene por objeto: Construcción de Tramos de Alcantarillado en el municipio de Morelia, departamento de Cauquetá.	Ejecución	Urbano	98.313.249	0	100%	0%	1	0	28/02/2025
Belén de los Andaquíes	Realizar Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental al contrato que tiene por objeto "Reposición del sistema de alcantarillado del Centro Poblado Rural Puerto Torres del municipio de Belén de los Andaquíes-Cauquetá"	Liquidado	Rural	38.297.047	0	100%	100%	0	0	28/02/2025

Proyectos en Proceso de Incumplimiento

Municipio(s)	Nombre del Proyecto/Actividad	Estado	Ubicación	Valor (Pesos)	% de Ejecución	Fecha de Terminación (Real o Estimado)	Inconveniente Presentado
Curillo	Construcción de la Celda No. 3 y Obras Complementarias en el Relleno Sanitario para la Disposición Final de los Residuos Sólidos Ordinarios Generados en la cabecera municipal de Curillo	En proceso de incumplimiento	Urbano	\$1.283.948.626			Se solicitó proceso de presunto incumplimiento.
Curillo	Interventoría Integral (Técnica, Administrativa, Contable, Jurídica y Ambiental) al contrato de obra que tiene por objeto: "Construcción de la Celda No. 3 y Obras Complementarias en el Relleno Sanitario para la Disposición Final de los Residuos Sólidos Ordinarios Generados en la cabecera municipal de Curillo"	En proceso de incumplimiento	Urbano	\$ 102.715.890,0			Se solicitó proceso de presunto incumplimiento.
Curillo, Albania, Belén de los Andaquíes y Cartagena del Chairá	Estudios de Factibilidad y Diseños para la Optimización del Sistema de Alcantarillado, Manejo de Aguas Lluvias y Diseño del Sistema de Tratamiento para Aguas Residuales Domésticas para el Casco Urbano de los municipios de Curillo, Albania, Belén de los Andaquíes y Cartagena del Chairá	En proceso de liquidación	Urbano	Consultoría \$1.463.702.701 Interventoría \$102.459.190,0	93,24%	24/7/2023	Mediante resoluciones 000187 del 07/02/2025 y 000698 del 14/04/2025 emitidas por el departamento jurídico de la Gobernación del Cauquetá se declaró que los contratistas no cumplieron, los contratos de consultoría e interventoría se encuentran en etapa de liquidación.
Morelia, San José del Fraagua, Solano y Valparaiso	Realizar la Interventoría Técnica, Administrativa y Financiera a la Consultoría de Estudios y Diseños de Proyectos en el Marco del Programa Agua para la Prosperidad - Plan Departamental de Agua del Cauquetá.	En proceso de pago Judicial.	Urbano	70'234.519.0			

6. COMPONENTE AMBIENTAL Y GESTIÓN DEL RIESGO.

El componente ambiental y de gestión del riesgo, en el periodo las siguientes actividades, las cuales responden a las necesidades argumentadas en la matriz de costos del gestor:

ACTIVIDADES COMPONENTE AMBIENTAL		
El día 21 de marzo del presente año, se realizó acompañamiento a la socialización de avance, realizada a la Comunidad en la Caseta Nápoles Barrio el Timy del Proyecto "Mejoramiento de la Calidad de Vida de la Población Vulnerable de Florencia en el departamento del Caquetá, a través de la Ampliación del Sistema de Acueducto para Los Barrios: Villa Clara, Nápoles, Villa Real y El Timy"		
El día 14 de marzo del presente año, se realizó visita al proyecto de obra "Construcción Etapa I del Sistema de Alcantarillado Sanitario y Pluvial del casco urbano del municipio de Morelia en el departamento del Caquetá".		
El día 20 de marzo del presente año, se llevó a cabo comité técnico, con el propósito de realizar seguimiento al desarrollo del convenio interadministrativo N° 20230000040 y los contratos dedicados para la ejecución del proyecto denominado "Mejoramiento de la Calidad de Vida de la Población Vulnerable de Florencia en el departamento del Caquetá, a través de la Ampliación del Sistema de Acueducto para Los Barrios: Villa Clara, Nápoles, Villa Real y El Timy"		

Gr.

El día 7 de abril del presente se realizó Comité técnico del proyecto "Realizar la interventoría integral, la cual efectuará el seguimiento de los Aspectos Contractuales, Técnicos, Administrativos, Financieros, Sociales y Ambientales al Contrato de Obra Cuyo Objeto es: Construcción Tanque de Almacenamiento de Agua Potable para el municipio de Albania".



Visita técnica proyecto (23 de abril de 2025) "Mejoramiento de la Calidad de Vida de la Población Vulnerable de Florencia en el departamento del Caquetá, a través de la Ampliación del Sistema de Acueducto para Los Barrios: Villa Clara, Nápoles, Villa Real y El Timmy de Florencia – Caquetá"



Comité técnico (25 de abril de 2025). "Mejoramiento de la Calidad de Vida de la Población Vulnerable de Florencia en el departamento del Caquetá, a través de la Ampliación del Sistema de Acueducto para Los Barrios: Villa Clara, Nápoles, Villa Real y El Timmy de Florencia – Caquetá"



Se apoyó en la elaboración y revisión de los estudios previos, análisis del sector y anexos técnicos, como contratista PDA Caquetá, estructurador, técnico y económico desde el componente ambiental, del proyecto *"Adquisición de vehículo compactador, recolector de residuos sólidos para el Municipio de San Vicente del Caguán, Departamento de Caquetá"*, que cuenta con concepto favorable de viabilidad por parte del Comité Técnico Departamental de Proyectos" y proceso de selección en la modalidad de subasta inversa electrónica N° DC-PDA-SIE-007-2025.

[illegible]

NOTA: las excepciones pueden ser revisadas en el manual de Colombia compra eficiente en el link <http://www.colombiacompra.gov.co>, publicándose la documentación manual al respecto cuando sea pertinente.

En consecuencia, se dará trato nacional a las propuestas presentadas bajo los términos de los acuerdos que aplican para los bienes y servicios que se ofrecen de los anteriores países.

Coruña extractorador

118

1914

Appendix

NOIA CAROLINA TANAYO SUTRAGO

Secretaría de Infraestructura y Gestor PDA Casqueté - Ordenador del Gasto mediante Resolución No. 002202 de fecha 16 de septiembre del 2024.

El día 13 de marzo a través de la capacitación **Estrategias de Reciclaje y Ahorro del Agua**, se realizó capacitación de todos los grados de primaria de la Institución Educativa Huellitas, iniciativa y compromiso ambiental de su Personera.



El día 21 de marzo se rindió homenaje al día Mundial del Agua, mediante una jornada de capacitación y actividades pedagógicas, a estudiantes de Bachillerato de la Institución Educativa Juan Bautista la Salle.



El día 07 de abril se realizó fortalecimiento a la Huerta Escolar de la Institución Educativa Bajo Caldas, mediante donación de semillas y macetas semilleros biodegradables, a los estudiantes del Club defensor del agua de esta institución.



En celebración del día Internacional de la Madre Tierra, se realizó el día 24 de abril del presente año, una charla a estudiantes de grado tercero de la Institución Educativa la Libertad sede Altos de Copoazú, sobre el cambio climático, uso eficiente de ahorro de agua y cuidado de la madre tierra desde la protección de los recursos naturales.



COMPONENTE AMBIENTAL

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

EVIDENCIA

26 de marzo de 2025: Visita técnica a la obra del Acueducto de Morelia



Apoyo en la estructuración y elaboración de anexo técnico y estudio previo del proceso contractual "Realizar la interventoría integral, la cual Efectuará el Seguimiento de los Aspectos Contractuales, Técnicos, Administrativos, Financieros, Sociales y Ambientales al contrato de Obra Cuyo Objeto ES: "Construcción del Relleno Sanitario Y Obras Complementarias en el municipio de Solano departamento del Caquetá Fase 1".

Manual de Certificación de la Gobernación del Caquetá - Versión 2021
Proceso: Gestión Contractual

ESTUDIO PREVIO CONCURSO EN MENORES

En consecuencia, la entidad certificada tiene acceso a documentos y servicios de los Efectos que surten de la Audiencia Contractual suscrita al Proceso de Certificación.

Adicionalmente, los proponentes de estudio con el cual se elabore el Documento Nacional de Investigación la evidencia de trabajo nacional por reconocimiento recibido en este mes.

Concluye el estudio:

ANA MARIA ORTIZ PERDOMO
Coordinadora de Estudios, Oficina PDA
Cauca

ANIBAL GARCIA GONZALEZ
Coordinador de Estudios, Oficina PDA
Cauca

ANDRES GOMEZ TRUJILLO
Coordinador de Estudios, Oficina PDA
Cauca

HERNANDEZ GARCIA
Secretaría de Estudios
Oficina PDA Cauca

ANEXOS:
Presupuesto de inversión
Documentación técnica y económica
Banco de riesgo

Apoyo en la estructuración y elaboración de anexo técnico y estudio previo del proceso contractual "Realizar la Interventoría Integral, la cual efectuará el Seguimiento De los Aspectos Contractuales, Técnicos, Administrativos, Financieros, Sociales y Ambientales al contrato de Obra cuyo objeto es: "Construcción Celda Disposición Final Relleno Sanitario El Cairo, municipio de San José del Fragua"

Manual de Certificación de la Gobernación del Caquetá - Versión 2021
Proceso: Gestión Contractual

ESTUDIO PREVIO CONCURSO EN MENORES

En consecuencia, la entidad certificada tiene acceso a documentos y servicios de los Efectos que surten de la Audiencia Contractual suscrita al Proceso de Certificación.

Adicionalmente, los proponentes de estudio con el cual se elabore el Documento Nacional de Investigación la evidencia de trabajo nacional por reconocimiento recibido en este mes.

Concluye el estudio:

JOSE LEONARDO CHAVARRA GARCIA
Coordinador de Estudios, Oficina PDA
Cauca

ANDRES GOMEZ TRUJILLO
Coordinador de Estudios, Oficina PDA
Cauca

HERNANDEZ GARCIA
Secretaría de Estudios
Oficina PDA Cauca

ANEXOS:
Presupuesto de inversión
Documentación técnica y económica
Banco de riesgo

31 de marzo de 2025: Seguimiento de los mínimos ambientales en el municipio de El Doncello

Manual de Certificación de la Gobernación del Caquetá - Versión 2021
Proceso: Gestión Contractual

ESTUDIO PREVIO CONCURSO EN MENORES

En consecuencia, la entidad certificada tiene acceso a documentos y servicios de los Efectos que surten de la Audiencia Contractual suscrita al Proceso de Certificación.

Adicionalmente, los proponentes de estudio con el cual se elabore el Documento Nacional de Investigación la evidencia de trabajo nacional por reconocimiento recibido en este mes.

Concluye el estudio:

JOSE LEONARDO CHAVARRA GARCIA
Coordinador de Estudios, Oficina PDA
Cauca

ANDRES GOMEZ TRUJILLO
Coordinador de Estudios, Oficina PDA
Cauca

HERNANDEZ GARCIA
Secretaría de Estudios
Oficina PDA Cauca

ANEXOS:
Presupuesto de inversión
Documentación técnica y económica
Banco de riesgo

06 de marzo de 2025: campaña de sensibilización dirigida a los estudiantes de la Institución Educativa Marco Fidel Suárez, en el municipio de El Doncello



11 de abril de 2025: visita técnica a la obra que se realiza en el municipio de Morelia cuyo objeto contractual es "Construcción red de Acueducto y Planta de Tratamiento de Agua Potable para el casco urbano del municipio de Morelia - departamento de Caquetá"



29 de abril de 2025: visita técnica a la obra que se realiza en el municipio de Morelia cuyo objeto contractual es "Construcción Red de acueducto y Planta de Tratamiento de Agua Potable para el casco urbano del municipio de Morelia - departamento de Caquetá"



28 abril de 2025: Se llevó a cabo un seguimiento a los mínimos ambientales del municipio de Curillo



27/4

28 de abril de 2025: Se realizó en Curillo una campaña de sensibilización sobre la cultura del agua, enfocada en el ahorro y el uso eficiente



29 de abril de 2025: campaña de sensibilización dirigida a los estudiantes de la Institución Gimnasio Campestre, en la ciudad de Florencia, Caquetá



COMPONENTE GESTIÓN DE RIESGO SECTORIAL

En cumplimiento a esta obligación, se diseñó una guía con los Lineamientos para la formulación del *Plan de Gestión del Riesgo de Desastres Sectorial*, establecidos en el Decreto 2157 de 2017 y presentación, con la finalidad de ser entregada y capacitados a los 14 municipios del departamento que harán parte de la consultoría cuyo objeto es "Formulación del Plan de Gestión del Riesgo de desastres sectorial.



Informe detallado de seguimiento del plan de gestión del riesgo PDA Caquetá 2024 – 2027



	DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ	
	Informe de Seguimiento del PEI	Versión 1.0 17/01/2020

31 de marzo de 2025: Asistencia técnica y capacitación a la Empresa de Servicios Públicos de El Doncello con respecto a los lineamientos establecidos en la Guía para la Incorporación del Análisis de Riesgo de Desastres



Asistencia técnica y capacitación a la Empresa de Servicios Públicos de Curillo con respecto a los lineamientos establecidos en la Guía para la Incorporación del Análisis de Riesgo de Desastres

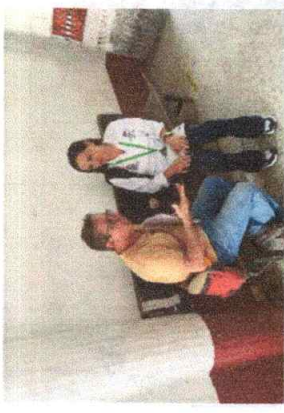


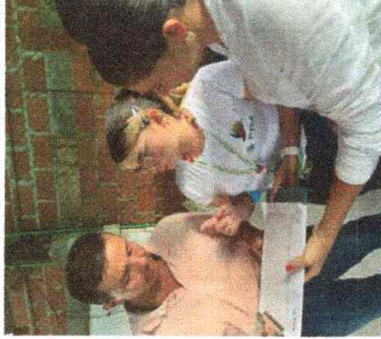
7. COMPONENTE SOCIAL

Durante el periodo evaluado, el Componente Social del Plan Departamental de Agua del Caquetá llevó a cabo las siguientes actividades:

CAPACITACIONES EN SANEAMIENTO BÁSICO Y AGUA POTABLE			
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD	PROYECTO	PARTICIPANTES	EVIDENCIA FOTOGRÁFICA
Capacitación sobre Ahorro y Uso Eficiente del Agua , orientado a estudiantes de las Instituciones Educativas del departamento.	N/A	• I. E. Ángel Cuniberti / Curillo • Institución Educativa Gimnasio Campestre / Florencia • Institución Educativa Marco Fidel Suarez / El Doncello • Institución Educativa Agroecológico Amazónico – El Paujil • Centro Educativo Huelitas – Florencia • Institución Educativa José Antonio Galán – Vereda Norcasia – Florencia • Institución Educativa Juan Bautista La Salle – Florencia • Institución Educativa Rural Bajo Caldas – Florencia • Institución Educativa Rural Villa del Río – La Chipa – Puerto Rico • Institución Educativa Nuestra Señora del Perpetuo Socorro – La Montañita • Institución Educativa Rural La Libertad - Sede Altos de Copoazú – Florencia • Institución Educativa Rural Sede La Florida – Palma Arriba • Limpieza del Humedal - Versalles Florencia • I.E. Los Pinos - Florencia • I.E. Colegio Cristiano Shalom- Florencia • I.E.R Palma Arriba Sede la Florida	 
			 

CAPACITACIONES EN SANEAMIENTO BÁSICO Y AGUA POTABLE				
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD	PROYECTO	PARTICIPANTES	EVIDENCIA FOTOGRÁFICA	
Seguimiento Social a los Proyectos en etapa contractual y post contractual		- Seguimiento Social "Mejoramiento de la Calidad de Vida de la Población Vulnerable de Florencia en el departamento del Caquetá, a Través de la Ampliación del Sistema de Acueducto para los barrios: Villa Clara, Nápoles, Villa Real y El Timy" - Seguimiento social al proyecto "Construcción Red de Acueducto y Planta de Tratamiento de Agua Potable para el casco urbano del municipio de Morelia - Caquetá"		

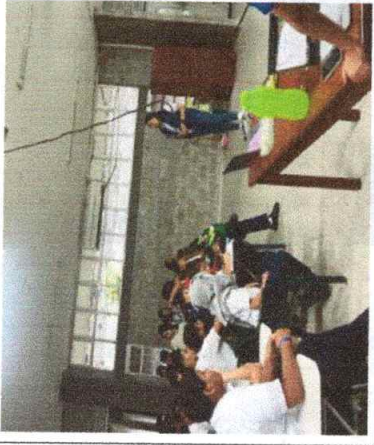
SEGUIMIENTO CLUBES DEFENSORES DEL AGUA			
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD	PROYECTO	PARTICIPANTES	EVIDENCIA FOTOGRÁFICA
Seguimiento a Club Defensores del Agua Conformados	N/A	I. E. Rural Palma Arriba / Montañita I. E. Bajo Caldas / Florencia I. E. Agroecológico Amazónico / Paujil. I. E. Albania / Albania - I.E. Angel Cuniberti / Curillo - I.E Los Pinos Florencia - I.E Acevedo y Gómez Puerto Rico - I:E José María Córdoba - Cartagena del Chaira - I.E.R Platanillo - San José del Fragua	   


SEGUIMIENTO A COMITÉS DE CONTROL SOCIAL			
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD	PROYECTO	PARTICIPANTES	EVIDENCIA FOTOGRÁFICA
Seguimiento y Acompañamiento a comités de control social y Veedores	Mejoramiento de la Calidad de Vida de la Población Vulnerable de Florencia en el departamento del Cauca, A través de la Ampliación del Sistema de Acueducto para los Barrios: Villa Clara, Nápoles, Villa Real y El Timy.	Juan Carlos Ardila Leidy Tatiana Jara	 
	Construcción Red de Acueducto y Planta de Tratamiento de Agua Potable para el casco urbano del municipio de Morelia - departamento de Cauca	Diógenes Roa María Santos Cuellar	 



SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN A LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL EN OBRA			
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD	PROYECTO	PARTICIPANTES	EVIDENCIA FOTOGRÁFICA
Registro de seguimientos realizados, Informe de revisión del Plan de Gestión Social, Registro de vallas instaladas de acuerdo a los lineamientos del PDA	Construcción Red de Acueducto y Planta de Tratamiento de Agua Potable para el casco urbano del municipio de Morelia - departamento de Caquetá"	Martha Cecilia Cuellar Profesional Social	
	Mejoramiento de la Calidad de Vida de la Población Vulnerable de Florencia en el departamento del Caquetá, A través de la Ampliación del Sistema de Acueducto para los Barrios: Villa Clara, Nápoles, Villa Real y El Timy.	Leidy Tatiana Jara Profesional Social	

	DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ	
	Informe de Seguimiento del PEI	COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA
		Versión 1.0 17/01/2020

CAPACITACIÓN CUIDADO DEL AMBIENTE			
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD	PROYECTO	PARTICIPANTES	EVIDENCIA FOTOGRÁFICA
Capacitación y Sensibilización en cuidado del ambiente, reducción del cambio climático y efecto invernadero	I. E. Gimnasio Campestre de Florencia	Estudiantes Grado Sexto Componente Ambiental. Componente Social.	
	I.E Marco Fidel Suarez - El Doncello	Estudiantes Grados 7°, 8° y 9° Componente Ambiental. Componente Social.	
	I. E. Rural La Libertad - Sede Altos de Copozú - Florencia	Estudiantes Grado Tercero Componente Social - Componente Ambiental	
	Centro Educativo Huellitas - Florencia	Estudiantes Grados 1° al 5° Componente Social - Componente Ambiental	

NOTAS INFORMATIVAS			
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD	PROYECTO	PARTICIPANTES	EVIDENCIA FOTOGRÁFICA
Notas Informativas del Desarrollo de las Actividades Realizadas • Nota Informativa Cambio Climático y Buen Uso y Ahorro del Agua - I.E. Marco Fidel Suarez • Nota Informativa Cambio Climático y Buen Uso y Ahorro del Agua - I.E. Gimnasio Campestre de Florencia		Profesionales Componente Social del PDA Caquetá.	           

28

8. INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LOS COSTOS DEL GESTOR.

Al verificar el avance en el desarrollo de las actividades acumuladas a 30 de abril de 2025, se tiene que los Costos del Gestor, muestran un importante avance en el cumplimiento de las metas, evidenciándose que cada uno de los componentes cumplió con la ejecución en el cumplimiento de las metas.

Realizando el seguimiento en la evolución de los Costos del Gestor 2025, encontramos la siguiente información acumulada:

COMPONENTE	MARZO			ABRIL			CUMPLIMIENTO PDA CAQUETA		
	Planeado	Entregado	% de Cumplimiento	Planeado	Entregado	% de Cumplimiento	Planeado	Entregado	% de Cumplimiento
ADMINISTRATIVA	122	143	100,00%	124	151	100,00%	1.145	302	30,53%
AMBIENTAL	18	17	77,78%	13	15	100,00%	164	40	21,71%
ASEGURAMIENTO	17	15	75,00%	12	14	100,00%	151	39	21,04%
FINANCIERA	22	22	100,00%	24	31	100,00%	263	89	30,64%
INFRAESTRUCTURA	9	15	100,00%	10	12	100,00%	106	45	41,22%
JURIDICA	56	56	100,00%	20	20	100,00%	262	90	29,45%
PLANEACION	5	5	100,00%	4	4	100,00%	55	16	15,83%
SOCIAL	40	44	95,45%	40	44	87,88%	324	105	38,03%
PDA CAQUETA	289	317	93,53%	247	291	98,48%	2.470	726	28,56%

En la tabla anterior, se observa el avance de cumplimiento de las metas por componentes de los Costos del Gestor, de acuerdo a las actividades programadas para el bimestre **marzo - abril de 2025** por el PDA Caquetá. Se ha alcanzado un cumplimiento del **93.53%** para el mes de marzo (317 actividades realizadas de 289 programadas) y del **98.48%** para el mes de abril (291 actividades realizadas de 2479 programadas). Transcurrido el 27.27% del tiempo de ejecución del capítulo 2025; tenemos que el PDA Caquetá; en el cumplimiento de las metas cuenta con un acumulado del **28.56% de cumplimiento acumulado en promedio**, reportando el haber realizado **762** actividades de **2.470** actividades programadas; para lo cual, cada componente acumula el siguiente porcentaje:

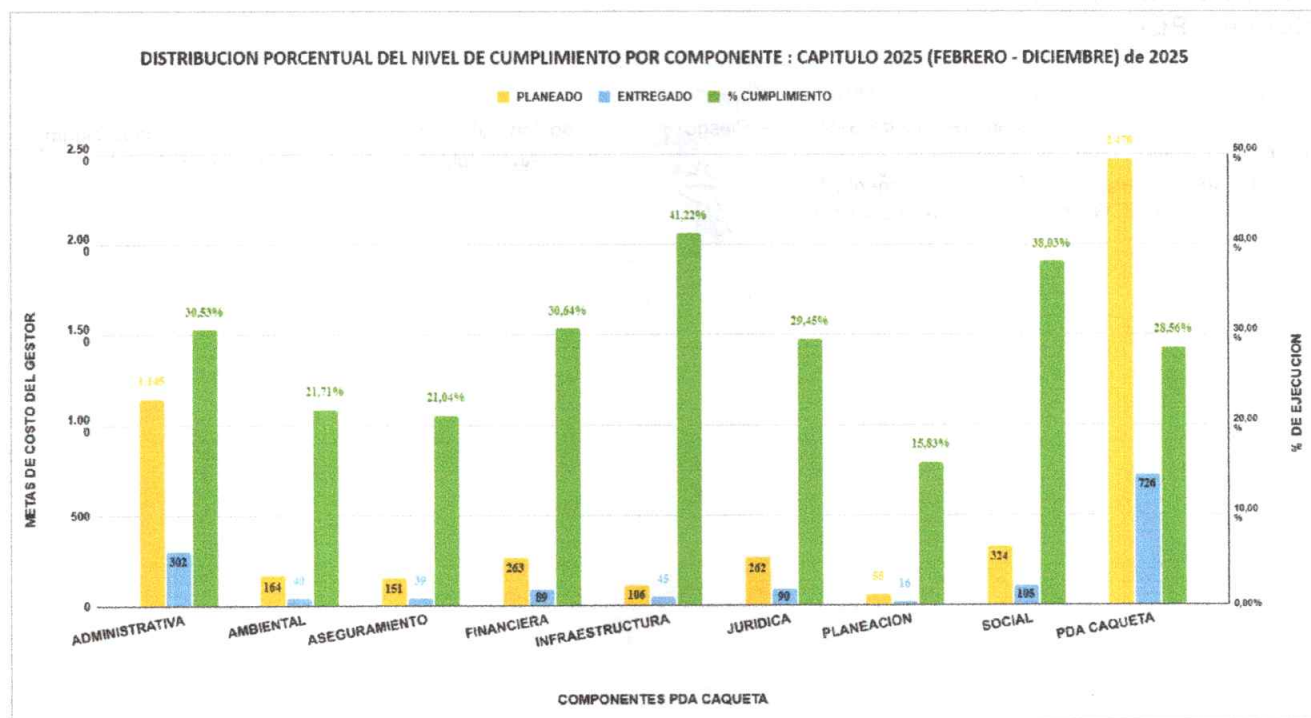
- Con un **30.53%** de cumplimiento tenemos al **Componente Administrativo**, reportando el haber entregado **302** actividades de **1.145** actividades planeadas.
- Con un **21.71%** de cumplimiento tenemos al **Componente Ambiental**, reportando el haber entregado **40** actividades de **164** actividades planeadas.
- Con el **21.04%** de cumplimiento tenemos al **Componente de Aseguramiento**, reportando el haber entregado **39** actividades de **151** actividades planeadas.
- Con un **30.64%** de cumplimiento tenemos al **Componente de Financiero**, reportando el haber entregado **89** actividades de **263** actividades planeadas.
- Con el **41.22%** de cumplimiento tenemos al **Componente de Infraestructura**, reportando el haber entregado **45** actividades de **106** actividades planeadas.

Q

- Con el **29.45%** de cumplimiento tenemos al **Componente Jurídica**, reportando el haber entregado **90** actividades de **262** actividades planeadas.
- Con un **15.83%** de cumplimiento tenemos al **Componente de Planeación**, reportando el haber entregado **16** actividades de **55** actividades planeadas.
- Con el **38.03%** de cumplimiento tenemos al **Componente Social**, reportando el haber entregado **105** actividades de **324** actividades planeadas.

Aunque, algunos componentes han realizado más actividades de las programadas, no han alcanzado el 100% de cumplimiento, debido a que realizaron más actividades que no fueron programadas.


En la siguiente gráfica, podemos observar, como es el comportamiento de los componentes del PDA Caquetá, en el cumplimiento de las metas, para el periodo agosto de 2024




En la gráfica, se presentan los componentes del PDA Caquetá y el nivel de cumplimiento. De color amarillo, se observa la cantidad de actividades planeadas, de color azul se observa la cantidad de actividades entregadas y en color verde se observa el porcentaje del nivel de cumplimiento. Las tres barras finales, se observa el total consolidado del PDA Caquetá, reportando un porcentaje del **28.56% de cumplimiento**, en el desarrollo de las metas.

El **28.56% de cumplimiento en promedio**, reportado por los Costos del Gestor, permite evidenciar un nivel **ALTO de cumplimiento**, frente al logro de los objetivos y acerca de las actividades que está desarrollando el PDA Caquetá, en su incidencia en la población del departamento del Caquetá, promoviendo la política de los **Planes Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento (PDA)**, definidos en el Decreto **1425 de 2019**; se está cumpliendo de manera satisfactoria, manifestándose en el mejoramiento de la calidad de vida de los caqueteños.


Florencia, mayo de 2025.




NIDIA CAROLINA TAMAYO BUITRAGO
Secretaria de Infraestructura
Gestora del PDA

Vo.Bo. Yudy Narley García Rojas – Coordinadora PDA 

Vo.Bo. Ing. Lina Ortiz-Componente Ambiental y de Gestión del Riesgo 

Vo.Bo. Yenny Camelo-Componente Financiero 

Vo.Bo. Ing. Neiser Andrés Castro Triviño-Componente Técnico 

Estructuró / Diagramó: E. Orlando Parra C. /Apoyo Gestor PDA 

Vo.Bo. Ing Salomón González-Componente Aseguramiento 

Vo.Bo. Ana Paola Sierra Pinillos-Componente Social 
