







Informe de Seguimiento del PEI

Informe de Seguimiento al Plan Estratégico de Inversiones – PEI

Fecha de inicio periodo informe: 01 de mayo de 2025

Fecha de terminación periodo informe: 30 de junio de 2025

No. Informe

1. Justificación

De acuerdo con el Decreto 1425 de 2019, Artículo 2.3.3.1.2.3. Funciones del Gestor, Numeral 14.2. "Informe bimestral (marzo - abril de 2025) de la ejecución y seguimiento del Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento y de sus instrumentos de planeación, de acuerdo con el formato y medios que el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio determine para tal fin. En el informe también se señalará el avance del Plan Estratégico de Inversiones, detallando el cumplimiento de los cronogramas allí fijados, las metas propuestas, el estado de avance de los proyectos en ejecución y de los procesos de contratación", el Gestor, presenta el siguiente informe a los Miembros del Comité Directivo del PDA del departamento del Caquetá.

De conformidad al Decreto 1425 de 2019, Articulo 2.3.3.1.5.3 ítems 6.6 Párrafo Tercero, establece "La vigencia del Plan Estratégico de Inversiones (PEI) será la misma del período de gobierno de las entidades territoriales y del capítulo anual será hasta el 31 de diciembre del año de aprobación"; Por lo tanto, el PEI 2024-2027, se encuentra en proceso de formulación, conforme lo establece el Decreto en mención.

Es importante mencionar que en razón a las modificaciones realizadas por el MVCT a la metodología de estructuración del PEI 2024 - 2027, se ha presentado el siguiente desarrollo: 1- En Comité Directivo en sesión virtual No. 51 del 14 de febrero de 2024, se asignan recursos únicamente para los costos del Gestor. Los soportes del PEI, incluidos la proyección de fuentes y el cierre financiero no se les asigno por el momento recursos; 2 - En Comité Directivo Virtual No.52 de 12 de junio de 2024, se asignaron recursos a los proyectos viabilizados en el Comité Técnico No. 5 del 16 de noviembre del 2023, para la ejecución de los proyectos para los municipios de Albania, Cartagena del Chaira y Solano;; 3 - En Comité Directivo Virtual No.53 del 04 de julio de 2024, a) Se aprueba el PEI (2024 - 2027) capítulo 2024, 4 - En Comité Directivo Virtual No.54 de 16 de agosto de 2024, a) Se aprueba la modificación al el PEI (2024 - 2027) capítulo 2024, y b) Se solicita la asignación de recursos para Plan de Gestión Social; 5 - En Comité Directivo Virtual No.55 del 25 de octubre de 2024, se aprueba la modificación al el PEI (2024 - 2027) capítulo 2024 y 6 - En . Comité Directivo Virtual No.56 del 13 de diciembre de 2024, a) Se aprueba la modificación al el PEI (2024 - 2027) capítulo 2024, b) Se solicita la aprobación y asignación de recursos al Plan Ambiental, c) Se solicita la aprobación y asignación de recursos al Plan de Gestión del Riesgo y b) Se solicita la aprobación y delegación de contratación a los municipios de El Doncello, San José del Fragua y Solano, como ejecutores de los proyectos aprobados. 7. En Comité Directivo No. 57 se aprueba: a) Presentación









Informe de Seguimiento del PEI

Versión 1.0 17/01/2020

del cierre financiero del Capítulo 2024 del PEI 2024-2027. B) Aprobación y asignación de recursos del Capítulo 2025 del PEI 2024-2025. C) Asignación de Costos del Gestor Capitulo 2025. por \$1.800.000,00. 8. En Comité Directivo No. 58 se hace Aprobación de: a) la primera modificación del Capítulo 2025 del PEI 2024-2027. b). Incorporación nueva fuente recursos financieros: Regalías 60%. c). Incorporación recursos financieros en los componentes Inversión en Infraestructura y Componente de Aseguramiento. d). Modificación cierre financiero 2025. e) Modificación metas capítulo 2025. f) Presentación modificación PAMs San Vicente del Caguán y San José del Fragua. g). Aprobación de delegación contratación a los municipios de San José del Fragua, Morelia, Puerto Rico, Albania y a la ESP del municipio de Curillo.

Es importante mer clona, que en azos e las modificaciones asó e la per el MVC ja la metodolugia.











Informe de Seguimiento del PEI

Informe de Avance del PEI 2024-2027-Capítulo 2025.

4	Componente/Subcomponente	Valor Comprometido	SGP Municipios	Otros Recursos Municipios	SGP Dpto.	Recursos Propios Departamento.	Audiencias Públicas	CAR
	Total, Inversión en Infraestructura	26.571.449.951,91	11.367.279.955,28	162.986.464,78	13.081.548.996,93	185.034.199,40	1.774.600.335,52	4 Q 196.
	Infraestructura en AAA	21.805.596.258,21	9.930.666.283,28		11.874.929.974,93	-	-	*
	Reformulaciones	2.122.620.999,70	-	162.986.464,78	·	185.034.199,40	1.774.600.335,52	
- ^	Preinversiones	2,493.232.694,00	1.436.613.672,00		1.056.619.022,00	7/3-3	<i>y</i> **) -	
Inversión en:	Mecanismo Departamental	150.000.000,00	-	-	150.000.000,00	A A List on the	-	-
	Total, Aseguramiento	775.000.000,00	200.000.000,00	-	575.000.000,00			
	Total, Ambiental	12.633.798.302,95	330.000.000,00		1.200.000.000,00	1.938.491.602,95	18	9.165.306.700,00
	Total, Gestión del Riesgo	2.024.613.510,00	694.198.000,00	-	1.330.415.510,00	-	•	
	Total, Gestión Social	350.000.000,00	Mary and the same		350.000.000,00		-	•
TOTAL, VALO	R COMPROMETIDO	42.354.861.764,86	12.591.477.955,28	162.986.464,78	16.536.964.506,93	2.123.525.802,35	1.774.600.335,52	9.165.306.700,00

Approximate and a second secon		Costos Gestor	Valor	Fuente	Se	pportes	Valor Ejecutado Financiero (Expedición de Documento de Compromiso)	Valor Ejecutado (Pagos Realizados)
o de la prime de mandre de la compressión de mandre de la compressión de la compress	Costos Gestor	Los Costos del Gestor del PEI Capítulo 2025 se asignan conforme a la Aprobación del Gobernador o Gobernadora del Departamento de Caquetá, de acuerdo con lo establecido en el ARTÍCULO 2.3.3.1.5.3. Plan Estratégico de Inversiones (PEI) del Decreto 1077 de 2015. Es pertinente manifestar que de acuerdo a lo establecido en dicho artículo, en caso de que el porcentaje de los Costos Gestor supere el 5%, la certificación de aprobación de los Costos Gestor para la vigencia suscrita por el Gobernador, deberá contener una justificación motivada que contenga el detalle de las acciones que generan un mayor costo, el cual debe estar relacionado con las funciones del Gestor, metas y cronograma establecidos para la respectiva vigencia así como las particularidades presentes en cada territorio.	1.800.000.000,00	SGP DPTO	de Costos Gestor Capitulo 2025 Suscrita por el Gobernador del	Certificación Cumplimiento de Costos Gestor Capitulo 2024 Suscrita por el Gobernador del Departamento de Caquetá Supervisor del Gestor del PDA Fecha 07/01/2025	1.800.000.000.000,00	0,00







Versión 1.0 17/01/2020



Informe de Seguimiento del PEI

2. Informe Financiero mayo - junio de 2025

2.2. Aportes y rendimientos financieros del bimestre mayo - junio de 2025.

En el Seguimiento a los recursos enmarcados en el plan departamental de agua, con respecto a los Aportes del Sistema de Participaciones para Agua Potable y Saneamiento Básico (SGP-APSB):

DETALLE	MAYO 2025	JUNIO 2025	VALOR TOTAL 2025
DEPARTAMENTO			
RECAUDO		6 4 6 5	568.905.753,00
RENDIMIENTOS	156.319.617,61	109.432.257,87	819,111,265,93
NACION		3 4 8 8	
SALDO RECAUD			0,00
RENDIMIENTOS	26.370.544,03	18.624.464,29	143.560.872,60
OTROS RECURSOS	The state of the s	on programming a	
SALDO RECAUD	10 PF 1		0,00
RENDIMIENTOS	13.318.854,11	9.408.521,25	The state of the s
ALBANIA			
SGP			
SALDO RECAUD	Esseria de la companya della companya della companya de la companya de la companya della company		213.073.742,00
RENDIMIENTOS	9.326.651,93	6.585.279,33	The state of the s
BELEN DE LOS ANDAQUIES			
SGP		14.	
SALDO RECAUDO			0,00
CARTAGENA DEL CHAIRA		The second secon	
SGP	Sec.		3.4
SALDO RECAUD		1178	72.098.360,00
RENDIMIENTOS	14.174.364,38	10.014.281,99	72.802.684.86
CURILLO			CONT. CONT. CO. CO. CO. CO. CO. CO. CO. CO. CO. CO
SALDO RECAUD			0,00
RENDIMIENTOS	6.014.565,60	4.246.025,60	31.068.193,05
EL DONCELLO		THE RESERVE OF THE PROPERTY OF	184 84 5415
SGP			
SALDO RECAUD			0,00
RENDIMIENTOS	4.586.686,37	3.238.258,56	23.693.164,19
EL PAUJIL			
SGP			
SALDO RECAUD	45.000.000,00	4	45.000.000,00
RENDIMIENTOS	1.108.223,08	838.216,46	4.874.878,68
FLORENCIA		COMMUNICATION OF THE PROPERTY OF THE PARTY O	
SGP			1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
SALDO RECAUD			200.000.000,00
RENDIMIENTOS	30.113.245,84	21.267.477,51	153.221.701.43







Informe de Seguimiento del PEI

DETALLE	MAYO 2025	JUNIO 2025	VALOR TOTAL 2025
LA MONTAÑITA			
SGP	ina manahasan di		
SALDO RECAUD	ari a strania ais		413.856.137,35
RENDIMIENTOS	5.382.332,40	3.799.560,51	27.823.497,27
MILAN			
SGP			
SALDO RECAUD			0,00
RENDIMIENTOS	4.929,288,33	3.479.873,29	25.461.660,34
MORELIA SGP			
SGP			
SALDO RECAUD	100		150.000.000,00
RENDIMIENTOS	7.206.721,97	5.089.645,97	39.294.097,71
MORELIA OTROS R.			
Otros Recursos			
SALDO RECAUD			0,00
RENDIMIENTOS	1.288.330,21	910.046,01	6.656.968,96
PUERTO RICO			
SGP			
SALDO RECAUD			0,00
RENDIMIENTOS	8.169.053,09	5.769.419,69	42.206.769,01
SAN JOSE DEL FRAGUA	MR.ATHRACESTA		
SGP	THE REPORT OF THE		
SALDO RECAUD			0,00
RENDIMIENTOS	4.770.431,08	3.369.793,33	24.649.583,44
SAN VICENTE DEL CAGUAN			
SGP			
SALDO RECAUD			322.000.000,00
RENDIMIENTOS	4.775.804,14	3.372.464,93	24.161.186,38
SOLANO			
SGP	No. of the Control of	Marin Caralan Bala b	Cale to S
SALDO RECAUD		10.74.	43.015.192,00
RENDIMIENTOS	29.859.469,19	21.088.316,22	153.510.254,80
SOLITA			
SGP			
SALDO RECAUD			0,00
RENDIMIENTOS	7.215.903,93	5.094.775,81	37.276.058,40
VALPARAISO			
SGP			
SALDO RECAUD	OTTA STATE		0,00
RENDIMIENTOS	7.911.770,04	5.584.431,58	40.863.782,3











Informe de Seguimiento del PEI

2.2. Acumulado de rendimientos Financieros por Fuentes a junio de 2025.

El Patrimonio Autónomo FIA, encargado de gestionar, administrar y reportar la asignación de rendimientos Financieros a cada Fideicomitente, Directo o Indirecto, de conformidad con las políticas establecidas para tal fin, reporta informes para el mes de junio del 2025, de la siguiente manera:

FUENTE	MAYO 2025	JUNIO 2025	VALOR TOTAL 2025
DEPARTAMENTO SGP	156.319.617,61	109.432.257,87	819.111.265,93
DEPARTAMENTO OTROS RECURSOS	13.318.854,11	9.408.521,25	68.821.971,72
NACION AUDIENCIAS PUBLICAS	26.370.544,03	18.624.464,29	143.560.872,60
MORELIA OTROS R.	1.288.330,21	910.046,01	6.656.968,96
SGP MUNICIPIOS SGP	151.163.509,66	106.802.977,46	778.249.746,80

(Componente Financiero PEI, 2025 - PDA Caquetá)

2.3. CDRs Emitidos durante la vigencia 2025

EMPRESA	DECRIPCION EMPRESA	NUMERO DE CDR	FECHA EXPEDICION CDR	VALOR POR FUENTE	CONCEPTO GASTO	VALOR INICIAL CDR POR FUENTE	DESCRIPCION DEL CDR
18999	CAQUETA	17966	22-ene-25	300.000.000,00	2-COMPONENTE EN INFRAESTRUCTURA EN AGUA Y SANEAMIENTO	300.000.000,00	ACTUALIZACIÓN Y AJUSTE DE LA FORMULACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA BOCATOM/Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEI CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SOLANO DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ.
18756	SOLANO- CAQUETA	17967	22-ene-25	255.555.556,00	2-COMPONENTE EN INFRAESTRUCTURA EN AGUA Y SANEAMIENTO	255.555.556,00	ACTUALIZACIÓN Y AJUSTE DE LA FORMULACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA BOCATOMA Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SOLANO DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ.
18756	SOLANO- CAQUETA	17968	22-ene-25	44.444.444,00	2-COMPONENTE EN INFRAESTRUCTURA EN AGUA Y SANEAMIENTO	44.444.444,00	INTERVENTORÍA A LA ACTUALIZACIÓN Y AJUSTE DE LA FORMULACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA BOCATOMA Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SOLANO, DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ.
18999	CAQUETA	17969	22-ene-25	165.000.000,00	2-COMPONENTE EN INFRAESTRUCTURA EN AGUA Y SANEAMIENTO	165.000.000,00	ACTUALIZACIÓN Y AJUSTE DE LA FORMULACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN ETAPA UNO DEL COLECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO SOBRE LA RIVERA DE LA QUEBRADA LA SARDINA, MUNICIPIO DE FLORENCIA, DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ.
18001	FLORENCIA - CAQUETA	17970	22-ene-25	300.000.000,00	2-COMPONENTE EN INFRAESTRUCTURA EN AGUA Y SANEAMIENTO	300.000.000,00	ACTUALIZACIÓN Y AJUSTE DE LA FORMULACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN ETAPA UNO DEL COLECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO SOBRE LA RIVERA DE LA QUEBRADA LA SARDINA, MUNICIPIO DE FLORENCIA, DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ.
18999	CAQUETA	17971	22-ene-25	35.000.000,00	2-COMPONENTE EN INFRAESTRUCTURA EN AGUA Y SANEAMIENTO		INTERVENTORÍA A LA ACTUALIZACIÓN Y AJUSTE DE LA FORMULACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN ETAPA UNO DEL COLECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO SOBRE LA RIVERA DE LA QUEBRADA LA SARDINA, MUNICIPIO DE FLORENCIA, DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ.







Informe de Seguimiento del PEI

18999	CAQUETA	17972	22-ene-25	550.869.752,26	2-COMPONENTE EN INFRAESTRUCTURA EN AGUA Y SANEAMIENTO		REPOSICIÓN PARCIAL DEL ALCANTARILLADO BARRIO OASIS DEL MUNICIPIO DE PUERTO RICO -CAQUETÁ
185921	PUERTO RICO - CAQUETA	17973	22-ene-25	50.649.423,74	2-COMPONENTE EN INFRAESTRUCTURA EN AGUA Y SANEAMIENTO	50.649.423,74	REPOSICIÓN PARCIAL DEL ALCANTARILLADO BARRIO OASIS DEL MUNICIPIO DE PUERTO RICO -CAQUETÁ
18999	CAQUETA	17974	22-ene-25	49.130.247,74	2-COMPONENTE EN INFRAESTRUCTURA EN AGUA Y SANEAMIENTO	49.130.247,74	INTERVENTORÍA A LA REPOSICIÓN PARCIAL DEL ALCANTARILLADO BARRIO OASIS DEL MUNICIPIO DE PUERTO RICO -CAQUETÁ
185921	PUERTO RICO - CAQUETA	17975	22-ene-25	4.517.254,26	2-COMPONENTE EN INFRAESTRUCTURA EN AGUA Y SANEAMIENTO	4.517.254,26	INTERVENTORÍA A LA REPOSICIÓN PARCIAL DEL ALCANTARILLADO BARRIO OASIS DEL MUNICIPIO DE PUERTO RICO -CAQUETÁ
18999	CAQUETA	17976	22-ene-25	1.516.315.956,78	2-COMPONENTE EN INFRAESTRUCTURA EN AGUA Y SANEAMIENTO	1.516.315.956,78	OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ALCANTARILLADO URBANO EN EL MUNICIPIO DE ALBANIA DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
18029	ALBANIA	17977	22-ene-25	272.255.472,22	2-COMPONENTE EN INFRAESTRUCTURA EN AGUA Y SANEAMIENTO	272.255.472,22	OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ALCANTARILLADO URBANO EN EL MUNICIPIO DE ALBANIA DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
18999	CAQUETA	17978	22-ene-25	89.428.571,00	2-COMPONENTE EN INFRAESTRUCTURA EN AGUA Y SANEAMIENTO	89.428.571,00	INTERVENTORÍA A LA OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ALCANTARILLADO URBANO EN EL MUNICIPIO DE ALBANIA DEPARTAMENTO DEI CAQUETÁ
18999	CAQUETA	17979	22-ene-25	1.679.610.716,00	2-COMPONENTE EN INFRAESTRUCTURA EN AGUA Y SANEAMIENTO	1.679,610.716,00	OPTIMIZACIÓN TRAMOS DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE MORELIA DEPARTAMENTO DE CAQUETA
18479	MORELIA	17980	22-ene-25	40.000.000,00	2-COMPONENTE EN INFRAESTRUCTURA EN AGUA Y SANEAMIENTO	40.000.000,00	OPTIMIZACIÓN TRAMOS DE ALCANTARILLADO EN E MUNICIPIO DE MORELIA DEPARTAMENTO DE CAQUETA
18999	CAQUETA	17981	22-ene-25	120.372.750,00	2-COMPONENTE EN INFRAESTRUCTURA EN AGUA Y SANEAMIENTO	120.372.750,00	INTERVENTORÍA A LA OPTIMIZACIÓN TRAMOS DI ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE MORELI, DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
18999	CAQUETA	17994	27-ene-25	800.000.000,00	3-COMPONENTE AMBIENTAL	800.000.000,00	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO COMPACTADOS RECOLECTOR DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA E MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAS DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ
18753	SAN VICENTE DEL CAGUAN	17995	27-ene-25	175.673.225,00	3-COMPONENTE AMBIENTAL	175.673.225,00	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO COMPACTADOS RECOLECTOR DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA E MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAS DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ
18999	CAQUETA	18037	11-feb-25	1.800.000.000,00	1-COMPONENTE DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	1.800.000.000,00	COSTOS DEL GESTOR CAPÍTULO 2025
18999	CAQUETA	18038	13-feb-25	200.000.000,00	3-COMPONENTE AMBIENTAL	200.000.000,00	FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA D APROVECHAMIENTO DEL PGIRS DEL MUNICIPIO D SAN JOSÉ DEL FRAGUA
18610	SAN JOSE DE LA FRAGUA	18039	13-feb-25	30.000.000,00	3-COMPONENTE AMBIENTAL	30,000,000,00	FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA D APROVECHAMIENTO DEL PGIRS DEL MUNICIPIO D SAN JOSÉ DEL FRAGUA
18999	CAQUETA	18047	18-feb-25	150.000.000,00	2-COMPONENTE EN INFRAESTRUCTURA EN AGUA Y SANEAMIENTO	150.000.000,00	IMPLEMENTACIÓN DEL MECANISMO DEPARTAMENTA DE VIABILIZACIÓN DE PROYECTOS
18999	CAQUETA	18052	21-feb-25	427.909.407,00	6-GESTION DEL RIESGO SECTORIAL	427.909.407,00	DESARROLLO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓ DEL RIESGO POR EL DESABASTECIMIENTO DE AGU POTABLE EN LA BOCATOMA SOBRE LA QUEBRADA LA MARGARITAS LÍNEA DE ADUCCIÓN Y PTAP LO NARANJOS DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑIT DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
18410	LA MONTAÑITA	18053	21-feb-25	479.498.000,00	6-GESTION DEL RIESGO SECTORIAL	479.498.000,00	DESARROLLO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓ DEL RIESGO POR EL DESABASTECIMIENTO DE AGU POTABLE EN LA BOCATOMA SOBRE LA QUEBRADA LA MARGARITAS LÍNEA DE ADUCCIÓN Y PTAP LO NARANJOS DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑIT DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
18999	CAQUETA	18054	21-feb-25	72.592.593,00	6-GESTION DEL RIESGO SECTORIAL	72.592.593,00	INTERVENTORÍA AL DESARROLLO EJECUCIÓN D OBRAS DE MITIGACIÓN DEL RIESGO POR E DESABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN L BOCATOMA SOBRE LA QUEBRADA LAS MARGARITA LÍNEA DE ADUCCIÓN Y PTAP LOS NARANJOS DE









Informe de Seguimiento del PEI



PARK					okischus III. Beitruch Palen, 1990		MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
18999	CAQUETA	18057	26-feb-25	200.000.000,00	3-COMPONENTE AMBIENTAL	200.000.000,00	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS AMBIENTALES PARA EL TRÁMITE DE LA LICENCIA AMBIENTAL DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL RELLENO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE CARTAGENA DEL CHAIRÁ DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ-
18150	CARTAGENA DEL CHAIRA	18058	26-feb-25	100.000.000,00	3-COMPONENTE AMBIENTAL	100.000.000,00	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS AMBIENTALES PARA EL TRÁMITE DE LA LICENCIA AMBIENTAL DEL PROYECTO -CONSTRUCCIÓN DEL RELLENO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE CARTAGENA DEL CHAIRÁ DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ-
18999	CAQUETA	18664	27-jun-25		2-COMPONENTE EN INFRAESTRUCTURA EN AGUA Y SANEAMIENTO		REFORMULACIÓN A LA CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL MUNICIPIO DE ALBANIA

(Componente Financiero PEI, 2024 - PDA Caquetá)

3 COMPONENTE DE ASEGURAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

3.1 PLAN DE ASEGURAMIENTO 2025-2026 EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ.

El Componente de Aseguramiento, durante el primer semestre de 2025, ha venido estructurando el informe del Plan de Aseguramiento de la Prestación (PAP) conforme a lo dispuesto en el ARTÍCULO 2.3.3.1.2.3. Funciones del Gestor, numeral 7 del Decreto 1425 de 2019, y con el apoyo técnico del grupo de aseguramiento del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT). Este proceso tiene como propósito fortalecer la prestación de los servicios públicos de agua potable y saneamiento básico, alineándose con las fases y requisitos definidos en la normativa vigente.

El PAP 2025-2026 se estructura en torno a cuatro líneas estratégicas, cada una desarrollada dentro de su respectiva fase, para atender de manera integral los principales desafíos del sector:

- Línea Estratégica 1 Fase 1: Diagnóstico integral para el fortalecimiento de la gestión empresarial del prestador de servicios públicos. Contempla la realización de un diagnóstico integral que incluya los componentes institucional, legal, administrativo, financiero, comercial y técnico-operativo, permitiendo caracterizar el estado actual de la prestación de los servicios y establecer una línea base para la formulación de acciones de mejora.
- Línea Estratégica 2 Fase 2: Formulación de la estrategia para asegurar la prestación de los servicios públicos. Consiste en formular la estrategia para asegurar la prestación de los servicios públicos de agua potable y saneamiento básico, conforme al Decreto 1077 de 2015. Esta estrategia considerará alternativas como el fortalecimiento institucional, transformación empresarial o revisión de contratos de operación, basándose en los resultados del diagnóstico integral realizado.
- Línea Estratégica 3 Fase 3: Uso y destinación de los recursos SGP-APSB. Dirigida a implementar acciones de acompañamiento y asistencia técnica a las administraciones municipales y prestadores, con el objetivo de optimizar la planeación, ejecución y control de los recursos del Sistema General de Participaciones para Agua Potable y Saneamiento Básico (SGP-APSB), contribuyendo así a la reducción de los niveles de riesgo asociados a su manejo.











Informe de Seguimiento del PEI

Línea Estratégica 4 - Fase 3: Calidad del agua. Enfocada en fortalecer la capacidad operativa de las Plantas de Tratamiento de Agua Potable (PTAP), mediante la dotación de equipos básicos de monitoreo y control, para garantizar el cumplimiento de los estándares de calidad establecidos por la normativa vigente y reducir el Índice de Riesgo de la Calidad del Agua (IRCA).

Adicionalmente, el Componente de Aseguramiento espera obtener concepto favorable sobre el PAP por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y dar inicio a la ejecución del plan durante el segundo semestre de 2025, asegurando así la implementación oportuna de las estrategias propuestas y contribuyendo al mejoramiento sostenible de los servicios de agua potable y saneamiento básico en el departamento.

3.2. PACA PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL AGUA - PACA.

En relación al proyecto Plan de Aseguramiento de Calidad de Agua "PACA", que fue aprobado en el 2018, por el MVCT, me permito allegar un informe que permita visibilizar el estado de la ejecución de los ocho (8) programas del PACA, teniendo en cuenta que no se ha dado cierre al mismo.

A continuación, se relacionan los programas que comprenden el PACA:

- Programa de capacitación y Asistencia Técnica a los prestadores de servicio de acueducto. 1.
- Programa de implementación de un equipo básico de control de calidad de agua. 2.
- Programa de optimización del equipamiento de las PTAP.
- Programa de optimización de sistemas de desinfección en las PTAP. 4.
- Programa de optimización de sistema de dosificación de químicos (coagulantes y ayudantes 5. de coaquiación y/o estabilizadores de pH), para las PTAP convencionales.
- Programa de instalación de macro medición en las PTAP. 6.
- Programa de optimización de puntos de toma de muestras concertados en red de distribución. 7.
- Programa de análisis de laboratorios fisicoquímicos y bacteriológicos para seguimiento y 8. control de calidad de agua.

Respecto a su ejecución y desarrollo, se consolido la información en la tabla 1.











Informe de Seguimiento del PEI

3.2.1. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL AGUA - PACA.

PROGRAMA/SUBPROGRAMAS PACA	APROBADO PACA	CONTRATISTA	VALOR EJECUTADO	SALDO	VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO
Programa de Capacítación y Asistencia Técnica a los prestadores de Servicio de Acueducto	52.500.000,00	9012 Q. 12 14 14	89.750.000,00	-37.250.000,00	E. Francisco
Subprograma de capacitación para operarios de planta de tratamiento.		María Angélica Losada Olarte	85.00		ок
Subprograma de capacitación para fontaneros	o aldinota is	María Angélica Losada Olarte	81.000.000,00	AND	ок
Subprograma de certificación en competencias laborales		María Elza Morales García	8.750.000,00		ОК
para operarios de acueducto	DAGLIADA	María Elza Morales García	AASUDBAA	22.500.000,00	OK
Programa de Implementación equipo básico de control de calidad de agua	449.724.871,00		43.812.896,00	405.911.975,00	
Subprograma de mantenimiento y calibración externa de equipos existentes	43.812.896,00	CM y CIA Compañía Limitada	43.812.896,00	TOVM is not concern (40 months)	OK
Subprograma dotación kit básico de laboratorio	405.911.975,00	INGEODER PHARMA	491.521.838	54.950.360,36	EN EJECUCION
Programa de optimización del equipamiento de las PTAP	1.554.292.800,0 0	UTP PACA 2019	1.475.808.669,4	78.484.130,60	20000000
Reposición de válvulas	no kola som	ST sinnuari	un minne in ear	so do emeno	SARA P
Reposición de módulos de sedimentación	3 Sharaskel	elima mi	e oponomia.	this esta survivanta	OK
Reposición de lechos filtrantes	ATTO ALL NO.		do esta masserassa		
Programa de optimización de sistemas de desinfección en las PTAP	306.450.000,00	UTP PACA 2019	326.053.080,60	-19.603.080,60	
Instalación de sistema de cloración de solución al vacío para la dosificación de gas cloro	o nobsesia d 179 sai si se	i en succiona e Chica en a soci		SA CO BINSON	
Instalación de bomba dosificadora para cloración con hipoclorito de calcio en solución	ATTANLE I	Nobem o gan	- SALWOEW!		ОК
Dotación de elementos de seguridad personales y colectivos para el manejo del cloro	econvinidos	en de a Mil seneime	o de Siediai	s so emen	
Programa de optimización de sistema dosificación de químicos (coagulantes y ayudantes de coagulación y/o estabilizadores de pH), para las PTAP convencionales.	262.536.000,00		175.045.000,00	87.491.000,00	
Realización de pruebas de tratabilidad	artifican ar cu	EN EJECUCIÓN	o iveribal y 100	45.040.310,00	OK
3 dotación de sistema de dosificación de productos químico		UTP PACA 2019	175.045.000,00		OK
3.1.6. Programa de macromedición para las PTAP	699.840.000,00	UTP PACA 2019	595.218.000,00	104.622.000,00	
Instalación de macromedición en entradas y salidas de las PTAP			595.218.000,00		OK
3.1.7. Programa de optimización de puntos de toma de muestras concertados en red de distribución	280.000.000,00		250.000.000,00	30.000.000,00	
Construcción de puntos de toma de muestras concertados		CONTRATAR SAS	250.000.000,00		OK
3.1.8. Programa de análisis de laboratorios fisicoquímicos y microbiológicos para seguimiento y control de calidad de agua, en laboratorio autorizado por INS.	173.905.000,00	SERVAF S.A. E.S.P.	147.116.992,36	26.788.007,64	OK
Interventoría a programas de: optimización del equipamiento de las PTAP, sistemas de desinfección en las PTAP, optimización de sistemas de dosificación de químicos para las PTAP convencionales (subprograma dotación de sistemas de dosificación de productos químicos) y macro medición.		JOSE MAURICIO ESPINEL GARNICA	166.972.800,00		ОК











Informe de Seguimiento del PEI

Actualmente el subprograma de Kit de Laboratorio se encuentra contratado bajo la modalidad de compraventa No. 202400001078, con el número de proceso DC-PDA-SIE-022-2024. El acta de inicio fue suscrita el 23 de enero de 2025 con la empresa INGEODER PHARMA S.A.S., estableciéndose un plazo de ejecución de 5 meses, hasta el 23 de junio de 2025. La supervisión del contrato está siendo realizada por el Plan Departamental de Agua.

Durante el mes junio se iniciaron las entregas de kit de Laboratorio a los municipios del departamento de acuerdo a lo consolidado en el contrato de compraventa No. 202400001078.

Las entregas se realizaron de acuerdo a la siguiente tabla.

Cronograma de Recibo, Entregas y Capacitaciones Ejecutado durante el mes de junio.

CRONOGRAMA ENTREGA DE EQUIPOS DE LABORATORIO									
MUNICIPIO	LUGAR	FECHA	HORA	IMAGEN					
EMASKA M		200 M SE	a go sea	The Control of the Co					
the prince		ad the sales		THE RESERVE TO SERVE THE PARTY OF THE PARTY					
		1							
2 0		le sousitee.	san et d	HO OH					
, vele-dg		1	LONG TO THE REAL PROPERTY OF THE PERTY OF TH	State of the state					
MORELIA	OFICINA DE SERVICIOS	03 DE JUNIO	8:00 a. m.	1300 A substitution of the					
MORELIA	PÚBLICOS DE MORELIA								
		.291	niani.						
are with a contract of				777					
				The second secon					
		20 30 31: 03		PESTAL Larger Co.					
3.00	All of the same of		Adlu Didien en	Recepción y entrega de equipos al municipio de Morelia.					
Annual Control of the									
			1000						
		A AN ELLEN TO THE							
	The same of the sa								
LA MONTAÑITA	SERVIMONTAÑITA S.A E.S.P.	10 DE JUNIO	8:00 a. m.						
Appeller Service (Sept.) The									
	and the second of the second o								
				Recepción y entrega de equipos					
		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1127 757 11741	municipio de La Montañita.					








Versión 1.0 17/01/2020



Informe de Seguimiento del PEI

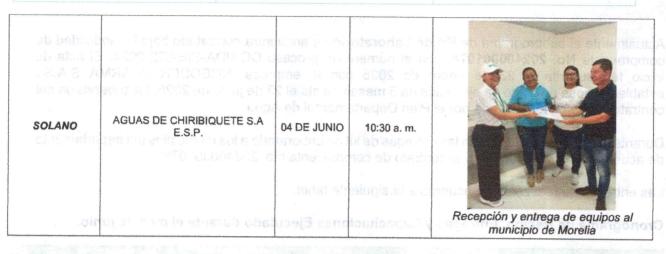

El día 14 de junio el contratista solicitó una prórroga del plazo de ejecución del contrato de compraventa por un plazo de 20 días, justificado en retrasos en "la diligencia de nacionalización de los equipos correspondientes al ítem 07 "Agitadores magnéticos" y dos unidades de el ítem 04 "Incubadora Digital" cuyas referencias son de las marcas DAIHAN SCIENTIFIC y BEING. respectivamente, las cuales debieron ser importadas". De acuerdo a lo anterior, se emitió un concepto favorable y se concedió otro si por el término solicitado dejando como nueva fecha de vencimiento el día 12 de julio de 2025. Se anexa la solicitud, el concepto favorable y el otro sí.

De acuerdo a lo anterior, se solicitó al contratista la actualización de las garantías. Se pretende actualizar el cronograma a la semana entre el 7 y el 11 de julio de 2025.

Cronograma de recibo, entregas y capacitaciones.

	CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 202490001078		
	CRONOGRAMA ENTREGA DE EQUIPOS DE LABORATORIO		
MUNICIPIO	LUGAR	FECHA	HORA
CURILLO	EMPRESA DE SERVICIOS DE CURILLO "ESERCU S.A E.S.P. (ESERCU S.A. E.S.P)	7 de julio	9:00 a. m.
VALPARAISO	EMPRESA PRESTADORA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DEL MUNICIPIO DE VALPARAISO CAQUETA AGUASVALP S.A.S E.S.P.	8 de julio	8:30 a. m
PUERTO RICO	AGUA RICA (S.A. E.S.P.)	9 de Julio	8:30 a. m.
CARTAGENA DEL CHAIRA	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICO DE CARTAGENA DE CHAIRA (EMSERPUCAR S.A E.S.P.)	10 de julio	9:00 a. m.
SOLITA	EMSERSOL S.A E.S.P.	11 de julio	9:00 a. m.

3.3. ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL.

Durante el periodo de mayo y junio de 2025, el grupo interdisciplinario del componente de aseguramiento adelantó diversas acciones orientadas a fortalecer las capacidades institucionales de los actores municipales y regionales responsables de la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo. Estas actividades, de carácter operativo, técnico, administrativo,









Informe de Seguimiento del PEI

Versión 1.0 17/01/2020

comercial y financiero, buscan garantizar la sostenibilidad de las inversiones y de la prestación de los servicios en el mediano y largo plazo. A continuación, se presentan las principales actividades desarrolladas en este periodo:

Actividades de Fortalecimiento Desarrolladas durante mayo junio

TEMA	MUNICIPIO	PARTICIPANTES	REGISTRO FOTOGRÁFICO
Fortalecimiento institucional- Asistencia técnica a la Empresa de Servicios Públicos SERVIMONTAÑITA S.A E.S.P.	La Montañita	Gerente Empresa de servicios públicos	
Fortalecimiento institucional- Asistencia técnica a la Empresa de Servicios Públicos EMSERPA S.A E.S.P.	Albania	Gerente Empresa de servicios públicos	EMSERPA S.A. ESP.
Fortalecimiento institucional a la Empresa de Servicios Públicos del municipio de Belén de los Andaquíes, Aguas Andaki S.A. E.S.P.	Belén de los Andaquies	Gerente Empresa de servicios públicos	
Fortalecimiento institucional a la Asociación de Usuarios de Servicios Públicos Domiciliarios de la Esmeralda	Inspección La Esmeralda de Puerto Rico.	Equipo de trabajo asociación	









Informe de Seguimiento del PEI

green transfer and the company of th			
Fortalecimiento institucional al esquema diferencial Dos Quebradas zona rural del municipio de Florencia	Florencia	Jefe oficina de servicios públicos de Florencia y Gestor Esquema diferencial.	Florence, Cacueta, Colonica Florence, Cacueta, Cacueta, Colonica Florence, Cacueta,
Asistencia técnica a la Empresa de Servicios públicos del municipio de Solano, Aguas del Chiribiquete S.A. E.S.P.	Solano	Gerente y personal operativo Empresa de servicios públicos	
Asistencia técnica a la Empresa prestadora de los servicios públicos domiciliarios en el municipio Puerto Rico Caquetá AGUA RICA S.A.S E.S.P.	Puerto Rico	Gerente y asesor ambiental Empresa de servicios públicos	
Capacitaciones técnicas operativas a personal de la Empresa de Servicios Públicos del municipio de Florencia SERVAF S.A. E.S.P. acerca de: Parámetros de calidad de agua para consumo humano Marco legal agua potable Resolución 2115 de 2007 Proceso de Potabilización del Agua para consumo humano	Florencia	Personal operativo planta de tratamiento de la empresa de servicios públicos	
Capacitación técnica operativa en la Empresa de Servicios públicos del municipio de Solano, Aguas del Chiribiquete S.A. E.S.P. en <u>Proceso de Potabilización del Agua para consumo humano</u>	Solano	Personal operativo planta de tratamiento de la empresa de servicios públicos	









Informe de Seguimiento del PEI

PROYECTOS

Proyectos Viabilizados por Contratar 2025.

					Valor		Valor por Fuente			Fecha de	
Municipio	Nombre del Proyecto/Actividad	Número de Comité	Servicio(s)	Servicio(s) Ubicación		Municipio	Departamento	Nación	Otro	Presentación al Comité Técnico	Estado
Solano	Construcción del Relleno Sanitario y Obras Complementarias en el municipio de Solano – Caquetá Fase 1		Aseo	Urbano	1.299.265.979	1.299.265.979	0			16 de noviembre de 2023	APROBADO
Curillo	Construcción de Alcantarillado Sanitario entre las calles 9ª al 11 y entre las carreras del 2ª al 4ª del municipio de Curillo.		Alcantarillado	Urbano	667.603.489	393.987.677	273.615.812			02 de octubre de 2024	APROBADO
	Desarrollo Ejecución de Obras de Mitigación del Riesgo por el Desabastecimiento de Agua Potable, en la Bocatoma sobre la quebrada Las Margaritas Línea de Aducción y PTAP los Naranjos del municipio de La Montañita, departamento del Caquetá	Comité Técnico 03	Acueducto	Urbano	980.000.000	479.498.000	500.502.000			23 de diciembre de 2024	APROBADO
Puerto Rico	Reposición Parcial del Alcantarillado barrio Oasis municipio de Puerto Rico Caquetá	Comité Técnico 03	Alcantarillado	Urbano	655.166.678	55.166.678	600.000.000			23 de diciembre de 2024	APROBADO

Proyectos en Proceso de Contratación.

Municipio	Nombre del Proyecto/Actividad	Estado	Servicio(s)	Ubicación	Valor (Pesos)	Fuente(s)	Fecha de Publicació n en el SECOP	Observaciones
Curillo	Realizar La Interventoria Integral, la cual Efectuará el Seguimiento de los Aspectos Contractuales, Técnicos, Administrativos, Financieros, Sociales y Ambientales al Contrato de Obra cuyo Objeto es: Ejecución de la Obra Civil del proyecto denominado Construcción de Alcantarillado Sanitario entre las Calles 9 al 11 y entre las Carreras del 2 al 4 del municipio de Curillo - Caquetá.	Contrato celebrado	Alcantarillado	Urbano	39.892.021,00	Componente en Infraestructura en Agua y Saneamiento PA FIA - SGP - Agua Potable y Saneamiento Básico	26/05/2025	Pendiente cumplimiento de requisitos para suscribir Acta de Inicio.
Milán	Realizar la Interventoría Integral, la cual efectuará el Seguimiento de los Aspectos Contractuales, Técnicos, Administrativos,		Aseo	Urbano	69.165.757	Componente de la Prestación de los Servicios de Agua y	Sec. 19	Realizar La Interventoría Integral, la cual efectuará el Seguimiento de los Aspectos Contractuales, Técnicos, Administrativos,











Informe de Seguimiento del PEI

Versión 1.0 17/01/2020

	Commence of the Commence of th							
2000	Financieros, Sociales y Ambientales al Contrato de Obra cuyo objeto es: Adecuación y Canalización de Aguas Lluvias en la Calle 4, entre Cra 2 A la Cra 6, del casco urbano de La Inspección de San Antonio de Getuchá, municipio de Milán, departamento del Caquetá.	March 1983	A PROPERTY OF S	184951	38/80: 64/00	Saneamiento y Desarrollo Institucional.		Financieros, Sociales y Ambientales al Contrato de Obra cuyo objeto es: Adecuación y Canalización de Aguas Lluvias en la Calle 4, entre Cra 2 a la Cra 6, del casco urbano de la inspección de San Antonio de Getuchá, municipio de Milán, departamento del Caquetá.
and as a contrasti	Ejecutar la Obra Civil del Proyecto Denominado Desarrollo Ejecución de Obras de Mitigación del Riesgo por el Desabastecimiento de Agua Potable, en la Bocatoma sobre la quebrada Las Margaritas Iínea de Aducción y PTAP Los Naranjos del municipio de La Montañita, departamento del Caquetá.	Publicado en	Acueducto	Urbano	907.407.407	Componente en Infraestructura en Agua y Saneamiento PA FIA - SGP - Agua Potable y Saneamiento Básico	22/05/2025	En proyecto de Pliego de condiciones.

Proyectos en Ejecución y/o Suspendidos

Municipio(s)	And the second s	Estado	Ubicación	Valor Contratado	Valor Adiciones	% de Ejecución	Avance Financiero	No de Prorr ogas	No de Suspensio nes	Fecha de Terminación (Real o Estimado)
San José del Fragua	Realiza la Interventoría Técnica, Administrativa y Financiera al Contrato que tiene por Objeto "Reposición y Mejoramiento de la Segunda Etapa de la Red de Alcantarillado Sanitario de la inspección de Fraguita municipio de San José del Fragua, Caquetá"	Proceso de Liquidación	Urbano	46.300.144,5	0	100%	0%	0	0 (1979)	26/12/2023
Albania	Construcción de Box Coulvert 2.00 X 1.50 m en el barrio Villa Demo, Calle 1ra y 2da sur del municipio de Albania, departamento de Caquetá	Liquidado	Rural	554.237.748	0	100%	86,72%	0	0	16/11/2023
Albania	Realizar la Interventoría Técnica, administrativa y Financiera al contrato que tiene por Objeto "Construcción de Box Coulvert 2.00 X 1.50 m - barrio Villa Demo calle 1ra y 2da sur del municipio de Albania, departamento de Caquetá	Liquidado	Rural	41.626.200	0	100%	100%	0	0	16/11/2023
Belén de los	Optimización del Sistema de Acueducto (Adecuación Bocatoma, Desarenador, Cambio Red de Conducción, Adecuación PTAP) para el municipio de Belén de los Andaquíes – Caquetá	Suspendido	Urbano	1.973.850.210	984.238.953	84%	79%	3	4	20/07/2025
Andaquies	Interventoría para la Optimización del Sistema de Acueducto (Adecuación Bocatoma, Desarenador, Cambio de Red de Conducción, Adecuación PTAP) para el municipio de Belén de los Andaquíes Caquetá	Suspendido	Urbano	157.862.574	78.840.401	84%	58%	3	4	20/07/2025

Página 16 de 37

THE WAS DESIGNATED AND THE PARTY.







Informe de Seguimiento del PEI

Municipio(s)	Nombre del Proyecto/Actividad	Estado	Ubicación	Valor Contratado	Valor Adiciones	% de Ejecución	Avance Financiero	No de Prorr ogas	No de Suspensio nes	Fecha de Terminación (Real o Estimado)
Milán	Construcción del Acueducto Incluye PTAP de San Antonio de Getuchá - municipio de Milán - departamento del Caquetá	Liquidado	Rural	1.735.052.751	0	100%	0%	3	2	20/12/2023
Milán	Interventoría Integral (Técnica, Administrativa, Contable, Financiera, Jurídica y Ambiental) al Contrato de obra que tiene por Objeto: "Construcción del Acueducto Incluye PTAP de San Antonio de Getuchá municipio de Milán - departamento del Caquetá	Liquidado	Rural	93.677.847	0	100%	0%	3	2	20/12/2023
Valparaíso	Interventoría Integral (Técnica, Administrativa, Financiera, Contable y Jurídica) del contrato que tiene por Objeto "Optimización del Sistema de Acueducto para el casco urbano del municipio de Valparaíso – Caquetá	Liquidado	Rural	110.148.311	0	100%	100%			06/10/2022
Florencia	Mejoramiento de la Calidad de Vida de la Población Vulnerable de Florencia en el departamento del Caquetá, a través de la Ampliación del Sistema de Acueducto para los barrios: Villa Clara, Nápoles, Villa Real y El Timmy, Florencia.	En ejecución	Urbano	8.178.120.849	0	59%	44,46%	2	1	17/08/2025
Florencia	Interventoria Técnica, Administrativa, Financiera y Ambiental al contrato de Obra Civil que tiene por Objeto "El Mejoramiento de la Calidad de Vida de la Población Vulnerable de Florencia en el departamento del Caquetá, a través de la Ampliación del Sistema de Acueducto para los barrios: Villa Clara, Nápoles, Villa Real y El Timmy – Caquetá.		Urbano	817.839.648	0	59%	44,46%	2	1	17/08/2025
Florencia	Interventoría Integral (Técnica, Administrativa, Contable, Jurídica y Ambiental) Al Contrato de Obra que por Objeto: Construcción de Box Coulvert de Canal Cerrado en el Caño Brisas del Hacha ubicado en la Comuna Norte del municipio de Florencia, Caquetá.	Liquidado	Urbano	252.381.150	126.190.575	100%	90,49%	4	4	08/10/2021
Florencia	Realizar los Estudios y Diseños para la Construcción del Sistema de Alcantarillado del Barrio La Esmeralda del municipio de Florencia, departamento del Caquetá	Liquidado	Urbano	55,000,000	0	100%	100%	1	1	31/10/2024
La Montañita	"Construcción de la Red de Distribución de Agua	Liquidado	Urbano	584,457,962	0	100%	100%	0	2	09/02/2024
La Montañita	Realizar Interventoría Técnica, Administrativa y	Proceso de Liquidación	Urbano	58,295,125.00	0	100%	0%	0	2	09/02/2024









Informe de Seguimiento del PEI

Versión 1.0 17/01/2020

Municipio(s)	Nombre del Proyecto/Actividad	Estado	Ubicación	Valor Contratado	Valor Adiciones	% de Ejecución	Avance Financiero	No de Prorr ogas		Fecha de Terminación (Real o Estimado)
- Althornia	Potable barrio Las Palmas en el municipio de La Montañita Caquetá"	a maga bartha	**SANTENSA A	27724243		Sec. Sec.				
Morelia	Construcción Red de Acueducto y Planta de Tratamiento de Agua Potable para el casco urbano del município de Morelia - departamento de Caquetá	Ejecución	Urbano	3.500.000.000	0	97.5%	86.1%	3	0	22/05/2025
Morelia	"Interventoría Integral Técnica, Administrativa, Financiera, Contable, Jurídica y Ambiental al Contrato de Obra cuyo Objeto es "Construcción Red de Acueducto y Planta de Tratamiento de Agua Potable para el casco urbano del municipio de Morelia departamento de Caquetá"	Ejecución	Urbano	332,343,200	0	94.4%	0%	3	0	22/05/2025
Morelia	Realizar la Interventoría, Técnica, Jurídica, Administrativa y Contable del Contrato que tiene por objeto: Construcción de Tramos de Alcantarillado en el municipio de Morelia, departamento de Caquetá.	En Proceso de Liquidación	Urbano	98.313.249	0	100%	0%	1	0	28/02/2025
Belén de los Andaquíes	Realizar Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental al contrato que tiene por objeto "Reposición del sistema de alcantarillado del Centro Poblado Rural Puerto Torres del municipio de Belén de los Andaquíes-Caquetá"	Liquidado	Rural	38.297.047	Ô	100%	100%	0	0	28/02/2025

Proyectos en Proceso de Incumplimiento

lunicipio(s)	The second of th	Estado	Ubicación	Valor (Pesos)	% de Ejecución	Fecha de Terminación (Real o Estimado)	Inconveniente Presentado
Curitlo	Construcción de la Celda No. 3 y Obras Complementarias en el Relleno Sanitario para la Disposición Final de los Residuos Sólidos Ordinarios Generados en la cabecera municipal de Curillo	En proceso de incumplimiento	Urbano	\$1.283.948.626		121	Se solicitó proceso de presunto incumplimiento.
Curillo	Interventoría Integral (Técnica, Administrativa, Contable, Jurídica y Ambiental) al contrato de obra que tiene por objeto: "Construcción de la Celda No. 3 y Obras Complementarias en el Relleno Sanitario para la Disposición Final de los Residuos Sólidos Ordinarios Generados en la cabecera municipal de Curillo		Urbano	\$ 102.715.890,0			Se solicitó proceso de presunto incumplimiento.
Curillo,	Estudios de Factibilidad y Diseños para la Optimización del Sistema de Alcantarillado, Manejo de Aguas Lluvias y Diseño del Sistema de	En proceso de liquidación	Urbano	Consultoría \$1.463.702.701	93,24%	24/7/2023	Mediante resoluciones 000187 del 07/02/2025 y 000698 del 14/04/202

Página 18 de 37

POR A SERVER A SERVER S







Informe de Seguimiento del PEI

Andaquies y	Tratamiento para Aguas Residuales Domésticas para el Casco Urbano de los municipios de Curillo, Albania, Belén de los Andaquies y Cartagena del Chairá			Interventoria \$102.459.190,0	emitidas por el departamento jurídico de la Gobernación del Caquetá se declaró que los contratistas no incumplieron, los contratos de consultoría e interventoría se encuentran en etapa de liquidación.
José del Fragua,	Realizar la Interventoria Técnica, Administrativa y Financiera a la Consultoria de Estudios y Diseños de Proyectos en el Marco del Programa Agua para la Prosperidad - Plan Departamental de Agua del Caquetá.	En proceso de	Urbano	70'234.519.0	









Informe de Seguimiento del PEI

6. COMPONENTE AMBIENTAL Y GESTIÓN DEL RIESGO.

El componente ambiental y de gestión del riesgo, en el periodo las siguientes actividades, las cuales responden a las necesidades argumentadas en la matriz de costos del gestor:

ACTIVIDADES COMPONENTE AMBIENTAL

20 de mayo se realizó comité N°30 del proyecto "Mejoramiento de la Calidad de Vida de la Población Vulnerable de Florencia en el departamento del Caquetá, a través de la Ampliación del Sistema de Acueducto para los barrios: Villa Clara, Nápoles, Villa Real y Timmy — Caquetá".





27 de mayo de 2025, se realizó una visita técnica a la obra del proyecto "Mejoramiento de la Calidad de Vida de la Población Vulnerable de Florencia en el departamento del Caquetá, a través de la Ampliación del Sistema de Acueducto para los barrios: Villa Clara, Nápoles, Villa Real y Timmy – Caquetá".





22 de mayo se inició el proceso de apoyo en la gestión de supervisión del contrato cuyo objeto es "Adquisición de Vehículo Compactador Recolector de Residuos Sólidos para el municipio de San Vicente del Caguán, departamento de Caquetá". Por un Valor del contrato de: \$975.673.225, con un plazo de ejecución de 2 meses.

Seguimiento a los mínimos ambientales, el día 8 de mayo del presente año, en las instalaciones de la Empresa Prestadora de servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo del Municipio de Valparaíso Caquetá AGUASVALP SAS ESP





Solicitud a la Secretaría de Ambiente y Agricultura Departamental, mediante memorando 292 el día 22 de mayo, con la finalidad de realizar seguimiento a la ejecución de los proyectos vigencia 2024, 2025

20 de mayo se realizó reunión para concertar Plan de acción 2025 de la mesa técnica de calidad de agua













Informe de Seguimiento del PEI

Versión 1.0 17/01/2020

El día 14 de mayo, La Institución Educativa Valparaíso del Municipio de Valparaíso se une con la participación del grado séptimo, con una charla que motiva e incentiva la educación ambiental





El día 16 de mayo, La Institución Educativa Omar Gómez Chávez, grado décimo del Municipio de Valparaíso, comprometido con el medio ambiente, se une hacer a este proceso de socialización sobre acciones al ahorro y uso eficiente de agua





20 de mayo del presente año se realizó capacitación a estudiantes de grado quinto de la Institución Educativa José Eustasio Rivera del Municipio de Morelia.





06 de junio de 2025 se llevó a cabo una visita técnica al proyecto de construcción del Sistema de Alcantarillado en el municipio de Morelia, Caquetá.





19 de junio del presente año, se realizó visita técnica y ambiental al proyecto denominado "Optimización del Relleno Sanitario El Cairo municipio de San José del Fragua, departamento de Caquetá"















Informe de Seguimiento del PEI

En cumplimiento a esta obligación, se realizó seguimiento a los mínimos ambientales, el día 17 de junio del presente año, en las instalaciones de la Empresa Prestadora de servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo del Municipio de Belén de los Andaquíes Caquetá AGUAS ANDAKI S.A E.S.P.





10 de junio del presente año, la Institución Educativa Cervantes del Municipio de Morelia se une a conmemorar el día mundial del medio ambiente, con estudiantes de grado séptimo





11 de junio en la institución Educativa Rural la Libertad del Municipio de Florencia con grado quinto, se conmemora el día Mundial del Medio Ambiente



COMPONENTE AMBIENTAL



08 de mayo de 2025: Mesa de seguimiento del contrato de obra pública para la reposición y mejoramiento del sistema de alcantarillado pluvial en el barrio Belalcázar, municipio de El Doncello

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD









Informe de Seguimiento del PEI

Versión 1.0 17/01/2020

09 de mayo de 2025: Mesa de trabajo en el marco del seguimiento del contrato de obra pública para la construcción de una red de acueducto y una planta de tratamiento de agua potable en el municipio de Morelia



15 de mayo de 2025: Visita técnica al proyecto del acueducto de Morelia



15 de mayo de 2025: Socialización en el municipio de El Doncello el proyecto de reposición y mejoramiento del sistema de alcantarillado pluvial de Belalcázar.



04 de junio de 2025: Visita Técnica al proyecto "Construcción de la Celda No. 3 y obras complementarias en el Relleno Sanitario para la Disposición Final de los Residuos Sólidos Ordinarios Generados en la cabecera municipal de Curillo"













Informe de Seguimiento del PEI

09 de junio de 2025: Visita Técnica para evaluar una emergencia relacionada con la tubería de conducción del acueducto en el municipio de Valparaíso, Caquetá



10 de junio de 2025: una visita técnica e inspección ocular en la vereda Alto San Pedro, municipio de El Doncello, para evaluar una remoción en masa en la zona



12 de junio de 2025: visita técnica a la obra que se ejecuta en el municipio de El Doncello, barrio Belalcázar, en compañía del componente técnico, social y ambiental del Plan Departamental de Agua Del Caquetá



25 de junio de 2025: Se realizó una visita técnica a la obra en ejecución en el municipio de El Doncello, específicamente en el barrio Belalcázar, para evaluar el progreso de la construcción del box Coulvert.











Informe de Seguimiento del PEI

se llevó a cabo la revisión de las actividades ambientales del Contrato de Interventoría No. 202300000285 cuyo objeto es "Realizar Interventoría Técnica, Administrativa y Financiera al contrato que tiene por objeto "Construcción de la Red de Distribución de Agua Potable barrio Las Palmas en el municipio de La Montañita Caquetá"

Forestics Mays 30 to 2003

Improved May 30 to 2003

May A Cadocum Table And Buttando
Colorer of All Calgado Stress

May A Cadocum Servania Stress Adabasessis Coloreda de Servandon St.

Franchisto Andrew Servania Stress Adabasessis Coloreda de Servandon St.

Franchisto Andrew Servania Stress Adabasessis Coloreda de Servandon St.

Franchisto Andrew Servania Stress Adabasessis Coloreda de Servandon St.

Franchisto Coloreda Coloreda Servania Servania

Se brindó apoyo en la estructuración de los documentos relacionados con la licitación pública para el proyecto denominado "Desarrollo y Ejecución de Obras de Mitigación del Riesgo por el Desabastecimiento de Agua Potable, en la Bocatoma sobre la Quebrada Las Margaritas, Línea de Aducción y PTAP Los Naranjos del Municipio de La Montañita, Departamento del Caquetá"

06 de mayo de 2025: Se llevó a cabo un seguimiento a los mínimos ambientales del municipio de Albania



26 de mayo de 2025: Se realizó un seguimiento a los mínimos ambientales del municipio de La Montañita, Caquetá, con el objetivo de verificar el cumplimiento de las normativas y resoluciones que rigen la gestión ambiental local.













Informe de Seguimiento del PEI

20 de mayo de 2025: Se asistió a la primera reunión de la Mesa Técnica de Calidad del Aire, Ruido y Campos Electromagnéticos



13 de mayo de 2025: Se realizó una capacitación en la Institución Educativa Corazón Inmaculado de María, en el municipio de El Doncello, Caquetá, sobre el cambio climático y el uso eficiente del agua.



26 de junio de 2025: se llevó a cabo un seguimiento de los mínimos ambientales en el municipio de Puerto Rico con el fin de verificar el cumplimiento de los documentos y resoluciones que regulan las actividades ambientales locales.



04 de junio de 2025: se llevó a cabo una visita de seguimiento a los Clubes Defensores del Agua en la Institución Educativa Albania, en el municipio de Albania, Caquetá.









Informe de Seguimiento del PEI

Versión 1.0 17/01/2020

05 de junio de 2025: se realizó una visita de seguimiento a los Clubes Defensores del Agua en la Institución Educativa Agroecológico Amazónico, en el municipio de El Paujil, Caquetá



COMPONENTE GESTIÓN DE RIESGO SECTORIAL

19 de mayo del presente año, en las instalaciones de la Empresa Prestadora de servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo del Municipio de Valparaíso Caquetá AGUASVALP SAS ESP, se realizó jornada de fortalecimiento de Gestión de Riesgo Sectorial, a la Gerente Luz Mary y equipo de trabajo





26 de mayo del presente año, en las instalaciones de la Oficina de servicios públicos de Morelia, se realizó capacitación De acuerdo al Decreto 2157 de 20217





31 de marzo de 2025: Asistencia técnica y capacitación a la Empresa de Servicios Públicos de El Doncello con respecto a los lineamientos establecidos en la Guía para la Incorporación del Análisis de Riesgo de Desastres











Informe de Seguimiento del PEI

Versión 1.0 17/01/2020

06 de mayo de 2025: se llevó a cabo una sesión de asistencia técnica dirigida a la Empresa de Servicios Públicos de Albania



26 de mayo de 2025: Se llevó a cabo una jornada de asistencia técnica dirigida a la Empresa de Servicios Públicos de La Montañita



26 de junio de 2025: En el municipio de Puerto Rico, se llevó a cabo una jornada de asistencia técnica dirigida a la Empresa de Servicios Públicos de Puerto Rico, Agua Rica S.A. E.S.P.



En concordancia al Plan de Gestión de Riesgo Sectorial, se realizó seguimiento a los proyectos en ejecución y/o en proceso de ejecución para la presente vigencia.









Informe de Seguimiento del PEI

7. COMPONENTE SOCIAL

Durante el período evaluado, el Componente Social del Plan Departamental de Agua del Caquetá llevó a cabo las siguientes actividades:

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD	PROYECTO	PARTICIPANTES	EVIDENCIA FOTOGRÁFICA				
Capacitación sobre Ahorro y Uso Eficiente del Agua, orientado a estudiantes de las Instituciones Educativas del departamento.	N/A	 I. E. Corazón Inmaculado de María / El Doncello Institución Educativa Gimnasio Campestre / Florencia Institución Educativa Rufino Quichoya / El Doncello Institución Educativa Imperial Eagles Bilingual School / Florencia. Institución Educativa Rural La Libertad / Sede Altos de Copoazú / Florencia Institución Educativa Cristalina / Troncales / San Vicente del Caguán Institución Educativa Omar Gómez Chávez / Valparaíso Institución Educativa Valparaíso / Valparaíso Institución Educativa José Eustasio Rivera / Morelia Institución Educativa Cervantes / Morelia. Institución Educativa Santafé del Caguán / Vereda Santa fe - Cartagena del Chaira Hotel Bacatá - Florencia 					









Informe de Seguimiento del PEI

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD PROYECTO PARTICIPANTES EVIDENCIA FOTOGIA FOTOGIA PROYECTO PARTICIPANTES EVIDENCIA FOTOGIA Mejoramiento de la	
	GRÁFICA
Calidad de Vida de la Población Vulnerable de Florencia en el departamento del Caquetá, a Través de la Ampliación del Sistema de Acueducto para los barrios: Villa Clara, Nápoles, Villa Real y El Timmy". Seguimiento Social a los Proyectos en etapa contractual y post contractual Seguimiento social al proyecto "Construcción Red de Acueducto y Planta de Tratamiento de Agua Potable para el casco urbano del municipio de Morelia — Caquetá" Visita técnica de seguimiento a la ejecución del proyecto: "Realizar la Interventoria, Técnica, Jurídica, Administrativa y Contable del contrato que tiene por objeto: Construcción de Tramos de Alcantarillado en el municipio de Morelia, departamento del Sistema de Alcantarillado Pluvial en el barrio Belalcázar Carrera 1 del municipio de El Doncello departamento del Caquetá.	









Informe de Seguimiento del PEI

		CREACIÓN CLUB DEFENSO	DRES DEL AGUA				
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD	PROYECTO	PARTICIPANTES	EVIDENCIA FOTOGRÁFICA				
Reunión de socialización y conformación del Club Defensores del Agua	AND SECTION	Machen Lai Sucierria dei Juan Genes Andre s un damies 1954					

SEGUIMIENTO CLUBES DEFENSORES DEL AGUA							
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD	PROYECTO PARTICIPANTES		EVIDENCIA FOTOGRÁFICA				
Seguimiento a Club Defensores del Agua Conformados	N/A	 I. E. Rural Palma Arriba / Montañita I. E. Bajo Caldas / Florencia I. E. Agroecológico Amazónico / Paujil. I. E. Albania / Albania I.E. Los Pinos - Florencia I.E Parroquial - San José del Fragua. I.E Acevedo y Gómez Puerto Rico I. E José María Córdoba - Cartagena del Chaira I.E.R Platanillo - San José del Fragua I.E Campo Elías Marulanda - Solano 		H50 ::			









Informe de Seguimiento del PEI

- I.E Cervantes Morelia
- I.E Omar Gómez Chávez Valparaíso
- I.E.I.R Solita Solita
- I.E Corazón Inmaculado de María El Doncello





SEGUIMIENTO A COMITÉS DE CONTROL SOCIAL							
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD	PROYECTO	PARTICIPANTES	EVIDENCIA FOTOGRÁFICA				
Seguimiento y Acompañamiento a comités de	Mejoramiento de la Calidad de Vida de la Población Vulnerable de Florencia en el departamento del Caquetá, A través de la Ampliación del Sistema de Acueducto para los Barrios: Villa Clara, Nápoles, Villa Real y El Timmy.	Juan Carlos Ardila	EC RE				
control social y Veedores	Construcción Red de Acueducto y Planta de Tratamiento de Agua Potable para el casco urbano del municipio de Morelia - departamento de Caquetá	Diógenes Roa, María Santos Cuellar					









Informe de Seguimiento del PEI

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD	PROYECTO	PARTICIPANTES	EVIDENCIA FOTOGRÁFICA
	Construcción Red de Acueducto y Planta de Tratamiento de Agua Potable para el casco urbano del municipio de Morelia - departamento de Caquetá"	Martha Cecilia Cuellar Profesional Social	
Registro de seguimientos realizados	Hoterda Compon	tile Anymental	
nforme de revisión del Plan de Gestión Social, Registro de vallas nstaladas de acuerdo a los ineamientos del PDA	E Rural La Lucque - Corpusion - Corpus es Allos de Coposito - Corpus	e Graco Cuarte erra Cucial	
	Mejoramiento de la Calidad de Vida de la Población Vulnerable de Florencia en el departamento del Caquetá, A través de la Ampliación del Sistema de Acueducto para los Barrios: Villa Clara, Nápoles, Villa Real y El Timmy.	Leidy Tatiana Jara Profesional Social	









Informe de Seguimiento del PEI

		CAPACITACIÓN CUIDADO I	DEL AMBIENTE		
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD	PROYECTO	PARTICIPANTES	EVIDENCIA FOTOGRÁFICA		
Capacitación y Sensibilización en cuidado del ambiente,	I. E. José Eustasio Rivera - Morelia I.E Cervantes – Morelia I.E Omar Gómez Chávez - Valparaíso	Grado Quinto Componente Ambiental. Componente Social Estudiantes Grado Sexto A Componente Ambiental. Componente Social Estudiantes Grado Séptimo Componente Ambiental. Componente Social			
reducción del cambio climático y efecto invernadero	I. E. Rural La Libertad - Sede Altos de Copoazú - Florencia	Estudiantes Grado Quinto Componente Social - Componente Ambiental			

NOTAS INFORMATIVAS						
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD	PROYECTO	PARTICIPANTES	EVIDENCIA FOTOGRÁFICA			
Notas Informativas del Desarrollo de las Actividades Realizadas		Profesionales Componente Ambiental y Social del PDA Caquetá.	The control of the co	The second secon		









Informe de Seguimiento del PEI

Versión 1.0 17/01/2020

8. INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LOS COSTOS DEL GESTOR.

Al verificar el avance en el desarrollo de las actividades acumuladas a 30 de junio de 2025, se tiene que los Costos del Gestor, muestran un importante avance en el cumplimiento de las metas, evidenciándose que cada uno de los componentes cumplió con la ejecución en el cumplimiento de las metas.

Realizando el seguimiento en la evolución de los Costos del Gestor 2025, encontramos la siguiente información acumulada:

COMPONENTE	MAYO			JUNIO			CUMPLIMIENTO PDA CAQUETA		
	Planeado	Entregado	% de Cumplimiento	Planeado	Entregado	% de Cumplimiento	Planeado	Entregado	% de Cumplimiento
ADMINISTRATIVA	115	148	100,00%	106	134	100,00%	1.145	584	49,61%
AMBIENTAL	21	24	100,00%	16	18	100,00%	164	80	48,56%
ASEGURAMIENTO	14	13	77,78%	12	10	80,00%	152	62	35,65%
FINANCIERA	25	30	100,00%	42	49	98,21%	263	168	71,43%
INFRAESTRUCTURA	9	12	100,00%	9	14	100,00%	106	69	63,83%
JURIDICA	18	18	100,00%	20	20	100,00%	262	128	43,39%
PLANEACION	6	6	100,00%	4	4	100,00%	55	23	22,92%
SOCIAL	41	47	86,11%	41	43	90,91%	439	195	49,60%
PDA CAQUETA	249	298	95,49%	250	292	96,14%	2.586	1.309	48,12%

En la tabla anterior, se observa el avance de cumplimiento de las metas por componentes de los Costos del Gestor, de acuerdo a las actividades programadas para el bimestre mayo - junio de 2025 por el PDA Caquetá. Se ha alcanzado un cumplimiento del 95.49% para el mes de mayo (298 actividades realizadas de 249 programadas) y del 96.14% para el mes de Junio (292 actividades realizadas de 250 programadas). Transcurrido el 45.45% del tiempo de ejecución del capítulo 2025; tenemos que el PDA Caquetá; en el cumplimiento de las metas cuenta con un acumulado del 48.12% de cumplimiento acumulado en promedio, reportando el haber realizado 1.309 actividades de 2.586 actividades programadas; para lo cual, cada componente acumula el siguiente porcentaje:

- Con un 49.61% de cumplimiento tenemos al Componente Administrativo, reportando el haber entregado 584 actividades de 1.145 actividades planeadas.
- Con un 48.56% de cumplimiento tenemos al Componente Ambiental, reportando el haber entregado 80 actividades de 164 actividades planeadas.
- Con el 30.65% de cumplimiento tenemos al Componente de Aseguramiento, reportando el haber entregado 62 actividades de 151 actividades planeadas.
- Con un 71.63% de cumplimiento tenemos al Componente de Financiero, reportando el haber entregado 168 actividades de 263 actividades planeadas.








Informe de Seguimiento del PEI

Versión 1.0 17/01/2020

- Con el 63.83% de cumplimiento tenemos al Componente de Infraestructura, reportando el haber entregado 69 actividades de 106 actividades planeadas.
- Con el 43.39% de cumplimiento tenemos al Componente Jurídica, reportando el haber entregado 128 actividades de 262 actividades planeadas.
- Con un 22.92% de cumplimiento tenemos al Componente de Planeación, reportando el haber entregado 23 actividades de 55 actividades planeadas.
- Con el 49.60% de cumplimiento tenemos al Componente Social, reportando el haber entregado 195 actividades de 324 actividades planeadas.

Aunque, algunos componentes han realizado más actividades de las programadas, no han alcanzado el 100% de cumplimiento, debido a que realizaron más actividades que no fueron programadas.

En la siguiente gráfica, podemos observar, como es el comportamiento de los componentes del PDA Caquetá, en el cumplimiento de las metas, para el periodo agosto de 2024.

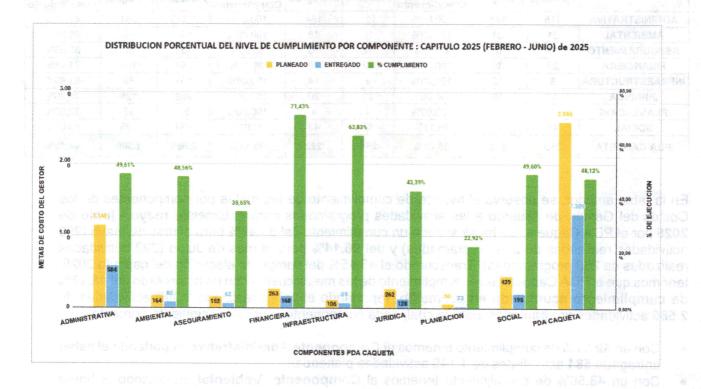

En la gráfica, se presentan los componentes del PDA Caquetá y el nivel de cumplimiento. De color amarillo, se observa la cantidad de actividades planeadas, de color azul se observa la cantidad de actividades entregadas y en color verde se observa el porcentaje del nivel de cumplimiento. Las tres barras finales, se observa el total consolidado del PDA Caquetá, reportando un porcentaje del 48.12% de cumplimiento, en el desarrollo de las metas.









Informe de Seguimiento del PEI

Versión 1.0 17/01/2020

El 48.12% de cumplimiento en promedio, reportado por los Costos del Gestor, permite evidenciar un nivel ALTO de cumplimiento, frente al logro de los objetivos y acerca de las actividades que está desarrollando el PDA Caquetá, en su incidencia en la población del departamento del Caquetá, promoviendo la política de los Planes Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento (PDA), definidos en el Decreto 1425 de 2019; se está cumpliendo de manera satisfactoria, manifestándose en el mejoramiento de la calidad de vida de los caqueteños.

Florencia, julio de 2025.

D BUITRAGO

Secretaria de Infraestructura

Gestora del PDA

Vo.Bo. Yudy Narley García Rojas - Coordinadora PDA

Vo.Bo. Ing. Lina Ortiz-Componente Ambiental y de Gestión del Riesgo

Vo.Bo. Yenny Camelo-Componente Financiero

Vo.Bo. Ing. Neiser Andrés Castro Triviño-Componente Técnico

Estructuró / Diagramó: E. Orlando Parra C. /Apoyo Gestor PDA

Vo.Bo. Ing Salomón González-Componente Aseguramient Vo.Bo. Ana Paola Sierra Pinillos-Componente Social
