




| | | |
|---|---------------------------------------|--|
|  | DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ |  |
|  | Informe de Seguimiento del PEI | Versión 1.0 17/01/2020 |

Informe de Seguimiento al Plan Estratégico de Inversiones – PEI

Fecha de inicio periodo informe: **01 de noviembre de 2025**
 Fecha de terminación periodo informe: **31 de diciembre de 2025**
 No. Informe: **6**

1. Justificación

De acuerdo con el Decreto 1425 de 2019, Artículo 2.3.3.1.2.3. Funciones del Gestor, Numeral 14.2. "Informe bimestral (noviembre – diciembre de 2025) de la ejecución y seguimiento del Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento y de sus instrumentos de planeación, de acuerdo con el formato y medios que el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio determine para tal fin. En el informe también se señalará el avance del Plan Estratégico de Inversiones, detallando el cumplimiento de los cronogramas allí fijados, las metas propuestas, el estado de avance de los proyectos en ejecución y de los procesos de contratación", el Gestor, presenta el siguiente informe a los Miembros del Comité Directivo del PDA del departamento del Caquetá.

De conformidad al Decreto 1425 de 2019, Artículo 2.3.3.1.5.3 ítems 6.6 Párrafo Tercero, establece "La vigencia del Plan Estratégico de Inversiones (PEI) será la misma del periodo de gobierno de las entidades territoriales y del capítulo anual será hasta el 31 de diciembre del año de aprobación"; Por lo tanto, el PEI 2024-2027, se encuentra en proceso de formulación, conforme lo establece el Decreto en mención.




Es importante mencionar que en razón a las modificaciones realizadas por el MVCT a la metodología de estructuración del PEI 2024 - 2027, se ha presentado el siguiente desarrollo para la aprobación y ejecución del Capítulo 2025:

1. En **Comité Directivo No. 57** se aprueba:

- A. Presentación del cierre financiero del Capítulo 2024 del PEI 2024-2027.
- B. Aprobación y asignación de recursos del Capítulo 2025 del PEI 2024-2025.
- C. Asignación de Costos del Gestor Capítulo 2025. por \$1.800. 000.00.

2. En **Comité Directivo No. 58** se hace Aprobación de:

- A. La primera modificación del Capítulo 2025 del PEI 2024-2027.
- B. Incorporación nueva fuente recursos financieros: Regalías 60%.
- C. Incorporación recursos financieros en los componentes Inversión en Infraestructura y Componente de Aseguramiento.
- D. Modificación cierre financiero 2025.
- E. Modificación metas capítulo 2025.

| | | |
|---|---------------------------------------|--|
|  | DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ |  |
|  | Informe de Seguimiento del PEI | Versión 1.0 17/01/2020 |

- F. Presentación modificación PAMs San Vicente del Caguán y San José del Fragua.
- G. Aprobación de delegación contratación a los municipios de San José del Fragua, Morelia, Puerto Rico, Albania y a la ESP del municipio de Curillo.

3. En **Comité Directivo No. 59** se aprueba:

- A. La segunda modificación del Capítulo 2025 del PEI 2024-2027.
- B. Traslado de recursos entre componentes del PEI.
- C. Modificación cierre financiero 2025.
- D. Modificación metas capítulo 2025.
- E. Modificación al Cronograma 2025.
- F. Presentación modificación PAMs de municipios de Solita, Milán y Cartagena del Chairá.
- G. Asignación de recursos a proyectos de Preinversión de los municipios de Milán y Cartagena del Chairá.
- H. Aprobación de delegación contratación al municipio de Solita.

4. En **Comité Directivo No. 60** se aprueba:

- A. Presentación Informe de Cierre Parcial Capítulo 2025 del PEI 2024-2027. (Corte 31 octubre 2025).

| | |
|-----------------------|----------------------|
| Cap. 2025 Planeado: | \$52.200.269.873,46. |
| Cap. 2025 Ejecutado: | \$10.384.840.596,00. |
| Porcentaje ejecución: | 19,89%. |
| PEI 2025 Planeado: | \$50.400.269.873,46. |
| PEI 2025 Ejecutado: | \$8.584.840.596,00. |
| Porcentaje ejecución: | 17,03%. |
- B. Presentación y aprobación a la modificación No.3 del Plan Estratégico de Inversiones - PEI 2024 - 2027 y su Capítulo 2025 del Departamento del Caquetá.

El Gestor PDA solicita el traslado de recursos entre subcomponentes del Componente de Inversión en Infraestructura sin afectar el valor total del PEI Capítulo 2025 aprobado en el Comité Directivo No. 59, por valor de \$52.200.269.873,46 (Fuentes Varias).

- a. Solicitud de aprobación modificación componente de Infraestructura del PEI por traslado de recursos entre subcomponentes.
 - b. Solicitud aprobación de la modificación del cierre financiero 2025, metas 2025 y cronograma 2025 del PEI capítulo 2025 por inclusión y exclusión de proyectos.
 - c. Solicitud aprobación e incorporación en el Componente Gestión del Riesgo Sectorial de 2 proyectos de emergencia de los municipios de Valparaíso y San Vicente del Caguán.
- C. Presentación, Aprobación y Asignación recursos Gestor (enero a julio de 2026), por valor de \$734.000.000 Fuente SGP APSB Departamento.

Informe de Avance del PEI 2024-2027-Capítulo 2025, con corte a 31 octubre de 2025.

| Componente | Subcomponente | Valor Comprometido | Valor Ejecutado Financiero (Expedición de Documento de Compromiso) | Soporte Documento Compromiso (CDR) | Valor Ejecutado (Pagos Realizados) |
|---|--|--------------------------|--|--------------------------------------|------------------------------------|
| Inversión en Infraestructura | Total Inversión en Infraestructura | 34.972.602.743,51 | 5.749.167.371 | | 16,44% |
| | Infraestructura en AAA | 30.514.158.554,91 | 4.373.150.144 | | 14,33% |
| | Canalización de 300 metros de aguas residuales del Caño San Francisco del municipio de Belén de los Andaquíes | 1.840.595.681,50 | | | 0,00% |
| | Construcción mejoramiento y optimización del sistema de alcantarillado de aguas lluvias del barrio la esmeralda del municipio de Florencia, departamento del Caquetá. | 3.589.142.681,13 | | | 0,00% |
| | Construcción del alcantarillado sanitario del centro poblado Santiago de la Selva del municipio de Valparaíso, departamento de Caquetá (primer fase) | 1.290.102.508,61 | | | 0,00% |
| | Optimización de la Planta de tratamiento de agua potable PTAP, en la inspección de Mate guadua del municipio de La Montañita Caquetá | 2.173.210.516,14 | | | 0,00% |
| | Construcción de una planta de tratamiento de agua potable (PTAP), para el centro poblado del corregimiento de Río Negro, municipio de Puerto Rico – Caquetá. | 2.564.834.700,00 | | | 0,00% |
| | Ampliación planta de tratamiento de agua potable casco urbano (PTAP), construcción de modulo adicional (Floculador, sedimentador, filtros y tanque de almacenamiento) Municipio de San José del Fragua, en el Departamento de Caquetá. | 7.582.378.125,00 | | | 0,00% |
| | Construcción del Sistema de Alcantarillado en el municipio de Solita departamento del Caquetá | 1.600.000.000,00 | | | 0,00% |
| | Optimización de redes de Alcantarillado urbano en el Municipio de Solita, Departamento de Caquetá. | 1.678.795.770,00 | | | 0,00% |
| | Optimización de las redes de distribución de alcantarillado urbano en el municipio de Albania, departamento del Caquetá | 1.878.000.000,00 | 1.878.000.000,00 | 17976-17977-17978 | 100,00% |
| | Reposición parcial del alcantarillado barrio oasis municipio de Puerto Rico Caquetá | 655.166.678,00 | 655.166.678,00 | 17972-17973-17974-17975 | 100,00% |
| | Optimización de tramos de alcantarillado en el municipio de Morelia, Departamento de Caquetá. | 1.839.983.466,00 | 1.839.983.466,00 | 17979-17980-17981 | 100,00% |
| | Optimización de la planta de tratamiento de agua potable mediante la adecuación de la Planta de bombeo y Filtros de la PTAP del Municipio de San Vicente del Caguán | 600.000.000,00 | | | 0,00% |
| | Optimización sistema de alcantarillado en barrios del casco urbano del Municipio de San Vicente del Caguán Departamento de Caquetá | 317.621.653,53 | | | 0,00% |
| | Construcción del sistema de suministro de agua para la inspección de Mononguete del municipio de Solano departamento de Caquetá. | 2.904.326.775,00 | | | 0,00% |
| | Reformulaciones | 2.271.161.280,60 | 126.017.227 | | 6% |
| | Bolsa Recursos Reformulaciones | 2.145.144.053,60 | | | |
| | Reformulación a la Construcción del Tanque de almacenamiento en el municipio de Albania, Departamento de Caquetá. | 126.017.227,00 | 126.017.227 | 18664 | 100% |
| | Preinversiones | 2.037.282.908,00 | 1.100.000.000 | | - |
| Formulación y estructuración de los estudios y diseños para la construcción del acueducto y alcantarillado del centro poblado Versailles del municipio de el Paujil – Caquetá | 120.000.000,00 | | | 0% | |
| Formulación y estructuración de los estudios y diseños para la construcción del acueducto del centro poblado Bolivia del municipio de el Paujil - Caquetá | 100.000.000,00 | | | 0% | |

| | | | | | |
|--------------------------------|---|--------------------------|----------------------|-------------------|------|
| | Formulación y estructuración de los estudios y diseños para la optimización sistema de acueducto en sus componentes de captación, desarenador, conducción, PTAP, tanque de almacenamiento y red de distribución del municipio de El Paujil - Caquetá | 273.232.694,00 | | | 0% |
| | Actualización y ajuste de la formulación y estructuración de los estudios y diseños para la construcción de una nueva bocatoma y optimización del sistema de acueducto del casco urbano del municipio de Solano, departamento de Caquetá | 600.000.000,00 | 600.000.000 | 17966-17967-17968 | 100% |
| | Estudios y diseños para la construcción de un acueducto para las comunidades de San Francisco, San Rafael, Santa Rosa e Institución educativa Mamabwe del resguardo indígena Agua Negra del municipio de Milán Departamento de Caquetá . | 300.000.000,00 | | | 0% |
| | Realizar estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo, y elaborar los estudios, diseños e ingeniería de detalle para establecer medidas de mitigación frente al riesgo por crecientes súbitas en la estructura de captación del sistema de acueducto de la cabecera municipal de Cartagena del Chaira, Caquetá. | 144.050.214,00 | | | 0% |
| | Actualización y ajuste de la formulación y estructuración de los estudios y diseños del proyecto construcción etapa uno del colector de alcantarillado sanitario sobre la rivera de la quebrada la sardina municipio de Florencia, departamento de Caquetá. | 500.000.000,00 | 500.000.000 | 17969-17970-17971 | 100% |
| | Mecanismo Departamental | 150.000.000,00 | 150.000.000 | | 100% |
| | Mecanismo Departamental | 150.000.000,00 | 150.000.000 | 18047 | 100% |
| Aseguramiento de la Prestación | Total Aseguramiento | 443.582.092,00 | - | - | 0% |
| | Plan de Aseguramiento de la Prestación | 443.582.092,00 | - | - | 0% |
| | Formulación de Ruta Estratégica Para Asegurar la Prestación de los Servicios Públicos en Morelia y Valparaiso, Caquetá | 130.238.050,00 | | | 0% |
| | Mejora en el Uso y destinación de los recursos SGP-APSB | 109.443.997,00 | | | 0% |
| | Calidad de agua | 203.900.045,00 | | | 0% |
| Ambiental | Total Ambiental | 12.609.471.527,95 | 1.505.673.225 | | 12% |
| | Plan Ambiental | 12.609.471.527,95 | 1.505.673.225,00 | | 12% |
| | Adquisición de carro compactador, recolector de residuos sólidos para el casco urbano de San Vicente del Caguán | 975.673.225,00 | 975.673.225,00 | 17994-17995 | 100% |
| | Formulación y/o ajuste de 1 Plan de Ordenación y Manejo de Cuencas (POMCAS) - (Río Pescado) | 5.250.000.000,00 | | | 0% |
| | Formulación y adopción de 2 Planes de Ordenamiento del Recurso Hídrico (PORH) | 1.672.706.700,00 | | | 0% |
| | Reglamentar el uso de las aguas y/o vertimientos de 2 corrientes hídricas | 242.600.000,00 | | | 0% |
| | Ejecución del Plan de Ordenación y Manejo de Cuencas (POMCAS) del río Hacha | 2.000.000.000,00 | | | 0% |
| | Elaboración de estudios ambientales para el trámite de la licencia ambiental del proyecto "Construcción del relleno sanitario y obras complementarias en el municipio de Cartagena del Chaira departamento de Caquetá. | 300.000.000,00 | 300.000.000 | 18057-18058 | 100% |
| | Implementación de la estrategia de esquemas de pagos por servicios ambientales en el municipio de puerto rico en el departamento del Caquetá | 566.390.602,95 | | | 0% |
| | Implementación de un esquema de pago por servicios ambientales en el departamento del Caquetá | 714.321.000,00 | | | 0% |
| | Fortalecimiento de la gestión integral de cambio climático en el departamento del Caquetá | 187.780.000,00 | | | 0% |
| | Fortalecimiento a la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos | 470.000.000,00 | | | 0% |
| | Fortalecimiento del programa de aprovechamiento del PGIRS del Municipio de San José del Fragua | 230.000.000,00 | 230.000.000 | 18038-18039 | 100% |
| | Total Gestión del Riesgo | 2.024.613.510,00 | 980.000.000 | | 48% |
| | Plan Gestión del Riesgo | 2.024.613.510,00 | 980.000.000,00 | | 48% |

| | | | | | |
|------------------------------------|--|--------------------------|-------------------------|-------------------|------|
| Gestión del Riesgo Sectorial | Ejecución de obras de mitigación del riesgo por el desabastecimiento de agua potable, en la bocatoma sobre la quebrada Las Margaritas, línea de aducción y PTAP Los Naranjos del municipio de La Montañita, departamento del Caquetá | 980.000.000,00 | 980.000.000 | 18052-18053-18054 | 100% |
| | Apoyar a los municipios vinculados al PDA Caquetá en la atención de emergencias sectoriales de agua potable y saneamiento básico a los prestadores en caso que se supere la capacidad de respuesta local. | - 400.000.000,00 | | | 0% |
| | Construcción de muro de contención en el área de captación de agua sobre el río Caguán, fuente abastecedora del sistema de acueducto de la cabecera municipio de Cartagena del Chaira, en el Departamento de Caquetá. | 644.613.510,00 | | | 0% |
| Gestión Social | Total Gestión Social | 350.000.000,00 | - | | 0% |
| | Plan de Gestión Social | 350.000.000,00 | - | | 0% |
| TOTAL VALOR COMPROMETIDO | | 50.400.269.873,46 | 8.234.840.596,00 | | - |

Fuentes PEI - Capítulo 2025. Aprobadas en Comité Directivo No. 60

| Fuentes Capítulo 2025 | Orden | Planeación 2025 (\$) |
|---------------------------|---------------------|--------------------------|
| SGP-APSB Departamento | DEPARTAMENTO | 18.583.196.468,76 |
| SGP-APSB Municipios | MUNICIPIOS | 13.885.752.923,15 |
| Otros Recursos Municipios | MUNICIPIOS | 164.972.924,67 |
| PGN (Audiencias Públicas) | NACIÓN | 1.774.600.335,52 |
| Recursos Propios | DEPARTAMENTO | 2.144.062.396,36 |
| Otros Recursos (CAR) | AUTORIDAD AMBIENTAL | 6.482.378.125,00 |
| Total | | 52.200.269.873,46 |



Cierre Financiero, Aprobado en Comité Directivo No. 60 a 31 de diciembre de 2025

| Componente | Subcomponente | Valor Comprometido | Valor Ejecutado Financiero (Expedición de Documento de Compromiso) | Soporte Documento Compromiso (CDR) | Valor Ejecutado (Pagos Realizados) |
|------------------------------|--|--------------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|
| | Total Inversión en Infraestructura | 34.972.602.743,51 | 5.749.167.371 | | 16% |
| | Infraestructura en AAA | 31.007.391.248,91 | 4.373.150.144 | | 14% |
| | Canalización de 300 metros de aguas residuales del Caño San Francisco del municipio de Belén de los Andaquies | 1.840.595.681,50 | | | 0% |
| | Construcción mejoramiento y optimización del sistema de alcantarillado de aguas lluvias del barrio la esmeralda del municipio de Florencia, departamento del Caquetá. | 3.589.142.681,13 | | | 0% |
| | Construcción del alcantarillado sanitario del centro poblado Santiago de la Selva del municipio de Valparaiso, departamento de Caquetá (primer fase) | 1.457.241.000,00 | | | 0% |
| | Optimización de la Planta de tratamiento de agua potable PTAP, en la inspección de Mate guadua del municipio de La Montañita Caquetá | 961.239.000,00 | | | 0% |
| | Construcción de una planta de tratamiento de agua potable (PTAP), para el centro poblado del corregimiento de Río Negro, municipio de Puerto Rico – Caquetá. | 957.000.000,00 | | | 0% |
| | Ampliación planta de tratamiento de agua potable casco urbano (PTAP), construcción de modulo adicional (Floculador, sedimentador, filtros y tanque de almacenamiento) Municipio de San José del Fragua, en el Departamento de Caquetá. | 7.582.378.125,00 | | | 0% |
| | Construcción del Sistema de Alcantarillado en el municipio de Solita departamento del Caquetá | 700.000.000,00 | | | 0% |
| | Optimización de redes de Alcantarillado urbano en el Municipio de Solita, Departamento de Caquetá. | 1.678.795.770,00 | | | 0% |
| Inversión en Infraestructura | Optimización de las redes de distribución de alcantarillado urbano en el municipio de Albania, departamento del Caquetá | 1.878.000.000,00 | 1.878.000.000,00 | 17976-17977-17978 | 100% |
| | Reposición parcial del alcantarillado barrio oasis municipio de Puerto Rico Caquetá | 655.166.678,00 | 655.166.678,00 | 17972-17973-17974-17975 | 100% |
| | Optimización de tramos de alcantarillado en el municipio de Morelia, Departamento de Caquetá. | 1.839.983.466,00 | 1.839.983.466,00 | 17979-17980-17981 | 100% |
| | Optimización de las redes de distribución de alcantarillado urbano en el Municipio de Albania, departamento del Caquetá Fase II | 2.921.108.293,00 | | | 0% |
| | Optimización del sistema de alcantarillado en los barrios el Centro y el Turbay del municipio de Curillo departamento del Caquetá en los tramos carreras 2 y 3 entre calles 12 y 14 y, calles 12 y 14 entre carreras 2 y 3. | 1.257.766.590,00 | | | 0% |
| | Optimización de la captación de agua en la cabecera municipal de San Vicente del Caguán | 679.939.803,33 | | | 0% |
| | Optimización sistema de alcantarillado en barrios del casco urbano del Municipio de San Vicente del Caguán Departamento de Caquetá | 509.034.160,95 | | | 0% |
| | Construcción del sistema de suministro de agua para la inspección de Mononguete del municipio de Solano departamento de Caquetá. | 2.500.000.000,00 | | | 0% |
| | Reformulaciones | 2.271.161.280,60 | 126.017.227 | | 6% |
| | Bolsa Recursos Reformulaciones | 2.145.144.053,60 | | | 0% |
| | Reformulación a la Construcción del Tanque de almacenamiento en el municipio de Albania, Departamento de Caquetá. | 126.017.227,00 | 126.017.227 | CDR 18664 | 100% |
| | Preinversiones | 1.544.050.214,00 | 1.100.000.000,00 | - | 71% |



DEPARTAMENTO DEL
CAQUETÁ



Informe de Seguimiento del PEI

Versión 1.0
17/01/2020

| | | | | | |
|--------------------------------|--|--------------------------|----------------------|-------------------|------------|
| | Actualización y ajuste de la formulación y estructuración de los estudios y diseños para la construcción de una nueva bocatoma y optimización del sistema de acueducto del casco urbano del municipio de Solano, departamento de Caquetá | 600.000.000,00 | 600.000.000 | 17966-17967-17968 | 100% |
| | Estudios y diseños para la construcción de un acueducto para las comunidades de San Francisco, San Rafael, Santa Rosa y Institución educativa Mamabwe del resguardo indígena Agua Negra del municipio de Milán Departamento de Caquetá . | 300.000.000,00 | | | 0% |
| | Realizar estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo, y elaborar los estudios, diseños e ingeniería de detalle para establecer medidas de mitigación frente al riesgo por crecientes súbitas en la estructura de captación del sistema de acueducto de la cabecera municipal de Cartagena del Chaira, Caquetá. | \$ 144.050.214,00 | | | 0% |
| | Actualización y ajuste de la formulación y estructuración de los estudios y diseños del proyecto construcción etapa uno del colector de alcantarillado sanitario sobre la rivera de la quebrada la sardina. municipio de Florencia, departamento de Caquetá. | 500.000.000,00 | 500.000.000 | 17969-17970-17971 | 100% |
| | Mecanismo Departamental | 150.000.000,00 | 150.000.000 | | 100% |
| | Mecanismo Departamental | 150.000.000,00 | 150.000.000 | 18047 | 100% |
| | Total Aseguramiento | 443.582.092,00 | - | | 0% |
| Aseguramiento de la Prestación | Plan de Aseguramiento de la Prestación | 443.582.092,00 | - | - | 0% |
| | Formulación De Ruta Estratégica Para Asegurar La Prestación De Los Servicios Públicos En Morelia Y Valparaíso, Caquetá | 130.238.050,00 | - | | 0% |
| | Mejora en el Uso y destinación de los recursos SGP-APSB | 109.443.997,00 | - | | 0% |
| | Calidad de agua | 203.900.045,00 | - | | 0% |
| | Total Ambiental | 12.609.471.527,95 | 1.505.673.225 | | 12% |
| | Plan Ambiental | 12.609.471.527,95 | 1.505.673.225,00 | | 12% |
| | Adquisición de carro compactador, recolector de residuos sólidos para el casco urbano de San Vicente del Caguán | 975.673.225,00 | 975.673.225,00 | 17994-17995 | 100% |
| | Formulación y/o ajuste de 1 Plan de Ordenación y Manejo de Cuencas (POMCAS) - (Río Pescado) | 5.250.000.000,00 | | | 0% |
| | Formulación y adopción de 2 Planes de Ordenamiento del Recurso Hídrico (PORH) | 1.672.706.700,00 | | | 0% |
| | Reglamentar el uso de las aguas y/o vertimientos de 2 corrientes hídricas | 242.600.000,00 | | | 0% |
| | Ejecución del Plan de Ordenación y Manejo de Cuencas (POMCAS) del río Hacha | 2.000.000.000,00 | | | 0% |
| | Elaboración de estudios ambientales para el trámite de la licencia ambiental del proyecto "Construcción del relleno sanitario y obras complementarias en el municipio de Cartagena del Chaira departamento de Caquetá. | 300.000.000,00 | 300.000.000 | 18057-18058 | 100% |
| | Implementación de la estrategia de esquemas de pagos por servicios ambientales en el municipio de puerto rico en el departamento del Caquetá | 566.390.602,95 | | | 0% |
| | Implementación de un esquema de pago por servicios ambientales en el departamento del Caquetá | 714.321.000,00 | | | 0% |
| | Fortalecimiento de la gestión integral de cambio climático en el departamento del Caquetá | 187.780.000,00 | | | 0% |
| | Fortalecimiento a la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos | 470.000.000,00 | | | 0% |
| | Fortalecimiento del programa de aprovechamiento del PGIRS del Municipio de San José del Fragua | 230.000.000,00 | 230.000.000 | 18038-18039 | 100% |
| | Total Gestión del Riesgo | 2.024.613.510,00 | 980.000.000 | | 48% |
| | Plan Gestión del Riesgo | 2.024.613.510,00 | 980.000.000,00 | | 48% |
| Gestión del Riesgo Sectorial | Ejecución de obras de mitigación del riesgo por el desabastecimiento de agua potable, en la bocatoma sobre la quebrada Las Margaritas, línea de aducción y PTAP Los Naranjos del municipio de La Montañita, departamento del Caquetá | 980.000.000,00 | 980.000.000 | 18052-18053-18054 | 100% |
| | (Apoyar a los municipios vinculados al PDA Caquetá en la atención de emergencias sectoriales de agua potable y saneamiento básico a los prestadores en caso que se supere la capacidad de respuesta local). Construcción de viaducto para tubería de conducción del sistema de acueducto para el casco urbano del Municipio de Valparaíso | 249.544.490,00 | | | 0% |



DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ



Informe de Seguimiento del PEI

Versión 1.0
17/01/2020

| | | | | | |
|---------------------------------|--|--------------------------|-------------------------|--|---------------|
| | (Apoyar a los municipios vinculados al PDA Caquetá en la atención de emergencias sectoriales de agua potable y saneamiento básico a los prestadores en caso que se supere la capacidad de respuesta local). Recuperación y mitigación del riesgo para garantizar la prestación de servicios de acueducto, mediante la optimización de la captación de agua en los centros poblados de Guayabal y Puerto Betania del municipio de San Vicente del Caguán, departamento del Caquetá. | 187.232.311,00 | | | 0% |
| | Construcción de muro de contención en el área de captación de agua sobre el río Caguán, fuente abastecedora del sistema de acueducto de la cabecera municipio de Cartagena del Chaira, en el Departamento de Caquetá. | 607.836.709,00 | | | 0% |
| Gestión Social | Total Gestión Social | 350.000.000,00 | 350.000.000 | | 100% |
| | Plan de Gestión Social | 350.000.000,00 | 350.000.000 | | 100% |
| TOTAL VALOR COMPROMETIDO | | 50.400.269.873,46 | 8.584.840.596,00 | | 17,03% |

| Costos Gestor | Valor | Fuente | Soportes | CDR | Valor Ejecutado Financiero (Expedición de Documento de Compromiso) | Valor Ejecutado (Pagos Realizados) |
|--|------------------|----------|---|-----------|--|------------------------------------|
| <p>COSTOS GESTOR</p> <p>Los Costos del Gestor del PEI Capítulo 2025 se asignan conforme a la Aprobación del Gobernador o Gobernadora del Departamento de Caquetá, de acuerdo con lo establecido en el ARTÍCULO 2.3.3.1.5.3. Plan Estratégico de Inversiones (PEI) del Decreto 1077 de 2015.</p> <p>Es pertinente manifestar que de acuerdo a lo establecido en dicho artículo, en caso de que el porcentaje de los Costos Gestor supere el 5%, la certificación de aprobación de los Costos Gestor para la vigencia suscrita por el Gobernador, deberá contener una justificación motivada que contenga el detalle de las acciones que generan un mayor costo, el cual debe estar relacionado con las funciones del Gestor, metas y cronograma establecidos para la respectiva vigencia así como las particularidades presentes en cada territorio.</p> | 1.800.000.000,00 | SGP DPTO | <p>Certificación Aprobación de Costos Gestor Capítulo 2025 Suscrita por el Gobernador del Departamento de Caquetá</p> <p>Fecha 07/01/2025</p> <p>Certificación Cumplimiento de Costos Gestor Capítulo 2024 Suscrita por el Gobernador del Departamento de Caquetá Supervisor del Gestor del PDA</p> <p>Fecha 07/01/2025</p> | CDR 18037 | \$ 1.800.000.000,00 | 670.620.000 |

LOGROS Y RESULTADOS DEL PLAN DEPARTAMENTAL PARA EL MANEJO EMPRESARIAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO PDA.

Con la entrada en vigencia del Decreto 1425 de 2019, el Gestor, como responsable de la gestión, implementación y seguimiento del PDA y los asuntos relacionados con Agua Potable y Saneamiento Básico en el Departamento de Caquetá, ha venido adelantando en el marco del Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento, las acciones y estrategias tendientes para alcanzar los logros de las metas que se enmarcaran en el Plan Departamental de Agua de cada uno de los componentes que estructuran el PEI capítulo 2025.

Modificación y aprobación del Instrumento de Planeación Plan Estratégico de Inversiones PEI 2024 – 2027 del capítulo 2025.

Los logros y resultados alcanzados en el marco del Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento PDA, durante el avance del período de enero – junio de 2025, se encuentran descritos en los siguientes aspectos:

A. Aprobación Capítulo 2025: Sesión de Comité Directivo No. 57, realizado el 5 de febrero de 2025.

- Se aprueba la totalidad de las fuentes para la vigencia por \$44.154.861.764,87.
- Se asignan Costos del Gestor para el 2025 por valor de \$1.800.000.000, oo.

| | | |
|---|----------------------------------|---------------------------|
|  | Acta de Comité Directivo del PDA | Versión 1.0 10/12/2021 |
|---|----------------------------------|---------------------------|

SESIÓN VIRTUAL COMITÉ DIRECTIVO No. 57 PDA CAQUETÁ

Fecha de inicio: 04 de febrero de 2025
Fecha de terminación: 04 de febrero de 2025
Sesión: Modalidad Virtual

MIEMBROS DEL COMITÉ DIRECTIVO

| Entidad | Representante |
|--|--|
| Gobernación de Caquetá Presidente del Comité | Leidy Julieta López González Secretaría Delegada con Funciones Administrativas de Gobernador del Departamento de Caquetá y en calidad de Presidente del Comité Directivo del Plan Departamental de Agua PDA Caquetá, Decreto No. 0000100 del 03/02/2025 |
| Delegado Gobernación de Caquetá | Diego Felipe Pino Díaz Secretario de Planeación |
| Subdirector de Programas del Viceministerio de Agua y Saneamiento, 10/01/2021 Subdirectora de Agua y Saneamiento, Departamento Nacional de Planeación | Julio Cuesta Clave |
| Municipio de Florencia, Acta de delegación Asociación de Municipios del Caquetá AMDELCA | Natalia Valentina Gercón Yepes |
| Municipio de Moravia Acta de delegación Asociación de Municipios del Caquetá AMDELCA | Marion Monsalve Ascario |
| Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonía - Corporación | Carlos Fernando Tinajo Duque Alcalde |
| Consortio FSA | Lorenzo Andrés Vargas Sulemez Carlos Andrés Amaya Ordoña - Director PDA |

SECRETARÍA TÉCNICA DEL COMITÉ DIRECTIVO

Gestor: Ingeriero Herley Suárez Cuelar

DESARROLLO

1. Convocatoria

El Gestor del Plan Departamental de Agua PDA del departamento de Caquetá, mediante correo electrónico del día 30 de enero de 2025 con oficio radicado No. 0332, convocó a sesión de Comité Directivo No. 57 del PDA Caquetá, modalidad (Virtual), a todos los miembros del Comité Directivo.

2. Verificación del quórum

Calle 13 Calle 16 Equino - Teléfono: (05) 430540
www.caquetá.gov.co - Infraestructura@caquetá.gov.co
Florencia - Caquetá - Colombia
Página 1 de 10



| | | |
|---|----------------------------------|---|
|  | DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ |  |
|  | Acta de Comité Directivo del PDA | Versión 1.0 10/12/2021 |


Los documentos aprobados anexados a la convocatoria, al Decreto No. 0000100 del 03/02/2025 de la Gobernación del Caquetá y los votos allegados en la sesión de Comité Directivo No. 57 hacen parte integral de la presente Acta.

NOTA: De acuerdo al correo enviado por parte de la Secretaría Técnica del Comité Directivo del PDA la sesión de Comité Directivo Modalidad Virtual No. 57 del PDA Caquetá, fue prorrogada hasta el día miércoles 05 de febrero de 2025.

La presente acta se firma en la ciudad de Florencia Departamento de Caquetá, a los cinco (05) días del mes de febrero de 2025.

Afirmante:





LEIDY JULIETA LÓPEZ GONZÁLEZ
Secretaría Delegada con Funciones Administrativas de Gobernador del Departamento de Caquetá, Decreto No. 0000100 del 03/02/2025


HERLEY SUÁREZ CUELLAR
Secretario de Infraestructura - Gestor PDA
Secretaría Técnica Comité Directivo
Plan Departamental de Agua de Caquetá

Revisó: Yudy Nerley García Rojas/Contratista Coordinadora - Unidad Gestora PDA Caquetá
Proyecto: Blanca Flor Canavaj Becerra Revisó
Contratista Componente Administrativo - Unidad Gestora PDA Caquetá
Revisó: Yenny Carolina Camacho Martínez R.
Contratista Componente de Financiero - Planeación - Unidad Gestora PDA Caquetá

Primera Hoja del Acta

Hoja de Firmas

| | | |
|---|---------------------------------------|--|
|  | DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ |  |
|  | Informe de Seguimiento del PEI | Versión 1.0 17/01/2020 |

B. Primera modificación: Sesión de **Comité Directivo No. 58**, realizado el 21 de marzo de 2025.

- Se adiciona por carta de voluntad, la suma de \$6.482.378.125,00, que son Regalías del Departamento y, \$1.563.030.087,67, del SGP APSB.
- Se incorporan a las metas: 3 proyectos del Municipio de San Vicente del Caguán:
 - Estudios y Diseños para la Construcción de alcantarillado del centro poblado de Guacamayas del municipio de San Vicente del Caguán Caquetá.
 - Estudios y Diseños para la Construcción de alcantarillado del centro poblado de Villa Lobos zona rural del municipio de San Vicente del Caguán, Caquetá.
 - Manejo de aguas lluvias en la zona centro del municipio de San Vicente del Caguán departamento de Caquetá.

- Se adicionan el Cierre Financiero los siguientes proyectos:

| PROYECTO | VALOR (Pesos) |
|--|------------------|
| Canalización de aguas lluvias en la Calle 4 entre carreras 2 a la cra 6, del casco urbano de la Inspección de San Antonio de Getuchá, en el municipio de Milán, Departamento del Caquetá | 1.057.248.000,00 |
| Construcción del alcantarillado sanitario del centro poblado Santiago de la Selva del municipio de Valparaíso, departamento de Caquetá (primera fase) | 2.363.119.735,61 |
| Optimización de la Planta de tratamiento de agua potable PTAP, en la inspección de Mateguadua del municipio de La Montañita Caquetá | 2.817.638.592,14 |
| Optimización de la planta de tratamiento de agua potable mediante la adecuación de la Planta de bombeo y Filtros de la PTAP del Municipio de San Vicente del Caguán | 600.000.000,00 |
| Optimización sistema de alcantarillado en barrios del casco urbano del Municipio de San Vicente del Caguán Departamento de Caquetá | 317.621.653,53 |
| Optimización del sistema de suministro de agua para la inspección de Mononguete del municipio de Solano departamento de Caquetá. | 2.900.000.000,00 |

- Se retiran del Cierre Financiero los siguientes proyectos:

| PROYECTO | VALOR |
|---|------------------|
| Construcción etapa uno del colector de alcantarillado sanitario sobre la rivera de la quebrada la sardina municipio de Florencia, departamento de Caquetá | 3.758.547.885,00 |
| Construcción del Acueducto y Alcantarillado del centro poblado Versailles en el municipio de El Paujil | 2.318.760.570,00 |
| Construcción del Acueducto del centro poblado Bolivia del municipio El Paujil. | 1.600.000.000,00 |
| Optimización sistema de acueducto en sus componentes de captación, desarenador, conducción, PTAP, tanque de almacenamiento y red de distribución para el municipio de El Paujil - Caquetá | 1.603.853.990,31 |
| Construcción de muro y captación alterna de agua sobre la quebrada la conga, fuente abastecedora del sistema de acueducto de la cabecera municipal de puerto rico Caquetá | 620.425.000,00 |
| Construcción de una nueva bocatoma y optimización del sistema de acueducto del casco urbano del municipio de Solano, departamento de Caquetá. | 1.858.885.691,00 |

- y, se aprueba la contratación de las obras para:
 - **San José del Fragua**, “fortalecimiento del programa de aprovechamiento del PGIRS del Municipio de San José del Fragua”, por Valor de: \$230.000.000”.
 - **Morelia**, “Optimización de Tramos de Alcantarillado en el Municipio de Morelia, departamento del Caquetá”, cuyo valor del proyecto es de \$1.839.983.466,00.

- Puerto Rico, Reposición parcial del alcantarillado barrio Oasis del municipio de Puerto Rico departamento de Caquetá”, cuyo valor del proyecto es de \$655.166.678.
- Empresa de servicios Públicos del municipio de Curillo, Construcción de Alcantarillado Sanitario entre las calles 9° a la 11° y entre la carrera 2ª a la 4ª del Municipio de Curillo - Caquetá” \$667.603.489.
- Albania, “Optimización de la red de distribución de alcantarillado urbano en el municipio de Albania del Departamento de Caquetá” \$1.878.000.000,00.

| | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|
| | Acta de Comité Directivo del PDA | Versión 1.0 16/12/2021 |
|--|----------------------------------|---------------------------|

SESIÓN VIRTUAL COMITÉ DIRECTIVO No. 58 PDA CAQUETA

Fecha de inicio: 17 de marzo de 2025
Fecha de terminación: 21 de marzo de 2025
Medio: Virtual

MEMBROS DEL COMITÉ DIRECTIVO

| Entidad | Representante |
|--|--|
| Gobernación de Caquetá Presidente del Comité | Ledy Jureta Lopez Gonzalez Secretaría Delegada con Funciones Administrativas de Gobernación del Departamento de Caquetá Decreto 000296 del 15 de marzo de 2025 y en calidad de Presidente del Comité Directivo del Plan Departamental de Agua PDA Caquetá |
| Delegado Gobernación de Caquetá | Diego Fariza Pardo Diaz Secretario de Planeación |
| Subdirector de Programas del Viceministerio de Agua y Saneamiento MUCT Coordinador de Agua y Saneamiento Departamento Nacional de Planeación | Jairo Cuarta Chavez Natalia Ivonne Garcia Reyes |
| Municipio de Florencia Acta de delegación Asociación de Municipios del Caquetá AMDECA | Esteban Cano Ramirez Secretaría para la Gestión de Infraestructura y Movilidad Consignación de Funciones de Alcalde Según Decreto No. 1970-20-0715 |
| Municipio de Moravia Acta de delegación Asociación de Municipios del Caquetá AMDECA | César Fernando Trujillo Garzón Alcalde |
| Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de los Andes Corporación Comité PDA | Lorena Andrea Vargas Gomez Fabrice Marwanza Gomez - Director PDA |

SECRETARIA TECNICA DEL COMITÉ DIRECTIVO

Director: Ingeniero Néstor Suarez Chacón

DESARROLLO

1. Convocatoria

El 14 de marzo de 2025 con oficio radicado No. 0674, la Secretaría Técnica convocó a sesión de Comité Directivo mediante virtual No. 58 con PDA Caquetá a todos los miembros del Comité Directivo.
Cable: 15 Calle 16 Sur - Teléfono: 6061 0000
www.caquetadepda.gov.co
PDA

| | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|
| | DEPARTAMENTO DE CAQUETA | |
| | Acta de Comité Directivo del PDA | Versión 1.0 16/12/2021 |

NOTA: Este documento constituye un instrumento administrativo en el Decreto 1723 del 2016, el Departamento Nacional de Planeación. Este no tiene carácter de ley para efectos de la modificación de los instrumentos de inversión, de carácter administrativo, de inversión, o de ejecución de los recursos de los entes territoriales. Su aplicación a que hace referencia el artículo 260 de la Constitución y a los Planes Departamentales de Agua de los municipios de Caquetá, que conforman a su integridad, en el desarrollo de las actividades de inversión.

Los documentos adjuntos y los anexos allegados en la sesión de Comité Directivo No. 58 hacen parte integral de la presente Acta.

NOTA: De acuerdo al correo enviado por parte de la Secretaría Técnica del Comité Directivo del PDA, la sesión de Comité Directivo Virtual No. 58 del PDA Caquetá fue convocada hasta el día viernes 21 de marzo de 2025.

La presente acta se firmó en la ciudad de Florencia Departamento de Caquetá, a los veintidós (22) días del mes de marzo de 2025.

Atentamente:

LEDY JURETA LOPEZ GONZALEZ
Secretaría Delegada con Funciones Administrativas de Gobernación del Departamento de Caquetá
Decreto No. 000296 del 15 de marzo de 2025

FABRICE MARWANZA GOMEZ
Secretaría Técnica Comité Directivo
Plan Departamental de Agua de Caquetá

Revisó: Yudy Nancy Garcia Naranjo/Coordinadora Comités Comité Sección PDA Caquetá
Procesó: Néstor Suarez Chacón
Su nombre Documento No. 0674 del 14 de marzo de 2025
Revisó: Néstor Suarez Chacón/Secretario Técnico
Comité Directivo del PDA Caquetá

Primera Hoja del Acta

Hoja de Firmas

C. segunda modificación: Sesión de Comité Directivo No. 59, realizado el 21 de octubre de 2025.

- Presentación modificación PAMs de municipios de Solita, Milán y Cartagena del Chairá.
- Se asignan de recursos a proyectos de Preinversión de los municipios de: Milán “Estudios y diseños para la construcción de un acueducto para las comunidades de San Francisco, San Rafael, Santa Rosa e Institución educativa Mamabwe del resguardo indígena Agua Negra del municipio de Milán Departamento de Caquetá”; y Cartagena del Chairá Realizar estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo, y elaborar los estudios, diseños e ingeniería de detalle para establecer medidas de mitigación frente al riesgo por crecientes súbitas en la estructura de captación del sistema de acueducto de la cabecera municipal de Cartagena del Chairá, Caquetá”.
- Aprobación de delegación contratación al municipio de Solano para que contrate el proyecto de preinversión: “Actualización y ajuste de la formulación y estructuración de los estudios y diseños para la construcción de una nueva bocatoma y optimización del sistema de acueducto del casco urbano del municipio de Solano, departamento de Caquetá”.

- Aprobación y asignación de recursos financieros al Plan de Aseguramiento del departamento de Cauquetá PAP-PDA-2025, por valor de \$443.582.092

| | | |
|---------|----------------------------------|------------------------|
| CAQUETÁ | DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ | CAQUETÁ |
| CAQUETÁ | Acta de Comité Directivo del PDA | Versión 1.0 10/12/2021 |

SESIÓN VIRTUAL COMITÉ DIRECTIVO No. 59 PDA CAQUETÁ

Fecha de inicio: 15 de octubre de 2025
Fecha de terminación: 21 de octubre de 2025
Sesión: Modalidad Virtual

MIEMBROS DEL COMITÉ DIRECTIVO

| Entidad | Representante |
|--|--|
| Gobernación de Cauquetá Presidente del Comité | Luis Francisco Ruiz Aguilar En calidad de Presidente del Comité Directivo del Plan Departamental de Agua PDA-2025 |
| Delegado Gobernación de Cauquetá | Sara Iván Osorio Trujillo - Secretario de Planeación Escogido Decreto No. 001265 del 27 de octubre de 2025 |
| Subdirector de Programas del Invalmunicipios de Agua y Saneamiento MVCT | Juli Cuervo Ciro |
| Subdirector de Agua y Saneamiento, Departamento Nacional de Planeación | Natalia Tallema Quintero Yañez |
| Municipio de Florencia, Acta de Delegados Asociación de Municipios del Cauquetá AMCECA | José Darío Vargas Gutiérrez Secretario de Planeación y Desarrollo de la Gobernación, representante e institución con Acuerdos de Alcaldes Municipio de Florencia, según Decreto No. 00580 del 20 de octubre de 2025 |
| Municipio de Marieta, Acta de Delegados Asociación de Municipios del Cauquetá AMCECA | Carla Fernanda Trujillo Dubay Alcalde |
| Cooperación para el Desarrollo Subordinación del Sur de la Asociación Cooperativista | Nancy Javier Saiz Durán |
| Consejo PDA | Fabrizio Marcano Gomez - Director PDA |

SECRETARÍA TÉCNICA DEL COMITÉ DIRECTIVO

| | |
|------------|--------------------------------|
| Secretaría | Nidia Carolina Tamayo Buitrago |
|------------|--------------------------------|

DESARROLLO

1. Convocatoria

El 15 de octubre de 2025 con oficio radicado No. 1387, la secretaria técnica convocó e asistió a Comité Directivo modalidad virtual No. 59 del PDA Cauquetá, a todos los miembros del Comité Directivo.

2. Verificación del quórum

Se verifica el quórum con la participación de:

Comité 13 de Octubre de 2025 - Teléfono: 320-010000
www.caquetadepn.gov.co - info@caquetadepn.gov.co
PDA - Plan Departamental de Agua y Saneamiento - Cauquetá
Página 1 de 16



| | | |
|---------|----------------------------------|------------------------|
| CAQUETÁ | DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ | CAQUETÁ |
| CAQUETÁ | Acta de Comité Directivo del PDA | Versión 1.0 10/12/2021 |

Parágrafo: Las modificaciones de los instrumentos de planeación no requieren aprobación del Departamento Nacional de Planeación (DNP).

En todo caso para efectos de la modificación de la capacidad presupuestal y de recursos, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) participará en el primer Comité Directivo de cada año, en el que se presente el presente en la sesión de los instrumentos de planeación.

Según lo citado, conforme a la legislación en el Decreto 1425 de 2010, el DNP no tiene competencia para emitir voto sobre la modificación de los instrumentos de planeación de carácter de delegación de competencias.

En relación con el punto 2, "Solicitud aprobación a asignación de recursos financieros al Plan de Aseguramiento del departamento de Cauquetá PAP-PDA-2025 L.1" se aprueba el Plan de Aseguramiento de la Prestación del departamento de Cauquetá PAP-PDA-2025 por valor de \$443.582.092. Fuente SGP APSB departamental, con base en el concepto de aprobación expedido por el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio con radicado 20250305022 del 08 de agosto de 2025.

Los documentos aprobados y sus votos allegados en la sesión a Comité Directivo No. 59 hacen parte integral de la presente Acta.

La presente acta se firmó en la ciudad de Florencia Departamento de Cauquetá, a los veintidós (22) días del mes de octubre de 2025.

Alineamiento

LUIS FRANCISCO RUIZ AGUILAR
Secretario del Departamento de Cauquetá

NIDIA CAROLINA TAMAYO BUITRAGO
Secretaría de Planeación - Dirección PDA
Secretaría Técnica Comité Directivo
Plan Departamental de Agua de Cauquetá

Revisó: Nidia Carolina Tamayo Buitrago - Coordinadora Ejecutiva Unidad Gestión PDA Cauquetá
Revisó: Blanca Flor Canales Becerra - Coordinadora Ejecutiva Unidad Gestión PDA Cauquetá
Revisó: Nancy Carolina Cárdenas - Unidad Gestión PDA Cauquetá

C. Tercera modificación: Sesión de Comité Directivo No. 60, realizada el 18 de diciembre de 2025.

- Presentación Informe de Cierre Parcial Capítulo 2025 del PEI 2024-2027. (Corte 31 octubre 2025).
- Aprobación de la modificación del cierre financiero 2025, metas 2025 y cronograma 2025 del PEI capítulo 2025 por inclusión y exclusión de proyectos.

Proyectos Incluidos

| PROYECTO | SGP APSB MUCIPIO | SGP APSB DPTO | VALOR |
|---|------------------|---------------|---------------|
| Optimización de las redes de distribución de alcantarillado urbano en el Municipio de Albania, departamento del Cauquetá Fase II | 300.000.000 | 2.621.108.293 | 2.921.108.293 |
| optimización del sistema de alcantarillado en los barrios el Centro y el Turbay del municipio de Curillo departamento del Cauquetá en los tramos carreras 2 y 3 entre calles 12 y 14 y, calles 12 y 14 entre carreras 2 y 3. | 354.000.000 | 903.766.590 | 1.257.766.590 |
| Construcción de viaducto para tubería de conducción del sistema de acueducto para el casco urbano del Municipio de Valparaiso | | 249.544.490 | 249.544.490 |
| Recuperación y mitigación del riesgo para garantizar la prestación de servicios de acueducto, mediante la optimización de la captación de agua en los centros poblados de Guayabal y Puerto Betania del municipio de San Vicente del Caguán, departamento del Cauquetá. | | 187.232.311 | 187.232.311 |



DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ






Informe de Seguimiento del PEI

Versión 1.0
17/01/2020

| | | | |
|-------|-------------|---------------|---------------|
| TOTAL | 654.000.000 | 3.961.651.684 | 4.615.651.684 |
|-------|-------------|---------------|---------------|

[Faint, illegible text from the reverse side of the page, appearing as bleed-through.]

GR

| | | |
|---|---------------------------------------|--|
|  | DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ |  |
|  | Informe de Seguimiento del PEI | Versión 1.0 17/01/2020 |

Proyectos excluidos

| PROYECTO | VALOR | SGP MUNICIPIO | SGP DEPARTAMENTO |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Formulación y estructuración de los estudios y diseños para la construcción del acueducto y alcantarillado del centro poblado Versalles del municipio de el Paujil – Cauquetá | \$120.000.000,00 | \$67.793.659,33 | \$ 52.206.340,67 |
| Formulación y estructuración de los estudios y diseños para la construcción del acueducto del centro poblado Bolivia del municipio de el Paujil – Cauquetá | \$100.000.000,00 | \$47.793.659,33 | \$ 52.206.340,67 |
| Formulación y estructuración de los estudios y diseños para la optimización sistema de acueducto en sus componentes de captación, desarenador, conducción, PTAP, tanque de almacenamiento y red de distribución del municipio de El Paujil - Cauquetá | \$273.232.694,00 | \$ 221.026.353,33 | \$ 52.206.340,67 |
| TOTAL | \$493.232.694,00 | \$336.613.671,99 | \$156.619.022,01 |

Solicitud aprobación e incorporación en el Componente Gestión del Riesgo Sectorial de 2 proyectos de emergencia de los municipios de Valparaíso y San Vicente del Caguán

- Construcción de viaducto para tubería de conducción del sistema de acueducto para el casco urbano del Municipio de Valparaíso, por valor de \$249.544.490 SGP APSB Departamento, toda vez que el alcalde presentó la necesidad, y la Gestora certificó la Inclusión en el PEI Capítulo 2025.
- Recuperación y mitigación del riesgo para garantizar la prestación de servicios de acueducto, mediante la optimización de la captación de agua en los centros poblados de Guayabal y Puerto Betania del municipio de San Vicente del Caguán, departamento del Cauquetá, por valor de \$187.232.311, toda vez que el alcalde presentó la necesidad, y la Gestora certificó la Inclusión en el PEI Capítulo 2025.
- **Presentación, Aprobación y Asignación recursos Gestor (enero a julio de 2026), por valor de \$734.000.000 Fuente SGP APSB Departamento.**

Estado Actualizado Instrumentos de Planeación PDA.

| INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN | Aprobado | FECHA | ACTA No. | OBSERVACIONES |
|---|----------|------------|----------|--|
| Plan Estratégico de Inversiones Capítulo 2025 (PEI) 2024 - 2027 | SI | 03/02/2025 | 52 | Se encuentra aprobado mediante Comité Directivo No. 57 del día 3 de febrero de 2025. |
| Manual Operativo del PDA. | SI | 23/11/2020 | 40 | Fue aprobado mediante Comité Directivo No. 40 el día 23 de noviembre de 2020 adoptado por Decreto N° 000747 del 01 de diciembre del 2020 |
| Plan de Aseguramiento PACA | SI | 22/10/2024 | 49 | Se aprueba adición al Plan de Aseguramiento para la Calidad del Agua PACA, en Comité Directivo No. 49 del 22 de agosto de 2024. |
| Plan de Gestión Social 2024 – 2027 | SI | 16/08/2024 | 55 | Aprobado en Comité Directivo No. 55 del 16 de agosto de 2024. |
| Plan Ambiental 2024-2027 | SI | 13/12/2024 | 56 | Aprobado en Comité Directivo No. 56 del 13 de diciembre de 2024. |
| El Plan de Gestión del Riesgo Sectorial (Emergencias) | SI | 13/12/2024 | 56 | Aprobado en Comité Directivo No. 56 del 13 de diciembre de 2024. |

2. Informe Financiero noviembre - diciembre de 2025.

2.2. Aportes del bimestre noviembre - diciembre de 2025.

En el Seguimiento a los recursos enmarcados en el plan departamental de agua, con respecto a los Aportes de los entes vinculados al Plan Departamental de Agua para el periodo noviembre - diciembre de 2025, es el siguiente:

| DEPARTAMENTO / MUNICIPIO | SEPTIEMBRE 2025 | OCTUBRE 2025 | VALOR TOTAL 2025 |
|--------------------------|------------------|----------------|------------------|
| DEPARTAMENTO | 1.373.927.550,00 | | 7.230.180.463,00 |
| NACION | | | 0 |
| NACION | | | 0 |
| ALBANIA | 272.000.000,00 | | 485.073.472,00 |
| BELEN DE LOS ANDAQUIES | | | 0 |
| CARTAGENA DEL CHAIRA | | 295.411.830,00 | 367.510.190,00 |
| CURILLO | | | 84.000.000,00 |
| EL DONCELLO | | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 |
| EL PAUJIL | | | 45.000.000,00 |
| FLORENCIA | | | 200.000.000,00 |
| LA MONTAÑITA | | | 413.856.137,35 |
| MILAN | | | 100.000.000,00 |
| MORELIA SGP | | | 250.000.000,00 |
| MORELIA | | | 0 |
| PUERTO RICO | | | 0 |
| SAN JOSE DEL FRAGUA | | | 351.000.000,00 |
| SAN VICENTE DEL CAGUAN | | 58.000.000,00 | 680.000.000,00 |
| SOLANO | | | 43.015.192,00 |
| SOLITA | 111.000.000,00 | | 111.000.000,00 |
| VALPARAISO | | | 311.000.000,00 |

(Componente Financiero PEI, 2025 – PDA Caquetá)

2.2. Informe de Rendimientos Financieros a noviembre - diciembre de 2025.

El Patrimonio Autónomo FIA, encargado de gestionar, administrar y reportar la asignación de rendimientos Financieros a cada Fideicomitente, Directo o Indirecto, de conformidad con las políticas establecidas para tal fin, reporta informes para el bimestre de **noviembre - diciembre** del 2025.

GR

| DPTO/MUNICIPIO | NOVIEMBRE 2025 | DICIEMBRE 2025 | VALOR TOTAL 2025 |
|------------------------|----------------|----------------|------------------|
| DEPARTAMENTO | 78.369.165,60 | | 1.510.189.412,85 |
| NACION | 9.441.607,94 | | 239.766.941,08 |
| NACION | 6.094.615,52 | | 122.416.111,31 |
| ALBANIA | 4.465.220,65 | | 86.046.687,00 |
| BELEN DE LOS ANDAQUIES | 2.569.112,25 | | 51.622.792,52 |
| CARTAGENA DEL CHAIRA | 6.492.445,94 | | 129.842.545,14 |
| CURILLO | 2.992.214,96 | | 55.507.829,17 |
| EL DONCELLO | 2.098.259,30 | | 42.147.075,86 |
| EL PAUJIL | 543.234,73 | | 9.657.904,39 |
| FLORENCIA | 13.779.964,89 | | 274.388.902,92 |
| LA MONTAÑITA | 2.462.182,70 | | 49.477.974,73 |
| MILAN | 2.590.964,61 | | 46.059.564,73 |
| MORELIA SGP | 3.659.607,93 | | 68.695.559,03 |
| MORELIA | 589.529,27 | | 11.841.066,64 |
| PUERTO RICO | 3.737.344,79 | | 75.076.601,38 |
| SAN JOSE DEL FRAGUA | 2.947.722,40 | | 45.985.790,62 |
| SAN VICENTE DEL CAGUAN | 1.593.017,97 | | 41.571.709,16 |
| SOLANO | 11.953.613,41 | | 260.596.537,13 |
| SOLITA | 3.441.655,74 | | 66.449.411,50 |
| VALPARAISO | 4.672.357,95 | | 77.777.327,08 |

(Componente Financiero PEI, 2025 – PDA Caquetá)




2.3. CDRs Emitidos durante el Capítulo 2025

| DESCRIPCION EMPRESA | NUMERO DE CDR | TIPO DE GASTO | VALOR FINAL CDR | DESCRIPCION DEL CDR |
|---------------------|---------------|---------------|-----------------|---|
| CAQUETA | 17966 | PRE-INVERSION | 300.000.000,00 | ACTUALIZACIÓN Y AJUSTE DE LA FORMULACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA BOCATOMA Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SOLANO, DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ. |
| SOLANO-CAQUETA | 17967 | PRE-INVERSION | 255.555.556,00 | ACTUALIZACIÓN Y AJUSTE DE LA FORMULACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA BOCATOMA Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SOLANO, DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ. |
| SOLANO-CAQUETA | 17968 | INTERVENTORIA | 44.444.444,00 | INTERVENTORÍA A LA ACTUALIZACIÓN Y AJUSTE DE LA FORMULACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA BOCATOMA Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SOLANO, DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ. |
| CAQUETA | 17969 | PRE-INVERSION | 165.000.000,00 | ACTUALIZACIÓN Y AJUSTE DE LA FORMULACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN ETAPA UNO DEL COLECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO SOBRE LA RIVERA DE LA QUEBRADA LA SARDINA, MUNICIPIO DE FLORENCIA, DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ. |
| FLORENCIA - CAQUETA | 17970 | PRE-INVERSION | 300.000.000,00 | ACTUALIZACIÓN Y AJUSTE DE LA FORMULACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN ETAPA UNO DEL COLECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO SOBRE LA RIVERA DE LA QUEBRADA LA SARDINA, MUNICIPIO DE FLORENCIA, DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ. |
| CAQUETA | 17971 | INTERVENTORIA | 35.000.000,00 | INTERVENTORÍA A LA ACTUALIZACIÓN Y AJUSTE DE LA FORMULACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN ETAPA UNO DEL COLECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO SOBRE LA RIVERA DE LA QUEBRADA LA SARDINA, MUNICIPIO DE FLORENCIA, DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ. |

| | | | | |
|------------------------|-------|----------------------|------------------|---|
| CAQUETA | 17972 | INVERSION | 550.869.752,26 | REPOSICIÓN PARCIAL DEL ALCANTARILLADO BARRIO OASIS DEL MUNICIPIO DE PUERTO RICO -CAQUETÁ |
| PUERTO RICO - CAQUETA | 17973 | INVERSION | 50.649.423,74 | REPOSICIÓN PARCIAL DEL ALCANTARILLADO BARRIO OASIS DEL MUNICIPIO DE PUERTO RICO -CAQUETÁ |
| CAQUETA | 17974 | INTERVENTORIA | 49.130.247,74 | INTERVENTORÍA A LA REPOSICIÓN PARCIAL DEL ALCANTARILLADO BARRIO OASIS DEL MUNICIPIO DE PUERTO RICO -CAQUETÁ |
| PUERTO RICO - CAQUETA | 17975 | INTERVENTORIA | 4.517.254,26 | INTERVENTORÍA A LA REPOSICIÓN PARCIAL DEL ALCANTARILLADO BARRIO OASIS DEL MUNICIPIO DE PUERTO RICO -CAQUETÁ |
| CAQUETA | 17976 | INVERSION | 1.516.315.956,78 | OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ALCANTARILLADO URBANO EN EL MUNICIPIO DE ALBANIA DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ |
| ALBANIA | 17977 | INVERSION | 272.255.472,22 | OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ALCANTARILLADO URBANO EN EL MUNICIPIO DE ALBANIA DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ |
| CAQUETA | 17978 | INTERVENTORIA | 89.428.571,00 | INTERVENTORÍA A LA OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ALCANTARILLADO URBANO EN EL MUNICIPIO DE ALBANIA DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ |
| CAQUETA | 17979 | INVERSION | 1.679.610.716,00 | OPTIMIZACIÓN TRAMOS DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE MORELIA DEPARTAMENTO DEL CAQUETA |
| MORELIA | 17980 | INVERSION | 40.000.000,00 | OPTIMIZACIÓN TRAMOS DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE MORELIA DEPARTAMENTO DEL CAQUETA |
| CAQUETA | 17981 | INTERVENTORIA | 120.372.750,00 | INTERVENTORÍA A LA OPTIMIZACIÓN TRAMOS DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE MORELIA DEPARTAMENTO DEL CAQUETA |
| CAQUETA | 17994 | INVERSION | 800.000.000,00 | ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO COMPACTADOR RECOLECTOR DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN DEPARTAMENTO DE CAQUETA |
| SAN VICENTE DEL CAGUAN | 17995 | INVERSION | 175.673.225,00 | ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO COMPACTADOR RECOLECTOR DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN DEPARTAMENTO DE CAQUETA |
| CAQUETA | 18037 | ESTRUCTURA OPERATIVA | 1.800.000.000,00 | COSTOS DEL GESTOR CAPÍTULO 2025 |
| CAQUETA | 18038 | OTROS | 200.000.000,00 | FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE APROVECHAMIENTO DEL PGIRS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA |
| SAN JOSE DE LA FRAGUA | 18039 | OTROS | 30.000.000,00 | FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE APROVECHAMIENTO DEL PGIRS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA |
| CAQUETA | 18047 | PRE-INVERSION | 150.000.000,00 | IMPLEMENTACIÓN DEL MECANISMO DEPARTAMENTAL DE VIABILIZACIÓN DE PROYECTOS |
| CAQUETA | 18052 | INVERSION | 427.909.407,00 | DESARROLLO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DEL RIESGO POR EL DESABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA BOCATOMA SOBRE LA QUEBRADA LAS MARGARITAS LÍNEA DE ADUCCIÓN Y PTAP LOS NARANJOS DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ |
| LA MONTAÑITA | 18053 | INVERSION | 479.498.000,00 | DESARROLLO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DEL RIESGO POR EL DESABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA BOCATOMA SOBRE LA QUEBRADA LAS MARGARITAS LÍNEA DE ADUCCIÓN Y PTAP LOS NARANJOS DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ |
| CAQUETA | 18054 | INTERVENTORIA | 72.592.593,00 | INTERVENTORÍA AL DESARROLLO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DEL RIESGO POR EL DESABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA BOCATOMA SOBRE LA QUEBRADA LAS MARGARITAS LÍNEA DE ADUCCIÓN Y PTAP LOS NARANJOS DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ |
| CAQUETA | 18057 | PRE-INVERSION | 200.000.000,00 | ELABORACIÓN DE ESTUDIOS AMBIENTALES PARA EL TRÁMITE DE LA LICENCIA AMBIENTAL DEL PROYECTO -CONSTRUCCIÓN DEL RELLENO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE CARTAGENA DEL CHAIRÁ DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ- |
| CARTAGENA DEL CHAIRA | 18058 | PRE-INVERSION | 100.000.000,00 | ELABORACIÓN DE ESTUDIOS AMBIENTALES PARA EL TRÁMITE DE LA LICENCIA AMBIENTAL DEL PROYECTO -CONSTRUCCIÓN DEL RELLENO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE CARTAGENA DEL CHAIRÁ DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ- |
| CAQUETA | 19001 | OTROS | 126.017.227,00 | REFORMULACIÓN A LA CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL MUNICIPIO DE ALBANIA |

(Componente Financiero PEI, 2024 – PDA Caquetá)

CL

| | | |
|---|---|--|
|  | <p align="center">DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ</p> |  |
|  | <p align="center">Informe de Seguimiento del PEI</p> | <p align="right">Versión 1.0 17/01/2020</p> |

3. COMPONENTE DE ASEGURAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

3.1. PLAN DE ASEGURAMIENTO 2025-2026 EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ.

Durante el mes de octubre de 2025, en el marco del Comité Directivo No. 59 del Plan Departamental de Agua del Caquetá, se aprobó la ejecución del Plan de Aseguramiento de la Prestación (PAP) 2025–2027, elaborado conforme a lo dispuesto en el artículo 2.3.3.1.2.3 del Decreto 1425 de 2019 y con el acompañamiento técnico del grupo de aseguramiento del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT).

El PAP 2025–2027 se estructura en torno a cuatro líneas estratégicas, cada una desarrollada dentro de su respectiva fase, para atender de manera integral los principales desafíos del sector:

- **Línea Estratégica 1 – Fase 1: Diagnóstico integral para el fortalecimiento de la gestión empresarial del prestador de servicios públicos.**

Contempla la realización de un diagnóstico integral que incluya los componentes institucional, legal, administrativo, financiero, comercial y técnico-operativo, permitiendo caracterizar el estado actual de la prestación de los servicios y establecer una línea base para la formulación de acciones de mejora.

- **Línea Estratégica 2 – Fase 2: Formulación de la estrategia para asegurar la prestación de los servicios públicos.**

Consiste en formular la estrategia para asegurar la prestación de los servicios públicos de agua potable y saneamiento básico, conforme al Decreto 1077 de 2015. Esta estrategia considerará alternativas como el fortalecimiento institucional, transformación empresarial o revisión de contratos de operación, basándose en los resultados del diagnóstico integral realizado.

- **Línea Estratégica 3 – Fase 3: Uso y destinación de los recursos SGP–APSB.**

Dirigida a implementar acciones de acompañamiento y asistencia técnica a las administraciones municipales y prestadores, con el objetivo de optimizar la planeación, ejecución y control de los recursos del Sistema General de Participaciones para Agua Potable y Saneamiento Básico (SGP–APSB), contribuyendo así a la reducción de los niveles de riesgo asociados a su manejo.

- **Línea Estratégica 4 – Fase 3: Calidad del agua.**

Enfocada en fortalecer la capacidad operativa de las Plantas de Tratamiento de Agua Potable (PTAP), mediante la dotación de equipos básicos de monitoreo y control, para garantizar el cumplimiento de los estándares de calidad establecidos por la normativa vigente y reducir el Índice de Riesgo de la Calidad del Agua (IRCA).

El Comité Directivo aprobó los recursos destinados a la ejecución del PAP, cuya implementación contempla tres procesos contractuales que se encuentran en fase de estructuración, en articulación con los componentes de Aseguramiento, Planeación y Jurídico del PDA.

En seguimiento a esta aprobación, el Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDR) No. 19534 fue expedido el 5 de noviembre de 2025, con un valor de \$443.582.092, con cargo a la fuente PA FIA – SGP Agua Potable y Saneamiento Básico, garantizando así la disponibilidad de recursos para el Plan de Aseguramiento 2025–2026.

De acuerdo con el cronograma establecido, la etapa de estructuración y contratación se desarrollará en un plazo de dos meses, periodo durante el cual se consolidarán los insumos técnicos, financieros y jurídicos requeridos para su presentación ante el Comité de Contratación.

Con esta aprobación y asignación presupuestal, el PDA del Caquetá avanza hacia la ejecución efectiva del Plan de Aseguramiento, asegurando su desarrollo conforme a los lineamientos del MVCT y contribuyendo al fortalecimiento sostenible de los servicios de agua potable y saneamiento básico en el departamento.

3.2. PACA PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL AGUA - PACA.

En relación al proyecto Plan de Aseguramiento de Calidad de Agua "PACA", se han ejecutado los 8 subprogramas que los componen y actualmente se encuentra en proceso de cierre.

3.2.1. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL AGUA - PACA.

| PROGRAMA/SUBPROGRAMAS PACA | APROBADO PACA | CONTRATISTA | VALOR EJECUTADO | SALDO | VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO |
|--|------------------|------------------------------|------------------|----------------|------------------------------|
| Programa de Capacitación y Asistencia Técnica a los prestadores de Servicio de Acueducto | 52.500.000,00 | | 89.750.000,00 | -37.250.000,00 | |
| Subprograma de capacitación para operarios de planta de tratamiento. | | María Angélica Losada Olarte | 81.000.000,00 | | OK |
| Subprograma de capacitación para fontaneros | | María Angélica Losada Olarte | | | OK |
| Subprograma de certificación en competencias laborales para operarios de acueducto | | María Elza Morales García | 8.750.000,00 | | OK |
| | | María Elza Morales García | | 22.500.000,00 | OK |
| Programa de Implementación equipo básico de control de calidad de agua | 449.724.871,00 | | 43.812.896,00 | 405.911.975,00 | |
| Subprograma de mantenimiento y calibración externa de equipos existentes | 43.812.896,00 | CM y CIA Compañía Limitada | 43.812.896,00 | | OK |
| Subprograma dotación kit básico de laboratorio | 405.911.975,00 | INGEODER PHARMA | 491.521.838 | 54.950.360,36 | OK |
| Programa de optimización del equipamiento de las PTAP | 1.554.292.800,00 | UTP PACA 2019 | 1.475.808.669,40 | 78.484.130,60 | OK |
| Reposición de válvulas | | | | | OK |
| Reposición de módulos de sedimentación | | | | | |
| Reposición de lechos filtrantes | | | | | |

| | | | | | |
|---|----------------|-------------------------------|----------------|----------------|----|
| Programa de optimización de sistemas de desinfección en las PTAP | 306.450.000,00 | UTP PACA 2019 | 326.053.080,60 | -19.603.080,60 | |
| Instalación de sistema de cloración de solución al vacío para la dosificación de gas cloro | | | | | OK |
| Instalación de bomba dosificadora para cloración con hipoclorito de calcio en solución | | | | | |
| Dotación de elementos de seguridad personales y colectivos para el manejo del cloro | | | | | |
| Programa de optimización de sistema dosificación de químicos (coagulantes y ayudantes de coagulación y/o estabilizadores de pH), para las PTAP convencionales. | 262.536.000,00 | | 175.045.000,00 | 87.491.000,00 | |
| Realización de pruebas de tratabilidad | | EN EJECUCIÓN | | 45.040.310,00 | OK |
| 3 dotación de sistema de dosificación de productos químico | | UTP PACA 2019 | 175.045.000,00 | | OK |
| 3.1.6. Programa de macromedición para las PTAP | 699.840.000,00 | UTP PACA 2019 | 595.218.000,00 | 104.622.000,00 | |
| Instalación de macromedición en entradas y salidas de las PTAP | | | 595.218.000,00 | | OK |
| 3.1.7. Programa de optimización de puntos de toma de muestras concertados en red de distribución | 280.000.000,00 | | 250.000.000,00 | 30.000.000,00 | |
| Construcción de puntos de toma de muestras concertados | | CONTRATAR SAS | 250.000.000,00 | | OK |
| 3.1.8. Programa de análisis de laboratorios físicoquímicos y microbiológicos para seguimiento y control de calidad de agua, en laboratorio autorizado por INS. | 173.905.000,00 | SERVAF S.A. E.S.P | 147.116.992,36 | 26.788.007,64 | OK |
| Interventoría a programas de: optimización del equipamiento de las PTAP, sistemas de desinfección en las PTAP, optimización de sistemas de dosificación de químicos para las PTAP convencionales (subprograma dotación de sistemas de dosificación de productos químicos) y macro medición. | | JOSE MAURICIO ESPINEL GARNICA | 166.972.800,00 | | OK |

3.3. MUNICIPIOS CON FIRMA DE OTROSÍ Y MODIFICACIONES Y/O AUTORIZACIONES DE LOS RECURSOS DEL SGP-APSB CON DESTINO A INVERSIÓN AL PDA.

A continuación, se relacionan los dieciséis (16) municipios que conforman el departamento del Caquetá y que se encuentran vinculados al PDA Caquetá mediante convenio suscrito entre el Departamento, el municipio y el Gestor. Dichos entes territoriales reúnen los requisitos contemplados en el Decreto 1077 de 2015.

| Municipio | Fecha Convenio U otrosí Vigente (DD/MM/AAA) | Estado Suscripción PAM | Fecha Suscripción PAM Vigente | Observaciones |
|------------------------|---|------------------------|-------------------------------|---|
| Albania | 11/11/2025 | SUSCRITO | 30/09/2028 | Otrosí firmado el día 11 de noviembre de 2025, transferencia realizada el 29 de octubre de 2025. |
| Belén de los Andaquíes | 18/10/2024 | SUSCRITO | 22/03/2024 | Pendiente remisión de documentos por parte del municipio para suscripción de OTROSI 2025. Los documentos (CDP, formulario SARLAF, Certificado de compromisos vigentes, estados financieros, entre otros) fueron solicitados con oficio y mediante correo electrónico por parte del PDA, el municipio da respuesta el día 8 de septiembre de 2025 indicando que se encuentra en proceso de actualización del acuerdo municipal que autoriza aportes al PDA, programado para debatir en |

| Municipio | Fecha de suscripción | Estado | Fecha de transferencia | Observaciones |
|------------------------|----------------------|----------|------------------------|---|
| Cartagena del Chairá | 09/10/2025 | SUSCRITO | 01/04/2025 | sesiones extraordinarias. ultimo requerimiento realizado el 29 de diciembre Otro sí firmado el día 9 de octubre de 2025, transferencia realizada el 15 de diciembre de 2025. |
| Curillo | 09/09/2025 | SUSCRITO | 11/11/2025 | Otro sí firmado el día 9 de septiembre de 2025, transferencia realizada 29 de octubre de 2025. |
| El Doncello | 28/10/2025 | SUSCRITO | 14/03/2024 | Otro sí firmado el día 28 de octubre de 2025, transferencia realizada el 24 de diciembre de 2025. |
| El Paujil | 19/12/2025 | SUSCRITO | 13/03/2024 | Otro sí firmado el día 19 de diciembre de 2025, transferencia realizada el 24 y el 30 de diciembre de 2025. |
| Florencia | 18/11/2025 | SUSCRITO | 16/09/2024 | Otro sí firmado el día 18 de noviembre de 2025, transferencia realizada 25 de noviembre de 2025. |
| La Montañita | 26/12/2025 | SUSCRITO | 23/12/2024 | Otro sí firmado el día 26 de diciembre de 2025, pendiente transferencia. |
| Milán | 09/09/2025 | SUSCRITO | 30/04/2025 | Otro sí firmado el día 9 de septiembre de 2025, transferencia realizada el día 3 de octubre de 2025 |
| Morelia | 21/09/2025 | SUSCRITO | 18/03/2024 | Otro sí firmado el día 21 de octubre de 2025, transferencia realizada el día 24 de octubre de 2025 |
| Puerto Rico | 18/11/2025 | SUSCRITO | 12/08/2024 | Otro sí firmado el día 18 de noviembre de 2025, transferencia realizada el 24 de diciembre de 2025. |
| San José del Fragua | 22/09/2025 | SUSCRITO | 18/11/2025 | Otro sí firmado el día 22 de septiembre de 2025, transferencia realizada el día 7 de octubre de 2025 |
| San Vicente del Caguán | 12/12/2025 | SUSCRITO | 28/11/2025 | Otro sí firmado el día 12 de diciembre de 2025, transferencia realizada el 24 de diciembre de 2025. |
| Solano | 18/11/2025 | SUSCRITO | 24/06/2025 | Otro sí firmado el día 18 de noviembre de 2025, transferencia realizada 30 de diciembre de 2025. |
| Solita | 22/09/2025 | SUSCRITO | 26/08/2025 | Otro sí firmado el día 22 de septiembre de 2025, transferencia realizada el día 5 de noviembre de 2025 |
| Valparaíso | 25/07/2025 | SUSCRITO | 21/02/2025 | Otro sí firmado el día 25 de julio de 2025 y transferencia realizada en el 26 de agosto de 2025. |

3.3.1. AUTORIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE GIRO DIRECTO DE LOS RECURSOS DEL SGP-APSB COMPROMETIDOS POR LOS MUNICIPIOS AL PDA CAQUETÁ

La modificación a la Autorización para Beneficiarios del Giro Directo de los Recursos del Sistema General de Participaciones para Agua Potable y Saneamiento Básico (SGP-APSB), se perfecciona a partir de la radicación y aprobación de la documentación correspondiente ante el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, la cual se evidencia a partir del giro de los recursos al Patrimonio Autónomo FIA.

Así las cosas, el proceso de proyección y afectación mensual de la Autorización de giro de los recursos comprometidos para la presente vigencia, solo queda pendiente la transferencia del municipio de La Montañita.

3.3.2. EL PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA - PDA REALIZA MESAS DE TRABAJO CON LOS ACTORES VINCULADOS PARA CONCERTAR LAS NECESIDADES PARA EL SECTOR APSB ANUALIDAD 2025 Y PROYECCIÓN A 2027.

El Gestor y Coordinador del Plan Departamental de Agua y su equipo de trabajo dan continuidad al proceso de concertación de necesidades en el sector de Agua Potable y Saneamiento Básico - APSB con los diferentes mandatarios de los municipios vinculados. Se realizó socialización de los avances obtenidos en las vigencias anteriores con los convenios tripartitos, la ejecución de los

recursos y el impacto en los indicadores de línea base. Revisando los Planes de Acción municipales donde se propone el financiamiento de proyectos en pro de mejorar las condiciones y calidad de vida de las comunidades del Departamento.

3.4. SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE ACCIÓN MUNICIPAL

En este periodo se concertaron necesidades en el sector de Agua Potable y Saneamiento Básico con los municipios vinculados al PDA para las vigencias 2024-2027, definiendo las posibles fuentes de financiación de proyectos entre el Gestor y el municipio.

| MUNICIPIO | NOMBRE PROYECTO / PROGRAMA / ACTIVIDAD | VALOR TOTAL (ESTIMADO) | AVANCE DEL PROYECTO |
|------------------------|---|------------------------|---|
| ALBANIA | Construcción del Tanque de almacenamiento en el municipio de Albania, Departamento de Caquetá. | 1.324.561.409,00 | Proyecto contratado por el municipio en la vigencia 2024 |
| | Optimización de las redes de distribución de alcantarillado urbano en el municipio de Albania, departamento del Caquetá | 1.878.000.000,00 | Proyecto en proceso de viabilización |
| | Adecuación de la línea de conducción del acueducto municipal del casco urbano, cambiar tubería de asbesto cemento a PVC | 245.000.000,00 | Proyecto para ejecutar en la vigencia 2026 |
| | Ampliación de red de distribución acueducto Centro poblado el Paraíso - "Agua a la Vereda" | 550.000.000,00 | Proyecto para ejecutar en la vigencia 2027 |
| BELEN DE LOS ANDAQUIES | Canalización de 300 metros de aguas residuales del Caño San Francisco del municipio de Belén de los Andaquíes | 1.840.595.681,50 | |
| | Reposición de alcantarillado en el casco urbano | 373.909.787,62 | Proyecto pendiente de radicación por parte del municipio, ante el mecanismo viabilizador del PDA. |
| | Construcción de sistemas de tratamiento de aguas residuales en los centros poblados del municipio | 1.306.628.212,23 | Proyecto para ejecutar en la vigencia 2027 |
| CARTAGENA DEL CHAIRA | Construcción de alcantarillado pluvial para recolección de aguas lluvias provenientes de los barrios Camilo Torres, Villa Chaira y Gaitán del municipio de Cartagena del Chaira departamento del Caquetá. | 1.129.913.510,00 | Proyecto contratado por el municipio en la vigencia 2024 |
| | Construcción de muro de Contención para la reducción del riesgo en el área de Captación de Agua sobre el Río Caguán, Fuente Abastecedora del Sistema de Acueducto en la Cabecera municipal de Cartagena del Chairá, departamento de Caquetá | 644.613.510,00 | Proyecto no ejecutado, se priorizan otras necesidades. |
| | Elaboración de estudios ambientales para el trámite de la licencia ambiental del proyecto "construcción del relleno sanitario y obras complementarias en el municipio de Cartagena del Chairá departamento de Caquetá" | 300.000.000,00 | Proyecto pendiente de radicación por parte del municipio, ante el mecanismo viabilizador del PDA. |
| | Construcción del relleno sanitario y obras complementarias en el municipio de Cartagena del Chaira departamento de Caquetá. | 1.114.700.000,00 | Proyecto para ejecutar en la vigencia 2026 |
| | Optimización del sistema de captación del agua cruda sobre el río Caguán, para abastecer el sistema de acueducto del municipio de Cartagena del Chaira | 1.425.464.475,74 | Proyecto para ejecutar en la vigencia 2027 |

| | | | |
|--------------|---|------------------|---|
| CURILLO | Construcción de alcantarillado sanitario entre las calles 9° a la 11° y entre las carreras del 2° al 4° del municipio de Curillo – Caquetá | 667.603.489,00 | Proyecto contratado por el municipio en la vigencia 2024 |
| | Elaboración del plan maestro de acueducto y alcantarillado (incluye catastro de redes) del municipio de Curillo, en el departamento de Caquetá. | 400.000.000,00 | Proyecto no ejecutado, se priorizan otras necesidades. |
| | Dotación de equipos para la medición de agua (macro medidores) y de llenado automático para la planta de tratamiento de agua potable de Curillo. | 50.000.000,00 | Proyecto no ejecutado, se priorizan otras necesidades. |
| | Construcción y reposición de la primera fase de red de alcantarillado sanitario en el barrio Turbay del municipio de Curillo departamento del Caquetá | 693.000.000,00 | Proyecto para ejecutar en la vigencia 2026 |
| | Construcción de tanque elevado de distribución de agua potable con capacidad de 100 metros cúbicos | 500.000.000,00 | Proyecto para ejecutar en la vigencia 2027 |
| EL DONCELLO | Reposición de alcantarillado sanitario barrio la Libertad, municipio de el Doncello departamento del Caquetá | 243.876.000,00 | Proyecto contratado por el municipio en la vigencia 2024 |
| | Adquisición de un vehículo compactador - para la recolección de residuos sólidos del Municipio de El Doncello. | 1.000.000.000,00 | Proyecto para ejecutar en la vigencia 2026 |
| | Construcción de nuevo tanque de almacenamiento de agua potable para la cabecera municipal del Doncello | 1.000.000.000,00 | Proyecto para ejecutar en la vigencia 2027 |
| EL PAUJIL | Estudios y diseño para la construcción del Acueducto y Alcantarillado del centro poblado Versalles en el municipio El Paujil. | 100.000.000,00 | Proyecto pendiente de radicación por parte del municipio, ante el mecanismo viabilizador del PDA. |
| | Estudios y diseño para la construcción del Acueducto del centro poblado Bolivia del municipio El Paujil. | 120.000.000,00 | Proyecto pendiente de radicación por parte del municipio, ante el mecanismo viabilizador del PDA. |
| | Estudios y diseño para la Optimización sistema de acueducto en sus componentes de captación, desarenador, conducción, PTAP, tanque de almacenamiento y red de distribución para el municipio de El Paujil - Caquetá | 273.232.694,00 | Proyecto pendiente de radicación por parte del municipio, ante el mecanismo viabilizador del PDA. |
| | Construcción del Acueducto y Alcantarillado del centro poblado Versalles en el municipio de El Paujil | 276.155.771,00 | Proyecto pendiente de radicación por parte del municipio, ante el mecanismo viabilizador del PDA. |
| | Construcción del Acueducto del centro poblado Bolivia del municipio El Paujil. | 276.155.771,00 | Proyecto para ejecutar en la vigencia 2026 |
| | Optimización sistema de acueducto en sus componentes de captación, desarenador, conducción, PTAP, tanque de almacenamiento y red de distribución para el municipio de El Paujil - Caquetá | 1.104.623.084,00 | Proyecto para ejecutar en la vigencia 2027 |
| | Construcción del sistema de alcantarillado del barrio la esmeralda del municipio de Florencia, departamento del Caquetá | 1.746.585.992,00 | |
| FLORENCIA | Reformulación del proyecto "construcción etapa uno del colector de alcantarillado sanitario sobre la rivera de la quebrada la sardina. Municipio de Florencia, departamento de Caquetá" | 500.000.000,00 | Contratado por el municipio en la vigencia 2025 |
| | Realizar los estudios y diseños para la construcción del sistema de alcantarillado del asentamiento de Paloquemado del municipio de Florencia, departamento del Caquetá | 500.000.000,00 | Proyecto no ejecutado, se priorizan otras necesidades. |
| LA MONTAÑITA | Ejecución de obras de mitigación del riesgo por el desabastecimiento de agua potable, en la bocatoma | 980.000.000,00 | |

| | | | |
|--------------------|---|-------------------|---|
| | sobre la quebrada Las Margaritas, línea de aducción y PTAP Los Naranjos del municipio de La Montañita, departamento del Caquetá | | |
| | Optimización de la Planta de Tratamiento de agua potable PTAP en la inspección de Mate guadua del municipio de La Montañita Caquetá. | 964.239.000,00 | |
| | Optimización sistema de acueducto vereda Itarca municipio de La Montañita departamento de Caquetá | 853.000.000,00 | Proyecto para ejecutar en la vigencia 2026 |
| | Optimización de la red de alcantarillado sanitario en la inspección de Santuario del municipio de La Montañita Caquetá. | 1.186.429.799,70 | Proyecto para ejecutar en la vigencia 2027 |
| MILAN | Canalización de aguas lluvias en la calle 4, entre cra 2 a la cra 6, del casco urbano de la inspección de San Antonio de Getuchá, en el municipio de Milán, departamento del Caquetá. | 1.057.248.000,00 | |
| | Construcción de acueducto rural para las veredas La Rastra y El Diamante la Diez en el municipio de Milán. | 300.000.000,00 | Proyecto pendiente de radicación por parte del municipio, ante el mecanismo viabilizador del PDA. |
| | Optimización de la planta de tratamiento de agua residuales PTAR de la cabecera municipal de Milán departamento de Caquetá | 300.000.000,00 | Proyecto para ejecutar en la vigencia 2026 |
| | Optimización de la planta de tratamiento de agua residuales PTAR inspección de Remolinos de Aricuntí municipio de Milán departamento de Caquetá. | 255.248.000,00 | Proyecto para ejecutar en la vigencia 2027 |
| MORELIA | Mejoramiento del sistema de captación mediante la ejecución de obras de mitigación del riesgo para el desabastecimiento sobre la quebrada La Batea en el municipio de Morelia | 516.911.936,00 | Proyecto en proceso de contratación. |
| | Optimización de tramos de alcantarillado en el municipio de Morelia departamento del Caquetá | 1.840.000.000,00 | Proyecto en proceso de viabilización |
| | Construcción tercera etapa sistema de alcantarillado municipio de Morelia departamento de Caquetá. | 11.000.000.000,00 | Proyecto pendiente de radicación por parte del municipio, ante el mecanismo viabilizador del PDA. |
| | Fortalecimiento institucional Creación Empresa de Servicios Públicos de Morelia (ESP). | 225.000.000,00 | Proyecto pendiente de radicación por parte del municipio, ante el mecanismo viabilizador del PDA. |
| | Construcción fuente alterna con energía renovable para sistema de bombeo PTAP del municipio de Morelia departamento de Caquetá. | 225.000.000,00 | Proyecto para ejecutar en la vigencia 2026 |
| | Reposición sistema de alcantarillado sanitario municipio de Morelia departamento de Caquetá. | 225.000.000,00 | Proyecto para ejecutar en la vigencia 2027 |
| PUERTO RICO | Reposición parcial del alcantarillado del barrio Oasis del municipio de Puerto Rico departamento de Caquetá. | 655.166.678,00 | Proyecto en proceso de contratación. |
| | Construcción de una planta de tratamiento de agua potable (PTAP), para el centro poblado del corregimiento de Rio Negro, municipio de Puerto Rico - Caquetá. | 957.000.000,00 | Pendiente por definir vigencia y aportes. |
| | Construcción de muro y captación alterna de agua sobre la quebrada La Conga, fuente abastecedora del sistema de acueducto de la cabecera municipal de Puerto Rico Caquetá | 620.425.000,00 | Pendiente por definir vigencia y aportes. |
| | Fase II construcción colectores interceptores sobre quebrada Las Damas, en los barrios: Las Damas, El Triunfo, Libertador, Las Américas y San Fernando, en | 457.000.000,00 | Pendiente por definir vigencia y aportes. |

| | | | |
|-------------------------------|---|------------------|---|
| | el municipio de Puerto Rico, departamento de Caquetá. | | |
| | Construcción del colector de aguas lluvias de las calles 4° y 6° del casco urbano del municipio de Puerto Rico" | 457.000.000,00 | Pendiente por definir vigencia y aportes. |
| | Construcción de una planta de tratamiento de agua potable (PTAP) para el centro poblado de la vereda La Chipa Baja, municipio de Puerto Rico – Caquetá. | 791.367.310,83 | Proyecto no ejecutado, se priorizan otras necesidades. |
| | Fase III construcción colectores interceptores sobre quebrada Las Damas, en los barrios: Las Damas, El Triunfo, Libertador, Las Américas y San Fernando, en el municipio de Puerto Rico, departamento de Caquetá. | 1.000.000.000,00 | Pendiente por definir vigencia y aportes. |
| | Implementación del programa de gestión por demanda y sectorización. | 600.000.000,00 | Pendiente por definir vigencia y aportes. |
| | Estudios y diseños para la automatización y optimización de la planta de tratamiento de agua potable del municipio de Puerto Rico departamento del Caquetá. | 220.000.000,00 | Pendiente por definir vigencia y aportes. |
| | Estudios y diseños para la construcción de la PTAR, del municipio de Puerto Rico departamento del Caquetá. | 120.000.000,00 | Pendiente por definir vigencia y aportes. |
| | Implementar el programa de aprovechamiento residuos sólidos definidos en el PGIRS del municipio de Puerto Rico, Caquetá | 500.000.000,00 | Pendiente por definir vigencia y aportes. |
| SAN JOSE DEL FRAGUA | Construcción Celda de disposición final Relleno Sanitario El Cairo Municipio de San José del Fragua | 929.730.612,00 | Contratado por el municipio en la vigencia 2024 |
| | Ampliación planta de tratamiento de agua potable casco urbano (PTAP) construcción de módulo adicional (Floculador, sedimentador, filtros y tanque de almacenamiento) Municipio de San José del Fragua, en el departamento de Caquetá. | 1.100.000.000,00 | |
| | Fortalecimiento del programa de aprovechamiento del PGIRS del municipio de San José del Fragua | 230.000.000,00 | |
| | Carro compactador recolector de residuos sólidos para la inspección de Yurayaco, Fragueta y Sabaleta del municipio de San José del Fragua departamento de Caquetá. | 1.000.000.000,00 | Proyecto para ejecutar en la vigencia 2027 |
| SAN VICENTE DEL CAGUÁN | Adquisición de carro compactador, recolector de residuos sólidos para el casco urbano de San Vicente del Caguán | 1.000.000.000,00 | |
| | Optimización sistema de alcantarillado en barrios del casco urbano del Municipio de San Vicente del Caguán Departamento de Caquetá | 317.621.653,53 | Proyecto pendiente de radicación por parte del municipio, ante el mecanismo viabilizador del PDA. |
| | Optimización de la planta de tratamiento de agua potable mediante la adecuación de la planta de bombeo y filtros de la PTAP del Municipio de San Vicente del Caguán | 600.000.000,00 | Proyecto pendiente de radicación por parte del municipio, ante el mecanismo viabilizador del PDA. |
| | Construcción acueducto y alcantarillado centro poblado Piscinas del municipio de San Vicente departamento de Caquetá | 116.000.000,00 | Proyecto pendiente de radicación por parte del municipio, ante el mecanismo viabilizador del PDA. |
| | Compra de Micromedidores | 200.000.000,00 | Proyecto pendiente de radicación por parte del municipio, ante el mecanismo viabilizador del PDA |

| | | | |
|-------------------|---|------------------|---|
| | Manejo de Aguas Lluvias en el Centro | 500.000.000,00 | Proyecto pendiente de radicación por parte del municipio, ante el mecanismo viabilizador del PDA. |
| | Optimización sistema de alcantarillado en barrios del casco urbano del Municipio de San Vicente del Caguán Departamento de Caquetá | 250.000.000,00 | Proyecto para ejecutar en la vigencia 2026 |
| | Construcción de tramo de alcantarillado pluvial en la vía Circunvalar del casco urbano del municipio de San Vicente del Caguán | 600.000.000,00 | Proyecto para ejecutar en la vigencia 2027 |
| SOLANO | Reconstrucción del sistema de suministro de agua para la inspección de Mononguete del municipio de Solano departamento de Caquetá. | 2.900.000.000,00 | |
| | Adquisición de vehículo compactador recolector de residuos sólidos para el municipio de Solano departamento de Caquetá. | 1.000.000.000,00 | |
| | Construcción del relleno sanitario y obras complementarias en el municipio de Solano, departamento de Caquetá. | 1.299.265.979,00 | Pendiente para ejecutar en 2025 |
| | Reformulación de los Estudios y diseños para la construcción de una nueva bocatoma para el acueducto del casco urbano del municipio de Solano, departamento de Caquetá. | 600.000.000,00 | Proyecto pendiente de radicación por parte del municipio, ante el mecanismo viabilizador del PDA. |
| | Construcción de Planta de Tratamiento de Agua Potable para el centro poblado las Mercedes del municipio de Solano departamento de Caquetá | 900.000.000,00 | Proyecto para ejecutar en la vigencia 2026 |
| | Construcción del acueducto y alcantarillado de los 29 resguardos indígenas del municipio de Solano departamento de Caquetá. | 2.000.000.000,00 | Proyecto para ejecutar en la vigencia 2027 |
| SOLITA | Construcción del Sistema de Alcantarillado en el municipio de Solita departamento del Caquetá | 700.000.000,00 | Proyecto pendiente de radicación por parte del municipio, ante el mecanismo viabilizador del PDA. |
| | Optimización del sistema de Acueducto en el municipio de Solita departamento del Caquetá | 1.500.000.000,00 | Proyecto para ejecutar en la vigencia 2026 |
| | Reposición del Sistema de Alcantarillado en el municipio de Solita departamento del Caquetá | 180.620.703,52 | Proyecto para ejecutar en la vigencia 2027 |
| VALPARAÍSO | Construcción del alcantarillado sanitario y su sistema de tratamiento de aguas residuales (PTAR) del centro poblado Santiago de la Selva del municipio de Valparaíso, departamento de Caquetá (Primer Fase) | 1.457.241.000,00 | Pendiente de permisos |
| | Implementación del programa de gestión por demanda y sectorización. | 500.000.000,00 | Pendiente radicación por parte del municipio |
| | Construcción del sistema de acueducto y planta de tratamiento de agua potable (PTAP) en el centro poblado Playa Rica del municipio de Valparaíso, departamento de Caquetá | 1.400.000.000,00 | Proyecto para ejecutar en la vigencia 2026 |
| | Construcción de Acueducto Rural Núcleo La Florida en el municipio de Valparaíso, departamento de Caquetá | 810.000.000,00 | Proyecto para ejecutar en la vigencia 2027 |

3.5. ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL.

Durante los meses de noviembre y diciembre de 2025, el grupo interdisciplinario del Componente de Aseguramiento adelantó diversas acciones orientadas al fortalecimiento de las capacidades

institucionales de los actores municipales y regionales responsables de la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo.

Estas actividades, de carácter operativo, técnico, administrativo, comercial y financiero, se desarrollaron con el propósito de fortalecer la gestión de los prestadores y promover la sostenibilidad de las inversiones y de la prestación de los servicios públicos en el mediano y largo plazo.

A continuación, se relacionan las principales acciones de fortalecimiento institucional ejecutadas durante este periodo:

| TEMA | MUNICIPIO | PARTICIPANTES | REGISTRO FOTOGRÁFICO |
|---|--------------|---|---|
| Fortalecimiento institucional en el municipio de La Montañita sobre la importancia de la tarifa y micro medición de los servicios de acueducto, aseo y alcantarillado. | La Montañita | Empresa de servicios públicos y comunidad |  |
| Socialización del estado financiero del municipio de El Paujil con el nuevo Secretario de planeación del municipio, presentación de la propuesta de proyectos a ejecutar en la vigencia 2025 para actualizar el plan de acción y definir los aportes dentro del acuerdo tripartito y cofinanciación por parte de la Gobernación del Caquetá | El Paujil | Secretario y asesores alcaldía El Paujil. |  |

Fuente: (Aseguramiento, 2025)

PROYECTOS

Proyectos Viabilizados.

| Municipio | Nombre del Proyecto/Actividad | Servicio(s) | Ubicación | Valor (Pesos) | Valor por Fuente | | | | Número de Comité | Fecha de Presentación al Comité Técnico | Estado |
|----------------------|--|----------------|-----------|---------------|------------------|------------------|--------|------|---------------------------|---|------------------|
| | | | | | Municipio | Departamento | Nación | Otro | | | |
| Albania | Optimización de las Redes de Distribución de Alcantarillado Urbano en el municipio de Albania, departamento del Caquetá | Alcantarillado | Urbano | 1.878.000.000 | 272.255.472,22 | 1.605.744.527,78 | | | Comité Técnico 03 de 2024 | 23 de diciembre de 2024 | APROBADO |
| | | | | | | | | | Comité Técnico 01 de 2025 | 14 de agosto de 2025 | APROBADO AJUSTES |
| La Montañita | Desarrollo Ejecución de Obras de Mitigación del Riesgo por el Desabastecimiento de Agua Potable, en la Bocatoma sobre la quebrada Las Margaritas Línea de Aducción y PTAP los Naranjos del municipio de La Montañita, departamento del Caquetá | Acueducto | Urbano | 970.925.925 | 479.498.000 | 491.427.925 | | | Comité Técnico 03 de 2024 | 23 de diciembre de 2024 | APROBADO |
| | | | | | | | | | Comité Técnico 01 de 2025 | 14 de agosto de 2025 | APROBADO AJUSTES |
| | | | | | | | | | Comité Técnico 02 de 2025 | 07 de noviembre de 2025 | APROBADO AJUSTES |
| Morelia | Optimización de tramos de Alcantarillado, en el municipio de Morelia, departamento de Caquetá" | Alcantarillado | Urbano | 1.839.983.466 | 40.000.000,0 | 1.799.983.466,0 | | | Comité Técnico 03 de 2024 | 23 de diciembre de 2024 | APROBADO |
| | | | | | | | | | Comité Técnico 01 de 2025 | 14 de agosto de 2025 | APROBADO AJUSTES |
| Albania | Construcción Tanque de Almacenamiento de Agua Potable para el municipio de Albania." | Acueducto | Urbano | 1.324.561.409 | 553.561.409 | 771.000.000 | | | Comité Técnico 05 de 2024 | 16 de noviembre de 2023 | APROBADO |
| Cartagena del Chairá | Construcción de Alcantarillado Pluvial Para Recolección de Aguas Lluvias Provenientes de los barrios Camilo Torres, Villa Chaira y Gaitán del municipio de Cartagena del Chairá departamento del Caquetá | Alcantarillado | Urbano | 1.129.913.510 | 1.000.000.000 | 129.913.510 | | | Comité Técnico 05 de 2024 | 16 de noviembre de 2023 | APROBADO |
| Solano | Construcción del Relleno Sanitario y Obras Complementarias en el municipio de Solano – Caquetá Fase 1 | Aseo | Urbano | 1.299.265.979 | 1.299.265.979 | 0 | | | Comité Técnico 05 de 2024 | 16 de noviembre de 2023 | APROBADO |
| Curillo | Construcción de Alcantarillado Sanitario entre las calles 9ª al 11 y entre las carreras del 2ª al 4ª del municipio. | Alcantarillado | Urbano | 667.603.489 | 393.987.677 | 273.615.812 | | | Comité Técnico 01 de 2024 | 02 de octubre de 2024 | APROBADO |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|----------------|--------|---------------|-------------|-------------|--|--|---------------------------|-------------------------|-----------------|
| Milán | Adecuación y Canalización de Aguas Lluvias en la Calle 4, entre Cra 2 a la Cra 6, del casco urbano de la inspección de San Antonio de Getuchá, en el municipio de Milán, departamento del Cauquetá. | Alcantarillado | Urbano | 1.057.248.000 | 555.248.000 | 502.000.000 | | | Comité Técnico 01 de 2024 | 02 de octubre de 2024 | APROBADO |
| San José del Fragua | Construcción Celda de Disposición Final Relleno Sanitario El Cairo, municipio de San José del Fragua. | Aseo | Urbano | 929.730.612 | 529.730.612 | 400.000.000 | | | Comité Técnico 02 de 2024 | 31 de octubre de 2024 | APROBADO |
| Solano | Adquisición de Vehículo Compactador Recolector de Residuos Sólidos para el municipio de Solano departamento del Cauquetá. | Aseo | Urbano | 975.673.225 | 500.000.000 | 475.673.225 | | | Comité Técnico 02 de 2024 | 31 de octubre de 2024 | APROBADO |
| San Vicente del Caguán | Adquisición de Vehículo Recolector de Residuos Sólidos para la Prestación del Servicio Público de Aseo en el municipio de San Vicente del Caguán del departamento de Cauquetá | Aseo | Urbano | 975.673.225 | 175.673.225 | 800.000.000 | | | Comité Técnico 03 de 2024 | 23 de diciembre de 2024 | APROBADO |
| Puerto Rico | Reposición Parcial del Alcantarillado barrio Oasis municipio de Puerto Rico Cauquetá | Alcantarillado | Urbano | 655.166.678 | 55.166.678 | 600.000.000 | | | Comité Técnico 03 de 2024 | 23 de diciembre de 2024 | APROBADO |

Proyectos en Proceso de Contratación.

| Municipio | Nombre del Proyecto/Actividad | Estado | Servicio(s) | Ubicación | Valor (Pesos) | Fuente(s) | Fecha de Publicación en el SECOP | Observaciones |
|--|--|--------------------------|-----------------------------------|-----------|---------------|---|----------------------------------|---------------|
| la Montañita | Realizar la Interventoría Integral, la cual Efectuará el Seguimiento de los aspectos Contractuales, Técnicos, Administrativos, Financieros, Sociales y Ambientales al contrato de Obra cuyo Objeto es: Ejecutar la Obra Civil del proyecto denominado Desarrollo Ejecución de Obras de Mitigación del Riesgo por el Desabastecimiento de Agua Potable, en la Bocatoma sobre la quebrada Las Margaritas Línea de Aducción y PTAP Los Naranjos del municipio de La Montañita, departamento del Cauquetá. | en evaluación de ofertas | acueducto | rural | 72592593 | Componente en Infraestructura en Agua y Saneamiento PA FIA - SGP - Agua Potable y Saneamiento Básico | 29/12/2025 | |
| dieciséis (16) Municipios del Departamento del Cauquetá | Prestar los Servicios de Apoyo Logístico, Implementación y Ejecución del Plan de Gestión Social 2025, Como Herramienta del Componente de Gestión Social para el Cumplimiento de las Metas del Gestor del Plan Estratégico de Inversiones del Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento (PDA) | presentación de Ofertas | acueducto, alcantarillado y aseo. | Urbano | 350.000.000 | Componente en Infraestructura en Agua y Saneamiento PA FIA - SGP - Agua Potable y Saneamiento Básico | 19/12/2025 | |

Proyectos en Ejecución y/o Suspendidos

| Municipio(s) | Nombre del Proyecto/Actividad | Estado | Ubicación | Valor Contratado | Valor Adiciones | % de Ejecución | Avance Financiero | No de Prórrogas | No de Suspensiones | Fecha de Terminación (Real o Estimado) |
|------------------------|---|------------------------|-----------|------------------|-----------------|----------------|-------------------|-----------------|--------------------|--|
| San José del Fragua | Realiza la Interventoría Técnica, Administrativa y Financiera al Contrato que tiene por Objeto "Reposición y Mejoramiento de la Segunda Etapa de la Red de Alcantarillado Sanitario de la inspección de Fragueta municipio de San José del Fragua, Caquetá" | Proceso de Liquidación | Urbano | 46.300.144,5 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 26/12/2023 |
| Albania | Construcción de Box Coulvert 2.00 X 1.50 m en el barrio Villa Demo, Calle 1ra y 2da sur del municipio de Albania, departamento de Caquetá | Liquidado | Rural | 554.237.748 | 0 | 100% | 86,72% | 0 | 0 | 16/11/2023 |
| Albania | Realizar la Interventoría Técnica, administrativa y Financiera al contrato que tiene por Objeto "Construcción de Box Coulvert 2.00 X 1.50 m - barrio Villa Demo calle 1ra y 2da sur del municipio de Albania, departamento de Caquetá | Liquidado | Rural | 41.626.200 | 0 | 100% | 100% | 0 | 0 | 16/11/2023 |
| Belén de los Andaquíes | Optimización del Sistema de Acueducto (Adecuación Bocatoma, Desarenador, Cambio Red de Conducción, Adecuación PTAP) para el municipio de Belén de los Andaquíes - Caquetá | Suspendido | Urbano | 1.973.850.210 | 984.238.953 | 84% | 79% | 3 | 4 | 20/10/2025 |
| Belén de los Andaquíes | Interventoría para la Optimización del Sistema de Acueducto (Adecuación Bocatoma, Desarenador, Cambio de Red de Conducción, Adecuación PTAP) para el municipio de Belén de los Andaquíes. - Caquetá | Terminación Anticipada | Urbano | 157.862.574 | 78.840.401 | 84% | 58% | 3 | 4 | 17/10/2025 |
| Milán | Construcción del Acueducto Incluye PTAP de San Antonio de Getuchá - municipio de Milán - departamento del Caquetá | Liquidado | Rural | 1.735.052.751 | 0 | 100% | 0% | 3 | 2 | 20/12/2023 |
| Milán | Interventoría Integral (Técnica, Administrativa, Contable, Financiera, Jurídica y Ambiental) al Contrato de obra que tiene por Objeto: "Construcción del Acueducto Incluye PTAP de San Antonio de Getuchá - municipio de Milán - departamento del Caquetá | Liquidado | Rural | 93.677.847 | 0 | 100% | 0% | 3 | 2 | 20/12/2023 |
| Valparaíso | Interventoría Integral (Técnica, Administrativa, Financiera, Contable y Jurídica) del contrato que tiene por Objeto "Optimización del Sistema de Acueducto para el casco urbano del municipio de Valparaíso - Caquetá | Liquidado | Rural | 110.148.311 | 0 | 100% | 100% | | | 06/10/2022 |

| Municipio(s) | Nombre del Proyecto/Actividad | Estado | Ubicación | Valor Contratado | Valor Adiciones | % de Ejecución | Avance Financiero | No de Prórrogas | No de Suspensiones | Fecha de Terminación (Real o Estimado) |
|--------------|---|---------------------------|-----------|------------------|-----------------|----------------|-------------------|-----------------|--------------------|--|
| Florencia | Mejoramiento de la Calidad de Vida de la Población Vulnerable de Florencia en el departamento del Caquetá, a través de la Ampliación del Sistema de Acueducto para los barrios: Villa Clara, Nápoles, Villa Real y El Timmy. Florencia. | En ejecución | Urbano | 8.178.120.849 | 0 | 72% | 44,46% | 3 | 2 | 15/02/2026 |
| Florencia | Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera y Ambiental al contrato de Obra Civil que tiene por Objeto "El Mejoramiento de la Calidad de Vida de la Población Vulnerable de Florencia en el departamento del Caquetá, a través de la Ampliación del Sistema de Acueducto para los barrios: Villa Clara, Nápoles, Villa Real y El Timmy - Caquetá. | En ejecución | Urbano | 817.839.648 | 0 | 72% | 44,46% | 3 | 2 | 15/02/2026 |
| Florencia | Interventoría Integral (Técnica, Administrativa, Contable, Jurídica y Ambiental) Al Contrato de Obra que por Objeto: Construcción de Box Couvert de Canal Cerrado en el Caño Brisas del Hacha ubicado en la Comuna Norte del municipio de Florencia, Caquetá. | Liquidado | Urbano | 252.381.150 | 126.190.575 | 100% | 90,49% | 4 | 4 | 08/10/2021 |
| Florencia | Realizar los Estudios y Diseños para la Construcción del Sistema de Alcantarillado del Barrio La Esmeralda del municipio de Florencia, departamento del Caquetá | Liquidado | Urbano | 55,000,000 | 0 | 100% | 100% | 1 | 1 | 31/10/2024 |
| La Montañita | "Construcción de la Red de Distribución de Agua Potable barrio Las Palmas en el municipio de La Montañita Caquetá" | Liquidado | Urbano | 584,457,962 | 0 | 100% | 100% | 0 | 2 | 09/02/2024 |
| La Montañita | Realizar Interventoría Técnica, Administrativa y Financiera al Contrato que tiene por Objeto "Construcción de la Red de Distribución de Agua Potable barrio Las Palmas en el municipio de La Montañita Caquetá" | Liquidado | Urbano | 58,295,125.00 | 0 | 100% | 0% | 0 | 2 | 09/02/2024 |
| Morelia | Construcción Red de Acueducto y Planta de Tratamiento de Agua Potable para el casco urbano del municipio de Morelia - departamento de Caquetá | Liquidado | Urbano | 3.500.000.000 | 0 | 100% | 100% | 3 | 0 | 22/05/2025 |
| Morelia | "Interventoría Integral Técnica, Administrativa, Financiera, Contable, Jurídica y Ambiental al Contrato de Obra cuyo Objeto es "Construcción Red de Acueducto y Planta de Tratamiento de Agua Potable para el casco urbano del municipio de Morelia - departamento de Caquetá" | Liquidado | Urbano | 332,343,200 | 0 | 100% | 0% | 3 | 0 | 22/05/2025 |
| Morelia | Realizar la Interventoría, Técnica, Jurídica, Administrativa y Contable del Contrato que tiene por | En Proceso de Liquidación | Urbano | 98.313.249 | 0 | 100% | 0% | 1 | 0 | 28/02/2025 |

| Municipio(s) | Nombre del Proyecto/Actividad | Estado | Ubicación | Valor Contratado | Valor Adiciones | % de Ejecución | Avance Financiero | No de Prorrugas | No de Suspensiones | Fecha de Terminación (Real o Estimado) |
|------------------------|--|--|-----------|------------------|-----------------|----------------|-------------------|-----------------|--------------------|--|
| | objeto: Construcción de Tramos de Alcantarillado en el municipio de Morelia, departamento de Caquetá. | | | | | | | | | |
| Belén de los Andaquíes | Realizar Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental al contrato que tiene por objeto "Reposición del sistema de alcantarillado del Centro Poblado Rural Puerto Torres del municipio de Belén de los Andaquíes-Caquetá" | Liquidado | Rural | 38.297.047 | 0 | 100% | 100% | 0 | 0 | 31/05/2024 |
| Albania | Construcción Tanque de Almacenamiento de Agua Potable para el municipio de Albania. | En ejecución | Urbano | 1.246.013.627 | 126.017.227 | 20% | 0% | 0 | 0 | 14/02/2026 |
| | Realizar la Interventoría Integral, la cual efectuará el seguimiento de los aspectos Contractuales, Técnicos, Administrativos, Financieros, Sociales y Ambientales al contrato de obra cuyo Objeto es: Construcción Tanque de Almacenamiento de Agua Potable para el municipio de Albania | En ejecución | Urbano | 76.524.193 | 0 | 20% | 0% | 0 | 0 | 14/02/2026 |
| Cartagena del Chaira | Construcción de Alcantarillado Pluvial para la Recolección de Aguas Lluvias Provenientes de los barrios Camilo Torres, Villa Chaira y Alonso Gaitán del municipio de Cartagena del Chaira departamento del Caquetá. | En ejecución | Urbano | 1.028.847.022 | 0 | 15% | 0% | 0 | 0 | 02/03/2026 |
| | Interventoría Integral, la cual efectuará el seguimiento de los aspectos Contractuales, Técnicos, Administrativos, Financieros, Sociales y Ambientales al Contrato de Obra cuyo objeto es: Construcción de Alcantarillado Pluvial para la Recolección de Aguas Lluvias provenientes de los barrios Camilo Torres, Villa Chaira y Alonso Gaitán del municipio de Cartagena del Chaira departamento del Caquetá. | En ejecución | Urbano | 83.719.664 | 0 | 15% | 0% | 0 | 0 | 02/03/2026 |
| Curillo | Ejecución de la Obra Civil del proyecto denominado Construcción de Alcantarillado Sanitario entre las Calles 9° al 11° y entre las Carreras del 2° al 4° del municipio de Curillo - Caquetá | Terminado – En proceso de Liquidación | Urbano | 623.928.494 | 0 | 33% | 0% | 0 | 0 | 08/12/2025 |
| | Realizar la Interventoría Integral, la cual efectuará el seguimiento de los aspectos Contractuales, Técnicos, Administrativos, Financieros, Sociales y Ambientales al Contrato de Obra cuyo objeto es: Ejecución de la Obra Civil del proyecto denominado, Construcción de Alcantarillado Sanitario entre las Calles 9° al 11° y entre las Carreras del 2° al 4° del municipio de Curillo – Caquetá | Terminado – En proceso de Liquidación | Urbano | 39.892.021 | 0 | 33% | 0% | 0 | 0 | 08/12/2025 |

| Municipio(s) | Nombre del Proyecto/Actividad | Estado | Ubicación | Valor Contratado | Valor Adiciones | % de Ejecución | Avance Financiero | No de Prorrugas | No de Suspensiones | Fecha de Terminación (Real o Estimado) |
|---------------------|---|--|-----------|------------------|-----------------|----------------|-------------------|-----------------|--------------------|--|
| El Doncello | Reposición de Alcantarillado Sanitario Barrio La Libertad, municipio de El Doncello departamento del Caquetá | Terminado – En proceso de Liquidación | Urbano | 243.849.880 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 20/06/2025 |
| El Doncello | Reposición y Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Pluvial en el barrio Belalcázar Carrera 1 del municipio de El Doncello departamento del Caquetá | Terminado | Urbano | 549.531.859 | 0 | 96% | 0% | 2 | 0 | 31/10/2025 |
| | Realizar la Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera y Jurídica al contrato que tiene por Objeto Reposición y Mejoramiento del Sistema del alcantarillado pluvial en el barrio Belalcázar Carrera 1 del Municipio de El Doncello Departamento del Caquetá | Terminado | Urbano | 39.252.336 | 0 | 100% | 0% | 2 | 0 | 31/10/2025 |
| Florencia | Realizar la Interventoría Integral (Técnica, Administrativa, Financiera, Contable y Jurídica) del Contrato de Consultoría que tiene por objeto: "Estudios y Diseños del Proyecto Construcción Etapa Uno del Colector de Alcantarillado Sanitario sobre la Rivera de La Quebrada La Sardina, municipio de Florencia, departamento de Caquetá | En ejecución | Urbano | 35.000.000 | 0 | 10% | 0% | 0 | 0 | 14/01/2026 |
| Milán | Adecuación y Canalización de Aguas Lluvias en la Calle 4, entre Cra 2 a la Cra 6, del casco urbano de la inspección de San Antonio de Getuchá, en el municipio de Milán, departamento del Caquetá | En ejecución | Urbano | 988.082.242 | 0 | 85% | 0% | 0 | 0 | 21/01/2026 |
| | Realizar la Interventoría Integral, la cual efectuará el seguimiento de los aspectos Contractuales, Técnicos, Administrativos, Financieros, Sociales y Ambientales al Contrato de Obra cuyo objeto es: Adecuación y Canalización de Aguas Lluvias en la Calle 4, entre Cra 2 a la Cra 6, del casco urbano de la inspección de San Antonio de Getuchá, municipio de Milán, departamento del Caquetá. | En ejecución | Urbano | 65.065.757 | 0 | 85% | 0% | 0 | 0 | 21/01/2026 |
| Morelia | Construcción de Tramos de Alcantarillado en el municipio de Morelia, Caquetá | En proceso de liquidación | Urbano | 1.404.474.97 | 0 | 100% | 67.2% | 1 | 0 | 28/02/2025 |
| | Realizar la Interventoría, Técnica, Jurídica, Administrativa y Contable del Contrato que tiene por objeto: Construcción de Tramos de Alcantarillado en el municipio de Morelia, departamento de Caquetá. | En Proceso de Liquidación | Urbano | 98.313.249 | 0 | 100% | 0% | 1 | 0 | 28/02/2025 |
| San José del Fragua | Construcción Celda Disposición Final Relleno Sanitario El Cairo, municipio de San José del Fragua | En Proceso de Liquidación | Urbano | 860.861.678 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 28/10/2025 |

| Municipio(s) | Nombre del Proyecto/Actividad | Estado | Ubicación | Valor Contratado | Valor Adiciones | % de Ejecución | Avance Financiero | No de Prórrogas | No de Suspensiones | Fecha de Terminación (Real o Estimado) |
|--------------|--|---------------------------|-----------|------------------|-----------------|----------------|-------------------|-----------------|--------------------|--|
| | Realizar la Interventoría Integral, la cual efectuará el seguimiento de los aspectos Contractuales, Técnicos, Administrativos, Financieros, Sociales y Ambientales al Contrato de Obra cuyo objeto es: Construcción Celda Disposición Final Relleno Sanitario El Cairo, municipio de San José del Fragua. | En Proceso de Liquidación | Urbano | 68.868.934 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 28/10/2025 |
| Solano | Construcción de Relleno Sanitario y Obras Complementarias en el municipio de Solano, Caquetá Fase 1 | Pendiente de Inicio | Urbano | 860.861.678 | \$0 | 0% | 0% | 0 | 0 | Pendiente de Acta de Inicio |
| | Realizar la interventoría integral, la cual efectuará el seguimiento de los aspectos contractuales, técnicos, administrativos, financieros, sociales y ambientales al contrato de obra cuyo objeto es: "Construcción del relleno sanitario y obras complementarias en el municipio de Solano Departamento del Caquetá Fase 1". | Pendiente de Inicio | Urbano | 84.836.228 | \$0 | 0% | 0% | 0 | 0 | Pendiente de Acta de Inicio |

Proyectos en Proceso de Incumplimiento

| Municipio(s) | Nombre del Proyecto/Actividad | Estado | Ubicación | Valor (Pesos) | % de Ejecución | Fecha de Terminación (Real o Estimado) | Inconveniente Presentado |
|---|---|------------------------------|-----------|--|----------------|--|---|
| Curillo | Construcción de la Celda No. 3 y Obras Complementarias en el Relleno Sanitario para la Disposición Final de los Residuos Sólidos Ordinarios Generados en la cabecera municipal de Curillo | En proceso de incumplimiento | Urbano | \$1.283.948.626 | | | Se solicitó proceso de presunto incumplimiento. Pendiente de programación de audiencia por parte del despacho jurídico de la Gobernación del Caquetá. |
| Curillo | Interventoría Integral (Técnica, Administrativa, Contable, Jurídica y Ambiental) al contrato de obra que tiene por objeto: "Construcción de la Celda No. 3 y Obras Complementarias en el Relleno Sanitario para la Disposición Final de los Residuos Sólidos Ordinarios Generados en la cabecera municipal de Curillo | En proceso de incumplimiento | Urbano | \$ 102.715.890,0 | | | Se solicitó proceso de presunto incumplimiento. Pendiente de programación de audiencia por parte del despacho jurídico de la Gobernación del Caquetá. |
| Curillo, Albania, Belén de los Andaquíes y Cartagena del Chairá | Estudios de Factibilidad y Diseños para la Optimización del Sistema de Alcantarillado, Manejo de Aguas Lluvias y Diseño del Sistema de Tratamiento para Aguas Residuales Domésticas para el Casco Urbano de los municipios de Curillo, Albania, Belén de los Andaquíes y Cartagena del Chairá | Liquidado | Urbano | Consultoría \$1.463.702.701 Interventoría \$102.459.190,0 | 93,24% | 24/7/2023 | Mediante resoluciones 000187 del 07/02/2025 y 000698 del 14/04/2025 emitidas por el departamento jurídico de la Gobernación del Caquetá se declaró que los contratistas de consultoría e interventoría no incumplieron, los contratos de consultoría e interventoría se encuentran liquidados y pagados |
| Milán, Morelia, San José del Fragua, Solano y Valparaiso | Realizar la Interventoría Técnica, Administrativa y Financiera a la Consultoría de Estudios y Diseños de Proyectos en el Marco del Programa Agua para la Prosperidad - Plan Departamental de Agua del Caquetá. | Liquidado | Urbano | 70'234.519.0 | | | |




6. COMPONENTE AMBIENTAL Y GESTIÓN DEL RIESGO.

Durante el período comprendido entre noviembre y diciembre de 2019, se avanzó significativamente en la ejecución y supervisión de proyectos estratégicos de agua potable, alcantarillado sanitario, manejo de aguas lluvias y gestión de residuos sólidos en municipios


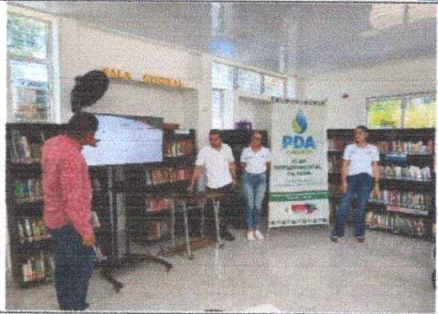


7. COMPONENTE SOCIAL



Durante el período evaluado, el Componente Social del Plan Departamental de Agua del Caquetá llevó a cabo las siguientes actividades:

| CAPACITACIONES EN SANEAMIENTO BÁSICO Y AGUA POTABLE | | | |
|---|----------|--|---|
| DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD | PROYECTO | PARTICIPANTES | EVIDENCIA FOTOGRÁFICA |
| <p>Capacitación sobre Ahorro y Uso Eficiente del Agua, orientado a estudiantes de las Instituciones Educativas del departamento.</p> | | <ul style="list-style-type: none"> • Caseta Comunal ETC Agua bonita – Municipio de Montañita • Comunidad Municipio de Morelia – Caquetá • Institución Educativa Rural Juan XXIII - Morelia • Comunidad Municipio de Albania – Caquetá • Resguardo Indígena Agua Negra – Municipio de Milán • Institución Educativa Rural Platanillo • Casa a casa Municipio de Montañita – Caquetá. |    |

SOCIALIZACION PROYECTOS POR EJECUTAR DEL PDA –CAQUETA

| DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD | PROYECTO | PARTICIPANTES | EVIDENCIA FOTOGRÁFICA |
|---|---|---|--|
| Socialización o reuniones de los proyectos por ejecutar del PDA Caquetá con la comunidad y autoridades del orden Departamental y Municipal. | Socialización inicial Proyecto cuyo objeto es: "OPTIMIZACION DE LAS REDES DE DISTRIBUCION DE ALCANTARILLADO URBANO EN EL MUNICIPIO DE ALBANIA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETA" | Empresa de Servicios Públicos, Alcaldía Municipal, Comunidad de Albania |   |




SEGUIMIENTO A LOS CLUB DEFENSORES DEL AGUA


| DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD | PROYECTO | PARTICIPANTES | EVIDENCIA FOTOGRÁFICA |
|--|----------|--|--|
| Seguimiento a Club Defensores del Agua Conformados | | <ul style="list-style-type: none"> • Institución Educativa Rural Juan XXIII – Morelia • Institución Educativa Rural Bajo Caldas – Florencia • Institución Educativa Internado Escolar Rural Solita – Solita • Institución Educativa Omar Gómez Chávez – Valparaíso • Institución Educativa Rural Platanillo – Sede el Vergel Club Defensor del Agua Biolndy • Institución Educativa Rural La Concordia Sede Galicia #2 - Club Defensor del Agua CONDORDISTA • Institución Educativa Los Pinos Club Defensor del Agua PINISTAS • Institución Educativa Albania • : Institución Educativa Agroecológico Amazónico |   |


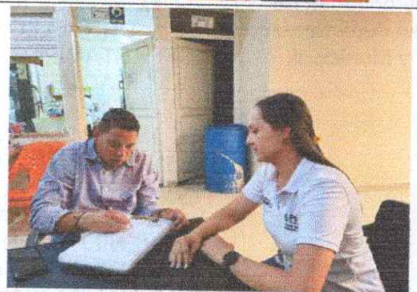

- Institución Educativa Corazón Inmaculado de María
- Institución Educativa Rural Arenoso – Sede Santa Marta / San Vicente del Caguán



SEGUIMIENTO VEEDURIAS PROYECTOS EN EJECUCION


| DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD | PROYECTO | PARTICIPANTES | EVIDENCIA FOTOGRÁFICA |
|--|---|--|--|
| Seguimiento con las veedurías a los proyectos en ejecución del PDA Caquetá con la comunidad y autoridades del orden departamental y Municipal. | “CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO ENTRE LAS CALLES 9ª Y 11ª Y ENTRE LAS CARRERAS 2ª Y 4ª DEL MUNICIPIO DE CURILLO – CAQUETÁ”. | |  |
| | “CONSTRUCCIÓN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL MUNICIPIO DE ALBANIA” | Carmen Amparo Ramírez José Alberto Chaverra Julián Andrés Delgado Ana Paola Sierra |  |
| | REPOSICION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL BARRIO BELALCAZAR CARRERA 1 DEL MUNICIPIO DE DONCELLO DEPARTAMENTO DEL CAQUETA. | Johanna Calderón Rosario Ortiz Arnulfo Samboni Ana Paola Sierra |  |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | |  |
|--|--|--|---|

| SEGUIMIENTO CDCS – E.S.P. | | | |
|--|--|---|--|
| DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD | PROYECTO | PARTICIPANTES | EVIDENCIA FOTOGRÁFICA |
| <p>Seguimiento y acompañamiento a los diferentes comités de control social relacionados al sector de agua potable y saneamiento básico</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Empresas de Servicios Públicos AGUAS DEL FRAGUA S.A ESP • VOCAL - EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS EMSERPUCAR • VOCAL DE CONTROL DE SERVICIOS PUBLICOS - MORELIA | <p>Juan Pablo Gonzales Ana Paola Sierra P Martha Cecilia Cuellar Tatiana Jara</p> |    |

SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN A LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL EN OBRA

| DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD | PROYECTO | PARTICIPANTES | EVIDENCIA FOTOGRÁFICA |
|---|--|--|--|
| <p>Seguimiento y verificación a la ejecución del Plan de Gestión Social en obra</p> | <p>"Construcción de Alcantarillado Sanitario entre las Calles 9ª y 11ª y entre las Carreras 2ª y 4ª del municipio de Curillo – Caquetá".</p> | |  |
| | <p>"Construcción Tanque de Almacenamiento de Agua Potable para el municipio de Albania" en el municipio de Albania-Caquetá"</p> | |  |
| | <p>"Reposición y Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Pluvial en el Barrio Belalcázar Carrera 1 del municipio de El Doncello departamento del Caquetá,"</p> | <p>Ana Paola Sierra Tatiana Jara</p> |  |
| | <p>Mejoramiento de la Calidad de Vida de la Población Vulnerable de Florencia en el departamento del Caquetá, a través de la Ampliación del Sistema de Acueducto para los barrios: Villa Clara, Nápoles, Villa Real y El Timmy de Florencia – Caquetá</p> <p>"Construcción de Alcantarillado Pluvial para la Recolección de Aguas Lluvias Provenientes de los barrios Camilo Torres, Villa Chaira y Alonso Gaitán del Municipio de Cartagena del Chaira departamento del Caquetá."</p> | <p>Martha Cuellar</p> |  |

| CAPACITACION EN CAMBIO CLIMATICO - MEDIO AMBIENTE | | | |
|--|---|--|--|
| DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD | PROYECTO | PARTICIPANTES | EVIDENCIA FOTOGRÁFICA |
| Capacitación y/o taller en cuidado del ambiente, reducción del cambio climático, efecto invernadero, usos de energía limpia y renovable. | Campaña de Sensibilización Estrategias; Uso Eficiente y Ahorro del Agua – Buen Uso del Alcantarillado y Manejo Integral de Residuos Sólidos | <ul style="list-style-type: none"> Casa a Casa Comunidad La Montañita - Caquetá |  |

| NOTAS INFORMATIVAS | | | |
|--------------------------|---|---|---|
| DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD | PROYECTO | PARTICIPANTES | EVIDENCIA FOTOGRÁFICA |
| NOTAS INFORMATIVAS | <ul style="list-style-type: none"> Estudiantes de Albania inician creación de huerta escolar Titulo Nota - Cierre de actividades 2025 del Club Defensor del Agua "Guardianes de Agua" Cierre de actividades 2025 del Club Defensor del Agua "Escuadrón Hidráulico" Cierre de actividades 2025 del Club Defensor del Agua "Cuidadores del Agua", "Cosechando Saber y Bienestar" La huerta escolar como espacio educativo en adquisición de conocimientos en diferentes áreas, nutrición y trabajo en equipo | <ul style="list-style-type: none"> Institución Educativa Albania Institución Educativa Rural Bajo Caldas – Florencia Institución Educativa Omar Gómez Chávez – Valparaíso Institución Educativa Internado Escolar Rural Solita - Solita Institución Educativa Rural Juan XXIII - Morelia |  |

8. INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LOS COSTOS DEL GESTOR.

Al verificar el avance en el desarrollo de las actividades acumuladas a 31 de diciembre de 2025, se tiene que los Costos del Gestor, muestran un importante avance en el cumplimiento de las metas, evidenciándose que cada uno de los componentes cumplió con la ejecución en el cumplimiento de las metas.

Realizando el seguimiento en la evolución de los Costos del Gestor 2025, encontramos la siguiente información acumulada:

| COMPONENTE | NOVIEMBRE | | | DICIEMBRE | | | CUMPLIMIENTO PDA CAQUETA | | |
|--------------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|-------------------|--------------------------|--------------|-------------------|
| | Planeado | Entregado | % de Cumplimiento | Planeado | Entregado | % de Cumplimiento | Planeado | Entregado | % de Cumplimiento |
| ADMINISTRATIVA | 107 | 160 | 81,25% | 121 | 159 | 85,71% | 1.141 | 1.468 | 93,18% |
| AMBIENTAL | 8 | 11 | 79,17% | 3 | 9 | 100,00% | 164 | 215 | 100,00% |
| ASEGURAMIENTO | 12 | 10 | 37,50% | 12 | 8 | 41,67% | 150 | 150 | 93,75% |
| FINANCIERA | 23 | 29 | 75,00% | 23 | 29 | 50,00% | 263 | 346 | 93,45% |
| INFRAESTRUCTURA | 10 | 18 | 75,00% | 9 | 13 | 75,00% | 106 | 206 | 100,00% |
| JURIDICA | 6 | 9 | 100,00% | 19 | 25 | 52,78% | 262 | 289 | 87,66% |
| PLANEACION | 7 | 5 | 80,00% | 9 | 10 | 93,75% | 56 | 62 | 96,67% |
| SOCIAL | 35 | 54 | 100,00% | 31 | 35 | 76,30% | 406 | 545 | 98,63% |
| PDA CAQUETA | 208 | 296 | 78,49% | 227 | 288 | 71,90% | 2.548 | 3.281 | 95,42% |

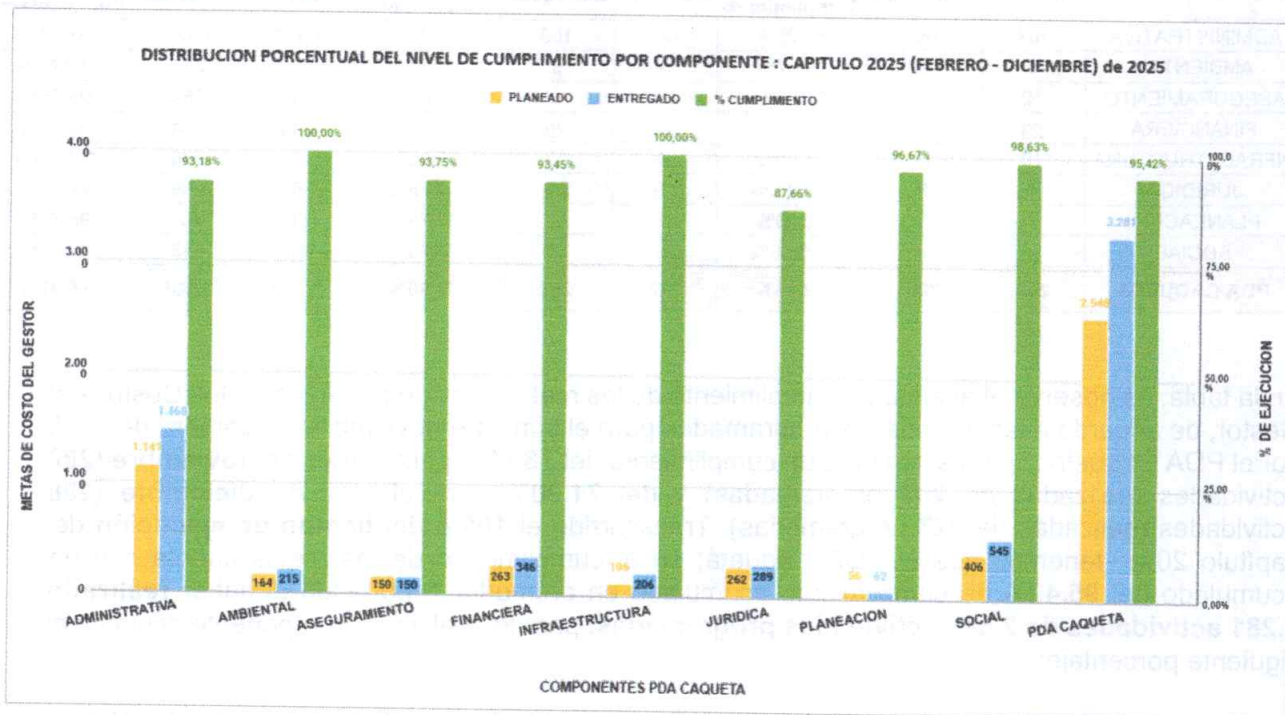
En la tabla, se observa el avance de cumplimiento de las metas por componentes de los Costos del Gestor, de acuerdo a las actividades programadas para el bimestre noviembre - diciembre de 2025 por el PDA Caquetá. Se ha alcanzado un cumplimiento del **78.49%** para el mes de **noviembre** (296 actividades realizadas de 208 programadas) y del **71.90%** para el mes de **diciembre** (288 actividades realizadas de 227 programadas). Transcurrido el **100% del tiempo de ejecución** del capítulo 2025; tenemos que el PDA Caquetá; en el cumplimiento de las metas cuenta con un acumulado del **95.42%** de cumplimiento acumulado en promedio, reportando el haber **realizado 3.281 actividades de 2.548 actividades programadas**; para lo cual, cada componente acumula la siguiente porcentaje:

- Con un **93.18%** de cumplimiento tenemos al **Componente Administrativo**, reportando el haber entregado **1.466** actividades de **1.141** actividades planeadas.
- Con un **100%** de cumplimiento tenemos al **Componente Ambiental**, reportando el haber entregado **215** actividades de **164** actividades planeadas.
- Con el **93.75%** de cumplimiento tenemos al **Componente de Aseguramiento**, reportando el haber entregado **150** actividades de **150** actividades planeadas.
- Con un **93.45%** de cumplimiento tenemos al **Componente de Financiero**, reportando el haber entregado **346** actividades de **263** actividades planeadas.
- Con el **100%** de cumplimiento tenemos al **Componente de Infraestructura**, reportando el haber entregado **206** actividades de **106** actividades planeadas.

- Con el **87.66%** de cumplimiento tenemos al **Componente Jurídica**, reportando el haber entregado **289** actividades de **262** actividades planeadas.
- Con un **96.67%** de cumplimiento tenemos al **Componente de Planeación**, reportando el haber entregado **62** actividades de **56** actividades planeadas.
- Con el **98.63%** de cumplimiento tenemos al **Componente Social**, reportando el haber entregado **545** actividades de **406** actividades planeadas.




Aunque, algunos componentes han realizado más actividades de las programadas, no han alcanzado el 100% de cumplimiento, debido a que, en algunos ítems de actividades, no lograron el cumplimiento del 100% en las actividades que fueron programadas.

En la siguiente gráfica, podemos observar, como es el comportamiento de los componentes del PDA Caquetá, en el cumplimiento de las metas, para el periodo agosto de 2025.



En la gráfica, se presentan los componentes del PDA Caquetá y el nivel de cumplimiento. De color amarillo, se observa la cantidad de actividades planeadas, de color azul se observa la cantidad de actividades entregadas y en color verde se observa el porcentaje del nivel de cumplimiento. Las tres barras finales, se observa el total consolidado del PDA Caquetá, reportando un porcentaje del **95.42% de cumplimiento**, en el desarrollo de las metas.

El **95.42% de cumplimiento en promedio**, reportado por los Costos del Gestor, permite evidenciar un nivel **ALTO de cumplimiento**, frente al logro de los objetivos y acerca de las actividades que está desarrollando el PDA Caquetá, en su incidencia en la población del departamento del Caquetá,





| | | |
|---|---|--|
|  | <p align="center">DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ</p> |  |
|  | <p align="center">Informe de Seguimiento del PEI</p> | <p align="right">Versión 1.0 17/01/2020</p> |


promoviendo la política de los **Planes Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento (PDA)**, definidos en el Decreto 1425 de 2019; se está cumpliendo de manera satisfactoria, manifestándose en el mejoramiento de la calidad de vida de los caqueteños.

Florencia, diciembre de 2025.



NIDIA CAROLINA TAMAYO BUITRAGO
Secretaria de Infraestructura
Gestora del PDA

Vo.Bo. Yudy Narley García Rojas – Coordinadora PDA 
Vo.Bo. Ing. Lina Ortiz-Componente Ambiental y de Gestión del Riesgo 
Vo.Bo. Yenny Camelo-Componente Financiero
Vo.Bo. Ing. Neiser Andrés Castro Triviño-Componente Técnico 
Estructuró / Diagramó: E. Orlando Parra C. /Apoyo Gestor PDA 

Vo.Bo. Ing Salomón González-Componente Aseguramiento 
Vo.Bo. Ana Paola Sierra Pinillos-Componente Social 
