

 	DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ	 COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA
	Informe de Seguimiento del PEI	Versión 1.0 17/01/2020

Informe de Seguimiento al Plan Estratégico de Inversiones – PEI

Fecha de inicio periodo informe: **01 de enero de 2025**
Fecha de terminación periodo informe: **28 de febrero de 2025**
No. Informe **1**

Justificación

De acuerdo con el Decreto 1425 de 2019, Artículo 2.3.3.1.2.3. Funciones del Gestor, Numeral 14.2. **“Informe bimestral (noviembre - diciembre de 2024)** de la ejecución y seguimiento del Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento y de sus instrumentos de planeación, de acuerdo con el formato y medios que el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio determine para tal fin. En el informe también se señalará el avance del Plan Estratégico de Inversiones, detallando el cumplimiento de los **cronogramas** allí fijados, las **metas** propuestas, el **estado de avance de los proyectos en ejecución** y de los **procesos de contratación**”, el Gestor, presenta el siguiente informe a los **Miembros del Comité Directivo del PDA del departamento del Caquetá**.

De conformidad al Decreto 1425 de 2019, Artículo 2.3.3.1.5.3 ítems 6.6 Párrafo Tercero, establece *“La vigencia del Plan Estratégico de Inversiones (PEI) será la misma del periodo de gobierno de las entidades territoriales y del capítulo anual será hasta el 31 de diciembre del año de aprobación”*; Por lo tanto, el PEI 2024-2027, se encuentra en proceso de formulación, conforme lo establece el Decreto en mención.

Es importante mencionar que en razón a las modificaciones realizadas por el MVCT a la metodología de estructuración del PEI 2024 - 2027, se ha presentado el siguiente desarrollo: **1-** Se presenta el cierre financiero del Capítulo 2024. **2 -** En Comité Directivo en sesión virtual No. 57 del 5 de febrero de 2025, se asignan recursos para el Capítulo 2025. **3 –** Se asignan recursos a costos del gestor por \$1.800.000.000 capítulo 2025

Informe de Avance del PEI 2024-2027-Capítulo 2024.

Conforme a lo antes expuesto, se procede a presentar el estado de lo aprobado en Comité Directivo en sesión virtual No. 57 del 5 de febrero de 2025:

Acta Comité Directivo No. 57

	DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ	
	Acta de Comité Directivo del PDA	Versión 1.0 10/12/2021

SESIÓN VIRTUAL COMITÉ DIRECTIVO No. 57 PDA CAQUETÁ

Fecha de inicio: 04 de febrero de 2025
 Fecha de terminación: 05 de febrero de 2025
 Sesión: Modalidad Virtual

MIEMBROS DEL COMITÉ DIRECTIVO

Entidad	Representante
Gobernación de Caquetá Presidente del Comité	Leidy Julieta López González Secretaría Delegada con Funciones Administrativas de Gobernador del Departamento de Caquetá y en calidad de Presidente del Comité Directivo del Plan Departamental de Agua PDA Caquetá, Decreto No. 0000100 del 03/02/2025
Delegado Gobernación de Caquetá	Diego Felipe Pinto Díaz Secretario de Planeación
Subdirector de Programas del Viceministerio de Agua y Saneamiento MVCT	Julio Cuesta Olave
Subdirectora de Agua y Saneamiento, Departamento Nacional de Planeación	Natasha Valentina Garzón Yepes
Municipio de Florencia, Acta de delegados Asociación de Municipios del Caquetá AMDELCA	Marlón Monsalve Ascanio
Municipio de Morelia, Acta de delegados Asociación de Municipios del Caquetá AMDELCA	Carlos Fernando Trujillo Dulcey Alcalde
Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia - Corpomazonia	Lorenzo Andrés Vargas Gutiérrez
Consortio FIA	Carlos Andrés Amaya Otalora - Director PDA

SECRETARÍA TÉCNICA DEL COMITÉ DIRECTIVO

Gestor	Ingeniero Herley Suarez Cuellar
--------	---------------------------------

DESARROLLO

1. Convocatoria

El Gestor del Plan Departamental de Agua PDA del departamento de Caquetá, mediante correo electrónico del día 30 de enero de 2025 con oficio radicado No. 0332, convocó a sesión de Comité Directivo No. 57 del PDA Caquetá, modalidad (Virtual), a todos los miembros del Comité Directivo.

2. Verificación del quórum

Carrera 13 Calle 15 Esquina - Teléfono: (05) 4305340
www.caquetá.gov.co - infraestructura@caquetá.gov.co

	DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ	
	Acta de Comité Directivo del PDA	Versión 1.0 10/12/2021

Los documentos aprobados anexados a la convocatoria, el Decreto No. 0000100 del 03/02/2025 de la Gobernación de Caquetá y los votos allegados en la sesión a Comité Directivo No. 57 hacen parte integral de la presente Acta.

NOTA: De acuerdo al correo enviado por parte de la Secretaría Técnica del Comité Directivo del PDA, la sesión de Comité Directivo Modalidad Virtual No. 57 del PDA Caquetá, fue prorrogada hasta el día miércoles 05 de febrero de 2025.

La presente acta se firma en la ciudad de Florencia Departamento de Caquetá, a los cinco (05) días del mes de febrero de 2025.

Atentamente,


LEIDY JULIETA LÓPEZ GONZÁLEZ
 Secretaria Delegada con Funciones Administrativas de Gobernador del Departamento de Caquetá
 Decreto No. 0000100 del 03/02/2025


HERLEY SUAREZ CUELLAR
 Secretario de Infraestructura - Gestor PDA
 Secretaría Técnica Comité Directivo
 Plan Departamental de Agua de Caquetá

Revisó: Yudy Nerley Rojas/Contratista Coordinadora - Unidad Gestora PDA Caquetá
 Proyecto: Blanca Flor Canavesi Becerra/Revisó
 Contratista Componente Administrativo - Unidad Gestora PDA Caquetá
 Revisó: Yenny Carolina Carneio Martínez/Revisó
 Contratista Componente de Financiero - Planeación - Unidad Gestora PDA Caquetá

Carrera 13 Calle 15 Esquina - Teléfono: (05) 4305340
www.caquetá.gov.co - infraestructura@caquetá.gov.co
 Florencia - Caquetá - Colombia
 Página 39 de 59

2. Informe Financiero Periodo enero - febrero 2025.

2.1. Aportes del bimestre noviembre – diciembre 2024.

En el Seguimiento a los recursos enmarcados en el plan departamental de agua, con respecto a los Aportes del Sistema de Participaciones para Agua Potable y Saneamiento Básico (SGP-APSB):

DEPARTAMENTO MUNICIPIO	RECAUDO VIGENCIA 2024
DEPARTAMENTO	00.00
ALBANIA	00.00
BELÉN DE LOS ANDAQUIES	00.00
CARTAGENA DEL CHAIRA	00.00
CURILLO	00.00
EL DONCELLO	00.00
EL PAUJIL	00.00
FLORENCIA	00.00

LA MONTAÑITA	00.00
MILAN	00.00
MORELIA	00.00
PUERTO RICO	00.00
SAN JOSE DEL FRAGUA	00.00
SAN VICENTE DEL CAGUAN	00.00
SOLANO	00.00
SOLITA	00.00
VALPARAISO	00.00

(Componente Financiero PEI, 2025 – PDA Caquetá)

2.2. Informe de Rendimientos Financieros periodo enero – febrero 2025.

El Patrimonio Autónomo FIA, encargado de gestionar, administrar y reportar la asignación de rendimientos Financieros a cada Fideicomitente, Directo o Indirecto, de conformidad con las políticas establecidas para tal fin, reporta informes para el mes de enero y febrero del 2025, de la siguiente manera:

DPTO/MUNICIPIO	ENERO 2025	FEBRERO 2025
DEPARTAMENTO SGP APSB	156.062.290,51	131.800.686,24
DEPARTAMENTO NACION	29.865.967,77	24.219.058,06
DEPARTAMENTO PROPIOS	12.704.206,37	10.995.929,08
ALBANIA	9.038.827,78	7.699.364,04
BELEN /ANDAQUIES	5.359.244,89	4.639.327,85
CARTAGENA DEL CHAIRA	12.981.830,65	11.791.946,17
CURILLO	5.736.777,94	4.965.832,09
EL DONCELLO	4.374.532,12	3.786.685,57
EL PAUJIL	808.510,54	700.138,94
FLORENCIA	27.248.596,23	23.971.911,06
LA MONTAÑITA	4.883.451,32	4.679.273,60
MILAN	4.701.049,39	4.069.418,23
MORELIA SGP APSB	8.779.701,44	6.098.973,58
MORELIA PROPIOS	1.228.856,15	1.063.627,37
PUERTO RICO	7.792.032,36	6.744.466,19
SAN JOSE DEL FRAGUA	4.550.073,62	3.938.302,20
SAN VICENTE DEL CAGUÁN	4.043.371,65	3.943.070,06
SOLANO	28.164.066,27	24.378.267,02
SOLITA	6.882.459,88	5.957.489,77
VALPARAISO	7.545.559,80	6.531.855,41
TOTAL	342.751.406,68	291.975.622,53

(Componente Financiero PEI, 2025 – PDA Caquetá)

	DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ	
	Informe de Seguimiento del PEI	Versión 1.0 17/01/2020

2.3. CDRs Emitidos durante la vigencia 2025

DESCRIPCION EMPRESA	NUMERO DE CDR	TIPO DE GASTO	CONCEPTO GASTO	VALOR FINAL CDR
CAQUETA	17966	PRE-INVERSION	INFRAESTRUCTURA	\$300.000.000,00
SOLANO	17967	PRE-INVERSION	INFRAESTRUCTURA	\$255.555.556,00
SOLANO	17968	INTERVENTORIA	INTERVENTORIA	\$44.444.444,00
CAQUETA	17969	PRE-INVERSION	INFRAESTRUCTURA	\$165.000.000,00
FLORENCIA	17970	PRE-INVERSION	INFRAESTRUCTURA	\$300.000.000,00
CAQUETA	17971	INTERVENTORIA	INTERVENTORIA	\$35.000.000,00
CAQUETA	17972	INVERSION	INFRAESTRUCTURA	\$550.869.752,26
PUERTO RICO	17973	INVERSION	INFRAESTRUCTURA	\$50.649.423,74
CAQUETA	17974	INTERVENTORIA	INTERVENTORIA	\$49.130.247,74
PUERTO RICO	17975	INTERVENTORIA	INTERVENTORIA	\$4.517.254,26
CAQUETA	17976	INVERSION	INFRAESTRUCTURA	\$1.516.315.956,78
ALBANIA	17977	INVERSION	INFRAESTRUCTURA	\$272.255.472,22
CAQUETA	17978	INTERVENTORIA	INTERVENTORIA	\$89.428.571,00
CAQUETA	17979	INVERSION	INFRAESTRUCTURA	\$1.679.610.716,00
MORELIA	17980	INVERSION	INFRAESTRUCTURA	\$40.000.000,00
CAQUETA	17981	INTERVENTORIA	INTERVENTORIA	\$120.372.750,00
CAQUETA	17994	INVERSION	AMBIENTAL	\$800.000.000,00
SAN VICENTE DEL CAGUAN	17995	INVERSION	AMBIENTAL	\$175.673.225,00
CAQUETA	18037	ESTRUCTURA OPERATIVA	ASEGURAMIENTO	\$1.800.000.000,00
CAQUETA	18038	OTROS	AMBIENTAL	\$200.000.000,00
SAN JOSE DE LA FRAGUA	18039	OTROS	AMBIENTAL	\$30.000.000,00
CAQUETA	18047	PRE-INVERSION	AMBIENTAL	\$150.000.000,00
CAQUETA	18052	INVERSION	GESTION DEL RIESGO SECTORIAL	\$427.909.407,00
LA MONTAÑITA	18053	INVERSION	GESTION DEL RIESGO SECTORIAL	\$479.498.000,00
CAQUETA	18054	INTERVENTORIA	INTERVENTORIA	\$72.592.593,00
CAQUETA	18057	PRE-INVERSION	AMBIENTAL	\$200.000.000,00
CARTAGENA DEL CHAIRA	18058	PRE-INVERSION	AMBIENTAL	\$100.000.000,00

(Componente Financiero PEI, 2025 – PDA Caquetá)

3 COMPONENTE DE ASEGURAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

Los municipios del Departamento del Caquetá participan en el PDA mediante un convenio tripartito de vinculación suscrito entre el Departamento, el municipio y el Gestor del PDA, el cual se hace partícipe al Programa del Gobierno Nacional, donde se compromete a implementar el instrumento para el manejo de recursos, el esquema institucional que se defina en desarrollo del mismo, y tomar las decisiones que resulten necesarias en relación con la infraestructura y los bienes afectos a la prestación de los servicios de Agua Potable y Saneamiento Básico. En consecuencia, los municipios deben suscribir un Otrosí al Convenio inicial, toda vez que para cada vigencia fiscal y con base en el principio de anualidad, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT) tramita por solicitud del representante legal de las diferentes Entidades Territoriales, el giro directo de los recursos del Sistema General de Participaciones del sector de agua potable y saneamiento básico (SGP-APSB) por concepto de aporte al PDA al esquema fiduciario CONSORCIO FIA, constituido

CP

para tal efecto. Con el fin de acceder a la financiación de recursos del orden nacional como departamental direccionados a proyectos en el sector que beneficien al desarrollo de las comunidades.

3.1. MUNICIPIOS CON FIRMA DE OTROSÍ Y MODIFICACIONES Y/O AUTORIZACIONES DE LOS RECURSOS DEL SGP-APSB CON DESTINO A INVERSIÓN AL PDA.

A continuación, se relacionan los dieciséis (16) municipios que conforman el departamento del Caquetá y que se encuentran vinculados al PDA Caquetá mediante convenio suscrito entre el Departamento, el municipio y el Gestor. Dichos entes territoriales reúnen los requisitos contemplados en el Decreto 1077 de 2015.

RELACIÓN OTROSI 2020-2024 PDA CAQUETÁ		
MUNICIPIO	FECHA OTROSÍ 2024	ESTADO ACTUALIZACIÓN OTROSÍ 2024
Albania	N°11 - 28/08/2024	PENDIENTE TRANSFERENCIA
Belén de los Andaquíes	N°. 10 - 18/10/2024	TRANSFERENCIA REALIZADA
Cartagena del Chairá	N°. 12 - 18/12/2024	PENDIENTE TRANSFERENCIA
Curillo	N°. 12 - 26/09/2024	TRANSFERENCIA REALIZADA
El Doncello	N°. 9 - 18/10/2024	TRANSFERENCIA REALIZADA
El Paujil	N°. 10 diciembre	EN FIRMAS DEL MUNICIPIO
Florencia	Pendiente	PENDIENTE REMISIÓN DUCUMENTOS PARA OTROSI 2024.
La Montañita	De Aportes N°. 12 - 07/10/2022 de prorroga N°. 14 de 28/12/2023	PENDIENTE REMISIÓN DUCUMENTOS PARA OTROSI 2024 CON APORTES DEFINIDOS
Milán	N°. 11 - 18/10/2024	TRANSFERENCIA REALIZADA
Morelia	N°. 12 - 26/09/2024	PENDIENTE TRANSFERENCIA
Puerto Rico (Saldo a Favor)	N°. 9 - 26/9/2024	TRANSFERENCIA REALIZADA
San José del Fragua	N°. 12 - 26/9/2024	TRANSFERENCIA REALIZADA
San Vicente del Caguán	N°. 9 - 11/12/2024	PENDIENTE TRANSFERENCIA
Solano	N°. 7 - Diciembre	EN FIRMAS DEL MUNICIPIO
Solita (Saldo a Favor)	N°. 8 - 28/08/2024	TRANSFERENCIA REALIZADA
Valparaíso	N°. 9 - 29/10/2024	TRANSFERENCIA REALIZADA

3.2. AUTORIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE GIRO DIRECTO DE LOS RECURSOS DEL SGP - APSB COMPROMETIDOS POR LOS MUNICIPIOS AL PDA CAQUETÁ

La modificación a la Autorización para Beneficiarios del Giro Directo de los Recursos del Sistema General de Participaciones para Agua Potable y Saneamiento Básico (SGP-APSB), se perfecciona a partir de la radicación y aprobación de la documentación correspondiente ante el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, la cual se evidencia a partir del giro de los recursos al Patrimonio Autónomo FIA.

Así las cosas, el proceso de proyección y afectación mensual de la Autorización de giro de los recursos comprometidos para la presente vigencia fue realizada por los municipios de Curillo, Belén de los Andaquíes, El Doncello, Milán, Puerto Rico, San José del Fragua y Solita y Valparaíso

	DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ	
	Informe de Seguimiento del PEI	Versión 1.0 17/01/2020

ya remitidos al FIA para formalización del proceso. Los municipios de Albania, Cartagena del Chaira, El Doncello, Morelia y San Vicente del Caguán, El Paujil y Solano están pendientes de la transferencia.

Finalmente, los municipios de Florencia y La Montañita a pesar de tener acuerdo de aportes, aún se encuentran pendientes de remitir los soportes necesarios para continuar con la suscripción de los otros ítems para la presente vigencia.

3.3. EL PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA - PDA REALIZA MESAS DE TRABAJO CON LOS ACTORES VINCULADOS PARA CONCERTAR LAS NECESIDADES PARA EL SECTOR APSB ANUALIDAD 2024 Y PROYECCIÓN A 2027.

El Gestor y Coordinador del Plan Departamental de Agua y su equipo de trabajo dan continuidad al proceso de concertación de necesidades en el sector de Agua Potable y Saneamiento Básico - APSB con los diferentes mandatarios de los municipios vinculados. Se realizó socialización de los avances obtenidos en las vigencias anteriores con los convenios tripartitos, la ejecución de los recursos y el impacto en los indicadores de línea base. Revisando y actualizando los Planes de Acción municipales donde se propone el financiamiento de proyectos en pro de mejorar las condiciones y calidad de vida de las comunidades del Departamento.

3.3.1. SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE ACCIÓN MUNICIPAL

En este periodo se concertaron necesidades en el sector de Agua Potable y Saneamiento Básico con los municipios vinculados al PDA para las vigencias 2024-2027, definiendo las posibles fuentes de financiación de proyectos entre el Gestor y el municipio.

MUNICIPIO	VIGENCIA	PROYECTO	VALOR TOTAL	APORT MUNICIPIO	APORTE DEPARTAMENTO
ALBANIA	2024	Construcción del Tanque de almacenamiento en el municipio de Albania, Departamento de Caquetá.	1.324.561.409,00	771.000.000,00	553.561.409,00
ALBANIA	2024	Optimización de las redes de distribución de alcantarillado urbano en el municipio de Albania, departamento del Caquetá	1.878.000.000,00	272.255.472,22	1.605.744.527,78
ALBANIA	2026	Adecuación de la línea de conducción del acueducto municipal del casco urbano, cambiar tubería de asbesto cemento a PVC	245.000.000,00	245.000.000,00	0,00
ALBANIA	2027	Ampliación de red de distribución acueducto Centro poblado El Paraíso - "Agua a la Vereda"	550.000.000,00	275.000.000,00	275.000.000,00
BELEN DE LOS ANDAQUIES	2024	Canalización de 300 metros de aguas residuales del Caño San Francisco del municipio de Belén de los Andaquies	1.840.595.681,50	400.000.000,00	1.440.595.681,50
BELEN DE LOS ANDAQUIES	2025	Reposición de alcantarillado en el casco urbano municipio de Belén de los Andaquies	373.909.787,62	373.909.787,62	
BELEN DE LOS ANDAQUIES	2026	AHORRO PARA PROYECTO DE 2027	0,00	0,00	0,00
BELEN DE LOS ANDAQUIES	2027	Construcción de sistemas de tratamiento de aguas residuales en los centros poblados del municipio	1.306.628.212,23	666.628.212,23	640.000.000,00
CARTAGENA DEL CHAIRA	2024	Construcción de alcantarillado pluvial para recolección de aguas lluvias provenientes de los barrios Camilo Torres, Villa Chaira Y Gaitán del	1.129.913.510,00	1.000.000.000,00	129.913.510,00

MUNICIPIO	VIGENCIA	PROYECTO	VALOR TOTAL	APORT MUNICIPIO	APORTE DEPARTAMENTO
		municipio de Cartagena del Chairá Departamento del Caquetá.			
CARTAGENA DEL CHAIRA	2025	Construcción de muro de Contención para la reducción del riesgo en el área de Captación de Agua sobre el Río Caguán, Fuente Abastecedora del Sistema de Acueducto en la Cabecera Municipal de Cartagena del Chairá, Departamento de Caquetá	644.613.510,00	214.700.000,00	429.913.510,00
CARTAGENA DEL CHAIRA	2025	Elaboración de estudios ambientales para el trámite de la licencia ambiental del proyecto "construcción del relleno sanitario y obras complementarias en el municipio de Cartagena del Chairá departamento de Caquetá"	300.000.000,00	100.000.000,00	200.000.000,00
CARTAGENA DEL CHAIRA	2026	Construcción del relleno sanitario y obras complementarias en el municipio de Cartagena del Chaira Departamento de Caquetá.	1.114.700.000,00	214.700.000,00	900.000.000,00
CARTAGENA DEL CHAIRA	2027	Optimización del sistema de captación del agua cruda sobre el río Caguán, para abastecer el sistema de acueducto del municipio de Cartagena del Chaira	1.425.464.475,74	1.025.717.050,24	399.747.425,50
CURILLO	2024	Construcción de alcantarillado sanitario entre las calles 9° a la 11° y entre las carreras del 2° al 4° del municipio de Curillo – Caquetá.	667.603.489,00	393.987.677,00	273.615.812,00
CURILLO	2025	Elaboración del plan maestro de acueducto y alcantarillado (incluye catastro de redes) del municipio de Curillo, en el departamento de Caquetá.	400.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00
CURILLO	2025	Dotación de equipos para la medición de agua (macro medidores) y de llenado automático para la planta de tratamiento de agua potable de Curillo.	50.000.000,00	50.000.000,00	
CURILLO	2026	Construcción de la primera fase de red de alcantarillado en el barrio Turbay del municipio de Curillo departamento del Caquetá	693.000.000,00	376.481.907,82	316.518.092,18
CURILLO	2027	Construcción de tanque elevado de distribución de agua potable con capacidad de 100 metros cúbicos	500.000.000,00	252.476.685,70	247.523.314,30
EL DONCELLO	2024	Reposición de alcantarillado sanitario barrio la Libertad, municipio de el Doncello departamento del Caquetá	243.876.200,00	110.000.000,00	133.876.200,00
EL DONCELLO	2025	AHORRO			0,00
EL DONCELLO	2026	Vehículo Compactador - para la recolección de residuos sólidos del Municipio de El Doncello	1.000.000.000,00	430.000.000,00	570.000.000,00
EL DONCELLO	2027	Construcción de nuevo tanque de almacenamiento de agua potable para la cabecera municipal del Doncello	1.000.000.000,00	560.000.000,00	440.000.000,00
FLORENCIA	2024	Construcción del sistema de alcantarillado del barrio La Esmeralda del municipio de Florencia, departamento del Caquetá	1.746.585.992,00	1.521.589.872,00	224.996.120,00
FLORENCIA	2024	Reformulación del proyecto "construcción etapa uno del colector de alcantarillado sanitario sobre la rivera de la quebrada La Sardina municipio de Florencia, departamento de Caquetá"	500.000.000,00	300.000.000,00	200.000.000,00
FLORENCIA	2024	realizar los estudios y diseños para la construcción del sistema de alcantarillado del asentamiento de Paloquemao del municipio de Florencia, departamento del Caquetá	500.000.000,00	300.000.000,00	200.000.000,00
MILAN	2024	Canalización de aguas lluvias en la calle 4, entre cra 2 a la cra 6, del casco urbano de la inspección	1.057.248.000,00	555.248.000,00	502.000.000,00

MUNICIPIO	VIGENCIA	PROYECTO	VALOR TOTAL	APORT MUNICIPIO	APORTE DEPARTAMENTO
		de San Antonio de Getuchá, en el municipio de Milán, Departamento del Caquetá.			
MILAN	2025	Construcción de acueducto rural para las veredas La Rastra El Diamante en el municipio de Milán.	300.000.000,00	100.000.000,00	200.000.000,00
MILAN	2026	Optimización de la planta de tratamiento de agua residuales PTAR de la cabecera municipal de Milán departamento de Caquetá	300.000.000,00	100.000.000,00	200.000.000,00
MILAN	2027	Optimización de la planta de tratamiento de agua residuales PTAR inspección de Remolinos de Aricuntí municipio de Milán	255.248.000,00	100.000.000,00	155.248.000,00
LA MONTAÑITA	2024	Ejecución de obras de mitigación del riesgo por el desabastecimiento de agua potable, en la bocatoma sobre la quebrada Las Margaritas, línea de aducción y PTAP Los Naranjos del municipio de La Montañita, departamento del Caquetá	980.000.000,00	479.498.000,00	500.502.000,00
LA MONTAÑITA	2025	Optimización de la Planta de Tratamiento de agua potable PTAP en la inspección de Mateguadua del municipio de La Montañita Caquetá.	964.239.000,00	564.239.000,00	400.000.000,00
LA MONTAÑITA	2026	Optimización de acueducto vereda de Itarca municipio de la Montañita Departamento de Caquetá	853.000.000,00		853.000.000,00
LA MONTAÑITA	2027	Optimización de la red de alcantarillado sanitario en la inspección de Santuario del municipio de La Montañita Caquetá.	1.186.429.799,70	827.334.799,70	359.095.000,00
MORELIA	2024	Mejoramiento del sistema de captación mediante la ejecución de obras de mitigación del riesgo para el desabastecimiento sobre la quebrada La Batea en el municipio de Morelia	516.911.936,00	200.000.000,00	316.911.936,00
MORELIA	2024	"Optimización de tramos de alcantarillado en el municipio de Morelia, departamento del Caquetá"	1.840.000.000,00	40.000.000,00	1.800.000.000,00
MORELIA	2024	Construcción tercera etapa sistema de alcantarillado municipio de Morelia departamento de Caquetá	11.000.000.000,00	205.550.000,00	
MORELIA	2025	Fortalecimiento institucional Creación Empresa de Servicios Públicos de Morelia (ESP)	225.000.000,00	150.000.000,00	75.000.000,00
MORELIA	2026	Construcción fuente alterna con energía renovable para sistema de bombeo PTAP del municipio de Morelia departamento de Caquetá.	225.000.000,00	150.000.000,00	75.000.000,00
MORELIA	2027	Reposición sistema de alcantarillado sanitario municipio de Morelia departamento de Caquetá.	225.000.000,00	150.000.000,00	75.000.000,00
EL PAUJIL	2024	Estudios y diseño para la construcción del Acueducto y Alcantarillado del centro poblado Versalles en el municipio El Paujil.	100.000.000,00	47.793.659,33	52.206.340,67
EL PAUJIL	2024	Estudios y diseño para la construcción del Acueducto del centro poblado Bolivia del municipio El Paujil.	120.000.000,00	67.793.659,33	52.206.340,67
EL PAUJIL	2024	Estudios y diseño para la Optimización sistema de acueducto en sus componentes de captación, desarenador, conducción, PTAP, tanque de almacenamiento y red de distribución para el municipio de El Paujil - Caquetá	273.232.694,00	221.026.353,33	52.206.340,67
EL PAUJIL	2025	Construcción del Acueducto y Alcantarillado del centro poblado Versalles en el municipio de El Paujil	276.155.771,00	118.155.094,00	158.000.677,00
EL PAUJIL		Construcción del Acueducto del centro poblado Bolivia del municipio El Paujil.	276.155.771,00	118.155.094,00	158.000.677,00

MUNICIPIO	VIGENCIA	PROYECTO	VALOR TOTAL	APORT MUNICIPIO	APORTE DEPARTAMENTO
EL PAUJIL	2026	Ahorro	0,00	0,00	0,00
EL PAUJIL	2027	Optimización sistema de acueducto en sus componentes de captación, desarenador, conducción, PTAP, tanque de almacenamiento y red de distribución para el municipio de El Paujil - Caquetá	1.104.623.084,00	472.620.376,00	632.002.708,00
PUERTO RICO	2024	Reposición parcial del alcantarillado del barrio oasis del municipio de puerto rico departamento de Caquetá.	655.166.678,00	55.166.678,00	600.000.000,00
PUERTO RICO	2025	Construcción de una planta de tratamiento de agua potable (PTAP) para el centro poblado de la vereda rio negro, municipio de puerto rico - Caquetá.	957.000.000,00	957.000.000,00	600.000.000,00
PUERTO RICO	2025	construcción de muro y captación alterna de agua sobre la quebrada la conga, fuente abastecedora del sistema de acueducto de la cabecera municipal de puerto rico Caquetá	620.425.000	350.425.000,00	270.000.000,00
PUERTO RICO	2025	construcción de muro y captación alterna de agua sobre la quebrada la conga, fuente abastecedora del sistema de acueducto de la cabecera municipal de puerto rico Caquetá	620.425.000,00	350.425.000,00	270.000.000,00
PUERTO RICO	2026	POR DEFINIR	457.000.000,00	192.000.000,00	265.000.000,00
PUERTO RICO	2027	POR DEFINIR	457.000.000,00	192.000.000,00	265.000.000,00
SAN JOSE DEL FRAGUA	2024	Construcción Celda de disposición final Relleno Sanitario El Cairo Municipio de San José del Fragua	929.730.612,00	529.730.612,00	400.000.000,00
SAN JOSE DEL FRAGUA	2025	Ampliación planta de tratamiento de agua potable casco urbano (PTAP), construcción de modulo adicional (Floculador, sedimentador, filtros y tanque de almacenamiento) Municipio de San José del Fragua, en el Departamento de Caquetá.	1.100.000.000,00	406.243.836,40	693.756.163,60
SAN JOSE DEL FRAGUA	2025	Fortalecimiento del programa de aprovechamiento del PGIRS del Municipio de San José del Fragua	250.000.000,00	50.000.000,00	200.000.000,00
SAN JOSE DEL FRAGUA	2026	AHORRO			
SAN JOSE DEL FRAGUA	2027	Carro compactador recolector de residuos sólidos para la inspección de Yurayaco, Fragueta y Sabaleta del municipio de San José del Fragua departamento de Caquetá.	1.000.000.000,00	600.000.000,00	400.000.000,00
SAN VICENTE DEL CAGUAN	2024	Adquisición de carro compactador, recolector de residuos sólidos para el casco urbano de San Vicente del Caguán	1.000.000.000,00	200.000.000,00	800.000.000,00
SAN VICENTE DEL CAGUAN	2024	Optimización sistema de alcantarillado en barrios del casco urbano del Municipio de San Vicente del Caguán Departamento de Caquetá	317.621.653,53	121.915.399,82	195.706.253,71
SAN VICENTE DEL CAGUAN	2025	Optimización de la planta de tratamiento de agua potable mediante la adecuación de la planta de bombeo y filtros de la PTAP del Municipio de San Vicente del Caguán	600.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00
SAN VICENTE DEL CAGUAN	2026	Construcción acueducto y alcantarillado centro poblado Piscinas del municipio de San Vicente Departamento de Caquetá	116.000.000,00	58.000.000,00	58.000.000,00
SAN VICENTE DEL CAGUAN	2026	Compra de Micromedidores	200.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
SAN VICENTE DEL CAGUAN	2026	Manejo de Aguas Lluvias en el Centro	500.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00

MUNICIPIO	VIGENCIA	PROYECTO	VALOR TOTAL	APORT MUNICIPIO	APORTE DEPARTAMENTO
SAN VICENTE DEL CAGUAN	2027	Optimización sistema de alcantarillado en barrios del casco urbano del Municipio de San Vicente del Caguán Departamento de Caquetá	250.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00
SAN VICENTE DEL CAGUAN	2027	Construcción de tramo de alcantarillado pluvial en la vía Circunvalar del casco urbano del municipio de San Vicente del Caguán	600.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00
SOLANO	2024	Reconstrucción del sistema de suministro de agua y ampliación del sistema de alcantarillado sanitario para la inspección de Mondongo del municipio de Solano departamento de Caquetá.	2.900.000.000,00	2.000.000.000,00	900.000.000,00
SOLANO	2024	Adquisición e vehículo compactador recolector de residuos sólidos para el municipio de Solano Departamento de Caquetá.	1.000.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00
SOLANO	2024	Construcción del relleno sanitario y obras complementarias en el municipio de Solano, Departamento de Caquetá.	1.299.265.979,00	1.299.265.979,00	0,00
SOLANO	2025	Reformulación de los Estudios y diseños para la construcción de una nueva bocatoma para el acueducto del casco urbano del municipio de Solano, departamento de Caquetá.	600.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00
SOLANO	2026	AHORRO			
SOLANO	2027	Estudios y diseños para el acueducto y alcantarillado de los 29 resguardos indígenas del municipio de Solano departamento de Caquetá.	2.000.000.000,00	1.253.500.937,95	746.499.062,05
SOLITA	2024	Construcción del Sistema de Alcantarillado en el municipio de Solita departamento del Caquetá	700.000.000,00	220.000.000,00	480.000.000,00
SOLITA	2025	Ahorro	0,00	0,00	0,00
SOLITA	2026	Optimización del sistema de Acueducto en el municipio de Solita departamento del Caquetá	1.500.000.000,00	853.000.000,00	647.000.000,00
SOLITA	2027	Reposición del Sistema de Alcantarillado en el municipio de Solita departamento del Caquetá	180.620.703,52	110.620.703,52	70.000.000,00
VALPARAÍSO	2024	Construcción del alcantarillado sanitario y su sistema de tratamiento de aguas residuales (PTAR) del centro poblado Santiago de la Selva del municipio de Valparaíso, departamento de Caquetá	1.457.241.000,00	470.049.000,00	987.192.000,00
VALPARAÍSO	2025	Implementación del programa de gestión por demanda y sectorización.	500.000.000,00		500.000.000,00
VALPARAÍSO	2026	Construcción del sistema de acueducto y planta de tratamiento de agua potable (PTAP) en el centro poblado Playa Rica del municipio de Valparaíso, departamento de Caquetá	1.400.000.000,00	700.000.000,00	700.000.000,00
VALPARAÍSO	2027	Construcción de Acueducto Rural Núcleo La Florida en el municipio de Valparaíso, departamento de Caquetá	810.439.023,76	663.582.023,76	146.857.000,00

3.3.2. EL PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA – PDA REALIZA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LOS ACTORES VINCULADOS.

El Plan Departamental de Agua –PDA Caquetá tiene como objetivo el fortalecimiento Institucional, la integración de los actores participantes en el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico, promoviendo la prestación eficiente y sostenible de los servicios públicos domiciliarios de los municipios vinculados. Teniendo en cuenta lo anterior, el PDA con su grupo de apoyo inicio el

	DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ	
	Informe de Seguimiento del PEI	Versión 1.0 17/01/2020

acompañamiento en la siguiente empresa de servicios públicos.

TABLA ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

RESULTADOS			
Se logró coordinar la logística y brindar acompañamiento a espacios de aprendizaje y aseguramiento para la prestación de los servicios públicos del AAA, como las que se ilustran a continuación:			
TEMA	MUNICIPIO	PARTICIPANTES	REGISTRO FOTOGRÁFICO
Asistencia técnica a el municipio de Solano en la elaboración de los indicadores sectoriales	SOLANO	Secretario de Planeación y Gerente empresa de Servicios públicos	

(Aseguramiento, 2025)

3.4. DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE AGUA (PACA) PARA EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ

En relación al proyecto Plan de Aseguramiento de Calidad de Agua “PACA”, que fue aprobado en el 2018, por el MVCT, me permito allegar un informe que permita visibilizar el estado de la ejecución de los ocho (8) programas del PACA, teniendo en cuenta que no se ha dado cierre al mismo.

A continuación, se relacionan los programas que comprenden el PACA:

1. Programa de capacitación y Asistencia Técnica a los prestadores de servicio de acueducto. **(3.1.1)**
2. Programa de implementación de un equipo básico de control de calidad de agua. **(3.1.2)**
3. Programa de optimización del equipamiento de las PTAP. **(3.1.3)**
4. Programa de optimización de sistemas de desinfección en las PTAP. **(3.1.4)**
5. Programa de optimización de sistema de dosificación de químicos (coagulantes y ayudantes de coagulación y/o estabilizadores de pH), para las PTAP convencionales. **(3.1.5)**
6. Programa de instalación de macro medición en las PTAP. **(3.1.6)**
7. Programa de optimización de puntos de toma de muestras concertados en red de distribución. **(3.1.7)**
8. Programa de análisis de laboratorios fisicoquímicos y bacteriológicos para seguimiento y control de calidad de agua. **(3.1.8)**

Respecto a su ejecución y desarrollo, se consolido la información en la tabla 1.

TABLA. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL AGUA - PACA.

PROGRAMA/SUBPROGRAMAS PACA	APROBADO PACA	CONTRATISTA	VALOR EJECUTADO	SALDO	VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO
3.1.1. Programa de Capacitación y Asistencia Técnica a los prestadores de Servicio de Acueducto	52.500.000,00		89.750.000,00	-37.250.000,00	
3.1.1.1. Subprograma de capacitación para operarios de planta de tratamiento.		María Angélica Losada Olarte	81.000.000,00		OK
3.1.1.2. Subprograma de capacitación para fontaneros		María Angélica Losada Olarte			OK
3.1.1.3. Subprograma de certificación en competencias laborales para operarios de acueducto		María Elza Morales García	8.750.000,00		OK
		María Elza Morales García		22.500.000,00	OK
3.1.2. Programa de Implementación equipo básico de control de calidad de agua	449.724.871,00		\$43.812.896,00	405.911.975,00	
3.1.2.1. Subprograma de mantenimiento y calibración externa de equipos existentes	43.812.896,00	CM Y CIA compañía limitada	43.812.896,00		OK
3.1.2.2. Subprograma dotación kit básico de laboratorio	405.911.975,00	PENDIENTE	ADICION PRESUPUESTAL	54.950.360,36	PROXIMO A SER PUBLICADO
3.1.3. Programa de optimización del equipamiento de las PTAP	1.554.292.800,00	UTP PACA 2019	1.475.808.669,40	78.484.130,60	
Reposición de válvulas					OK
Reposición de módulos de sedimentación					
Reposición de lechos filtrantes					
3.1.4. Programa de optimización de sistemas de desinfección en las PTAP	\$306.450.000,00	UTP PACA 2019	\$326.053.080,60	\$19.603.080,60	
3.1.4.1. Instalación de sistema de cloración de solución al vacío para la dosificación de gas cloro					OK
3.1.4.2. Instalación de bomba dosificadora para cloración con hipoclorito de calcio en solución					
3.1.4.3. Dotación de elementos de seguridad personales y colectivos para el manejo del cloro					
3.1.5. Programa de optimización de sistema dosificación de químicos (coagulantes y ayudantes de coagulación y/o estabilizadores de pH), para las PTAP convencionales.	262.536.000,00		175.045.000,00	87.491.000,00	
3.1.5.1. Realización de pruebas de tratabilidad		EN EJECUCIÓN		45.040.310,00	PENDIENTE POR LIQUIDACIÓN
3.1.5.2. Dotación de sistema de dosificación de productos químico		UTP PACA 2019	175.045.000,00		OK
3.1.6. Programa de macro medición para las PTAP	699.840.000,00	UTP PACA 2019	595.218.000,00	104.622.000,00	

Instalación de macro medición en entradas y salidas de las PTAP			595.218.000,00		OK
3.1.7. Programa de optimización de puntos de toma de muestras concertados en red de distribución	280.000.000,00		250.000.000,00	30.000.000,00	
Construcción de puntos de toma de muestras concertados		CONTRATAR SAS	250.000.000,00		OK
3.1.8. Programa de análisis de laboratorios físicoquímicos y microbiológicos para seguimiento y control de calidad de agua, en laboratorio autorizado por INS.	173.905.000,00	SERVAF S.A. E.S.P.	147.116.992,36	26.788.007,64	OK
Interventoría a programas de: optimización del equipamiento de las PTAP, sistemas de desinfección en las PTAP, optimización de sistemas de dosificación de químicos para las PTAP convencionales (subprograma dotación de sistemas de dosificación de productos químicos) y macro medición.		JOSE MAURICIO ESPINEL GARNICA	166.972.800,00		OK

De acuerdo a lo anterior, el único programa pendiente por ser ejecutado en el

3.4.1. PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE UN EQUIPO BÁSICO DE CONTROL DE CALIDAD DE AGUA.

Actualmente, este proceso se encuentra contratado bajo la modalidad de compraventa No. 202400001078, con el número de proceso DC-PDA-SIE-022-2024. El acta de inicio fue suscrita el 23 de enero de 2025 con la empresa INGEODER PHARMA S.A.S., estableciéndose un plazo de ejecución de 5 meses, hasta el 23 de junio de 2025. La supervisión del contrato está siendo realizada por el Plan Departamental de Agua.

3.5. CIERRE DEL PLAN DE ASEGURAMIENTO PDA CAQUETÁ VIGENCIA 2022 -2024.

El PDA del Departamento de Caquetá recibió notificación del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT), a través de la Subdirección de Desarrollo Empresarial, en la que se certifica la correcta ejecución del Plan de Aseguramiento de la Prestación 2023-2024 y se confirma su cierre. Este Plan, formulado y ejecutado por el PDA, comprendió el período del 18 de agosto de 2023 al 31 de agosto de 2024 y corresponde a la Fase I del SIASAR, con el levantamiento de información en 213 comunidades del Departamento. Inicialmente aprobado el 18 de agosto de 2022, el Plan tuvo modificaciones autorizadas el 9 de abril y el 13 de junio de 2024, permitiendo la ampliación del plazo de ejecución y la actualización de las comunidades beneficiarias.

El informe final de cierre remitido por el PDA reporta la ejecución total de las actividades y productos establecidos, alcanzando un 98,45% de ejecución presupuestal, equivalente a \$439.567.000 de los \$446.478.000 asignados. Con base en la documentación presentada, el MVCT certificó la culminación del Plan y solicitó el reintegro de los recursos sobrantes al Patrimonio Autónomo FIA, conforme a la normativa vigente.

GP

El PDA continuará trabajando en la formulación del nuevo Plan de Aseguramiento de la Prestación 2024-2027, para lo cual se contará con la asistencia técnica y acompañamiento del MVCT, en cumplimiento de los lineamientos establecidos en el Decreto 1425 de 2019 y la Resolución 0895 de 2021.

4. PROYECTOS

Proyectos en Ejecución y/o Suspendidos

Municipio(s)	Nombre del Proyecto/Actividad	Estado	Ubicación	Valor (Pesos)	Fuente(s)	Fecha de Terminación (Real o Estimado)
San José del Fragua	Realiza la Interventoría Técnica, Administrativa y Financiera al Contrato que tiene por Objeto "Reposición y Mejoramiento de la Segunda Etapa de la Red de Alcantarillado Sanitario de la Inspección de Fragueta municipio de San José del Fragua, Caquetá"	Proceso de Liquidación	Urbano	46.300.144,5	SGP - Municipio - Departamento	26/12/2023
Albania	Construcción de Box Coulvert 2.00 X 1.50 m en el barrio Villa Demo, Calle 1ra y 2da sur del municipio de Albania, departamento de Caquetá	Proceso de Liquidación	Rural	554.237.748	SGP - Municipio - Departamento	16/11/2023
Albania	Realizar la Interventoría Técnica, administrativa y Financiera al contrato que tiene por Objeto "Construcción de Box Coulvert 2.00 X 1.50 m - barrio Villa Demo calle 1ra y 2da sur del municipio de Albania, departamento de Caquetá"	Proceso de Liquidación	Rural	41.626.200	SGP - Municipio - Departamento	16/11/2023
Belén de los Andaquíes	Optimización del Sistema de Acueducto (Adecuación Bocatoma, Desarenador, Cambio Red de Conducción, Adecuación PTAP) para el municipio de Belén de los Andaquíes - Caquetá	Suspendido	Urbano	2.958.089.163	SGP - Municipio - Departamento	
Belén de los Andaquíes	Interventoría para la Optimización del Sistema de Acueducto (Adecuación Bocatoma, Desarenador, Cambio de Red de Conducción, Adecuación PTAP) para el municipio de Belén de los Andaquíes. - Caquetá	Suspendido	Urbano	236.702.975	SGP - Municipio - Departamento	
Milán	Construcción del Acueducto Incluye PTAP de San Antonio de Getuchá - municipio de Milán - departamento del Caquetá	Liquidado	Rural	1.735.052.751	SGP - Municipio - Departamento	20/12/2023
Milán	Interventoría Integral (Técnica, Administrativa, Contable, Financiera, Jurídica y Ambiental) al Contrato de obra que tiene por Objeto: "Construcción del Acueducto Incluye PTAP de San Antonio de Getuchá - municipio de Milán - departamento del Caquetá"	Proceso de Liquidación	Rural	93.677.847	SGP - Municipio - Departamento	20/12/2023
Valparaíso	Interventoría Integral (Técnica, Administrativa, Financiera, Contable y Jurídica) del contrato que tiene por Objeto "Optimización del Sistema de Acueducto para el casco urbano del municipio de Valparaíso - Caquetá"	Liquidado	Rural	110.148.311	SGP - Municipio - Departamento	06/10/2022
Florencia	Mejoramiento de la Calidad de Vida de la Población Vulnerable de Florencia en el departamento del Caquetá, a través de la Ampliación del Sistema de Acueducto para los barrios: Villa Clara, Nápoles, Villa Real y El Timmy. Florencia.	En ejecución	Urbano	8.178.120.849	SGP - Municipio - Departamento	02/04/2025
Florencia	Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera y Ambiental al contrato de Obra Civil que tiene por Objeto "El Mejoramiento de la Calidad de Vida de la Población Vulnerable de Florencia en el"	En ejecución	Urbano	817.839.648	SGP - Municipio - Departamento	02/04/2025

Municipio(s)	Nombre del Proyecto/Actividad	Estado	Ubicación	Valor (Pesos)	Fuente(s)	Fecha de Terminación (Real o Estimado)
	departamento del Caquetá, a través de la Ampliación del Sistema de Acueducto para los barrios: Villa Clara, Nápoles, Villa Real y El Timmy – Caquetá.					
Florencia	Interventoría Integral (Técnica, Administrativa, Contable, Jurídica y Ambiental) Al Contrato de Obra que por Objeto: Construcción de Box Coulvert de Canal Cerrado en el Caño Brisas del Hacha ubicado en la Comuna Norte del municipio de Florencia, Caquetá.	Liquidado	Urbano	328.858.812	SGP - Municipio - Departamento	08/10/2021
Florencia	Realizar los Estudios y Diseños para la Construcción del Sistema de Alcantarillado del Barrio La Esmeralda del municipio de Florencia, departamento del Caquetá	Liquidado	Urbano	55,000,000	SGP - Municipio - Departamento	31/10/2024
La Montañita	"Construcción de la Red de Distribución de Agua Potable barrio Las Palmas en el municipio de La Montañita Caquetá"	Liquidado	Urbano	584,457,962	SGP - Municipio - Departamento	09/02/2024
La Montañita	Realizar Interventoría Técnica, Administrativa y Financiera al Contrato que tiene por Objeto "Construcción de la Red de Distribución de Agua Potable barrio Las Palmas en el municipio de La Montañita Caquetá"	Proceso de Liquidación	Urbano	58,295,125.00	SGP - Municipio - Departamento	09/02/2024
Morelia	Construcción Red de Acueducto y Planta de Tratamiento de Agua Potable para el casco urbano del municipio de Morelia - departamento de Caquetá	Ejecución	Urbano	3.500.000.000	SGP - Municipio - Departamento	22/03/2025
Morelia	"Interventoría Integral Técnica, Administrativa, Financiera, Contable, Jurídica y Ambiental al Contrato de Obra cuyo Objeto es "Construcción Red de Acueducto y Planta de Tratamiento de Agua Potable para el casco urbano del municipio de Morelia - departamento de Caquetá"	Ejecución	Urbano	332,343,200	SGP - Municipio - Departamento	22/03/2025
Morelia	Realizar la Interventoría, Técnica, Jurídica, Administrativa y Contable del Contrato que tiene por objeto: Construcción de Tramos de Alcantarillado en el municipio de Morelia, departamento de Caquetá.	Ejecución	Urbano	98.313.249	SGP - Municipio - Departamento	28/02/2025
Belén de los Andaquíes	Realizar Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental al contrato que tiene por objeto "Reposición del sistema de alcantarillado del Centro Poblado Rural Puerto Torres del municipio de Belén de los Andaquíes-Caquetá"	Liquidado	Rural	38.297.047	SGP - Municipio - Departamento	31/05/2024

Proyectos en Proceso de Incumplimiento

Municipio(s)	Nombre del Proyecto/Actividad	Estado	Ubicación	Valor (Pesos)	Fecha de Terminación (Real o Estimado)
Curillo	Construcción de la Celda No. 3 y Obras Complementarias en el Relleno Sanitario para la Disposición Final de los Residuos Sólidos Ordinarios Generados en la cabecera municipal de Curillo	En proceso de incumplimiento	Urbano	\$1.283.948.626	
Curillo	Interventoría Integral (Técnica, Administrativa, Contable, Jurídica y Ambiental) al contrato de obra que tiene por objeto: "Construcción de la Celda No. 3 y Obras Complementarias en el Relleno Sanitario para la Disposición Final de los Residuos Sólidos Ordinarios Generados en la cabecera municipal de Curillo	En proceso de incumplimiento	Urbano	\$ 102.715.890,0	
Curillo, Albania,	Estudios de Factibilidad y Diseños para la Optimización del Sistema de Alcantarillado, Manejo de Aguas Lluvias y Diseño del	En proceso de incumplimiento	Urbano	Consultoría \$1.463.702.701	24/7/2023

	DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ	
	Informe de Seguimiento del PEI	Versión 1.0 17/01/2020

Belén de los Andaquíes y Cartagena del Chairá	Sistema de Tratamiento para Aguas Residuales Domésticas para el Casco Urbano de los municipios de Curillo, Albania, Belén de los Andaquíes y Cartagena del Chairá			Interventoría \$102.459.190,0	
Milán, Morelia, San José del Fragua, Solano y Valparaíso	Realizar la Interventoría Técnica, Administrativa y Financiera a la Consultoría de Estudios y Diseños de Proyectos en el Marco del Programa Agua para la Prosperidad - Plan Departamental de Agua del Caquetá.	En proceso de pago Judicial.	Urbano	70'234.519.0	

6. COMPONENTE AMBIENTAL Y GESTIÓN DEL RIESGO.

El componente ambiental y de gestión del riesgo, en el periodo de ejecución del presente informe, realizó las siguientes actividades, las cuales responden a las necesidades argumentadas en la matriz de costos del gestor:

- Se llevó a cabo visita técnica, ambiental y social el día 22 de enero del presente año, del proyecto de obra *"Construcción Red de Acueducto y Planta de Tratamiento de Agua Potable para el casco urbano del municipio de Morelia - departamento de Caquetá"*. Desde el componente ambiental se evaluaron los impactos identificados tanto temporales, simples recuperables e irrecuperables. También se indicaron los impactos ambientales compatibles.
- Se llevó a cabo visita técnica, ambiental y social, el día 22 de enero del presente año, de la obra del proyecto *"Realizar la Interventoría, Técnica, Jurídica, Administrativa y Contable del Contrato que tiene por objeto Construcción de Tramos de Alcantarillado en el municipio de Morelia, departamento de Caquetá"* Desde el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental, el contratista continúa realizando la ejecución del programa de residuos sólidos, con el punto ecológico y disposición de material sobrante de la obra con la empresa de servicios públicos. Así mismo con el programa de señalización y otros que están establecidos en la recta final del proyecto.
- Se llevó a cabo visita técnica, ambiental y social, el día 22 de enero del presente año, se realizó visita técnica al proyecto *"Mejoramiento de la Calidad de Vida de la Población Vulnerable de Florencia en el departamento del Caquetá, a través de la Ampliación del Sistema de Acueducto para los barrios: Villa Clara, Nápoles, Villarreal y El Timmy – Caquetá"*. Desde el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental, el contratista continúa realizando la ejecución del programa de residuos sólidos, con el punto ecológico y disposición de material sobrante de la obra con la empresa de servicios públicos.
- El día 28 de enero del presente año, se realizó comité #18 del proyecto de *"Mejoramiento de la Calidad de Vida de la Población Vulnerable de Florencia en el departamento del Caquetá, a través de la Ampliación del Sistema de Acueducto para los barrios: Villa Clara, Nápoles, Villarreal y El Timmy – Caquetá"* En este comité el equipo de interventoría se socializaron las actividades realizadas a la fecha, y compromisos establecidos en el mes de diciembre. Desde el componente ambiental se hizo hincapié en la solicitud del permiso de ocupación de cauce para la construcción de los viaductos.

	DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ	
	Informe de Seguimiento del PEI	Versión 1.0 17/01/2020

- Se realizaron actividades de seguimiento a los mínimos ambientales, el día 28 de enero del presente año, a la Empresa de servicios públicos EMSERPA SA ESP del Municipio de Albania. Los Mínimos Ambientales Sectoriales corresponden a las obligaciones ambientales que por ley deben cumplir los entes territoriales, los prestadores de servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo y en general, todas aquellas entidades formuladoras de proyectos de inversión en el sector de Agua Potable y Saneamiento Básico, para el desarrollo de las actividades relacionadas con la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo".
- Se realizaron actividades de seguimiento a los mínimos ambientales. el día 30 de enero del presente año, se envió circular externa al Alcalde Municipal de Solita, Camilo Gutiérrez Moreno y la Doctora Bellanira Galeano Quintero, Gerente de la Empresa de Servicios Públicos de Solita EMSERSOL SA ESP, con la finalidad de solicitar información actualizada 2025, sobre el estado actual de los mínimos ambientales sectoriales (PSMV, PUEAA, PGIRS y CONCESIÓN) del municipio de Solita, específicamente en relación con los requerimientos establecidos por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio para proyectos de agua potable y saneamiento básico.
- Lo anterior, conforme al seguimiento y acompañamiento realizado durante el año 2024 a la Empresa de Servicios Públicos de Solita EMSERSOL S.A E.S. P, por parte del equipo del Plan Departamental de Agua (PDA). Recordamos que para ese año aún estaban pendientes de actualizar estos mínimos ambientales y que para este nuevo año 2025 es de gran relevancia su cumplimiento para la ejecución de futuros proyectos que permitan la reducción de impactos en el medio ambiente y/o la salud humana. Finalmente continuamos brindando acompañamiento en el que podamos agilizar dichos procesos y/o trámites ante la Autoridad Ambiental.
- Así mismo el día 30 de enero del presente año, se realizó seguimiento a los mínimos ambientales al municipio y Empresa de Servicios Públicos de Solita EMSERSOL SA ESP, con la finalidad de solicitar información actualizada 2025, sobre el estado actual de estos mínimos ambientales sectoriales (PSMV, PUEAA, PGIRS y CONCESIÓN) específicamente en relación con los requerimientos establecidos por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio para proyectos de agua potable y saneamiento básico
- El día 15 de enero del presente año, se realizó reunión con la profesional de la secretaría de Salud Departamental, quiénes liderar el Consejo Territorial de Salud Ambiental COTSA, en la que hacemos parte de la mesa técnica de calidad de agua. Esta reunión tuvo como finalidad concertar plan de trabajo que será establecido con toda la mesa de agua una vez se conozca las necesidades de los municipios frente a problemáticas de calidad de agua. Teniendo en cuenta lo mencionado se solicitó información mediante oficio al representante de las Empresas de Servicios Públicos el Gerente Reinel Rodríguez Tasama del Municipio del Doncello, dicha información en el marco de la Mesa Técnica de Agua y Saneamiento Básico, en cumplimiento al Decreto 0608 de 2018 y Decreto 0485 de 2014 relacionado con la creación el Consejo Territorial de Salud Ambiental – COTSA en el Departamento de Caquetá.
- Se continúa realizando talleres de capacitación de cambio climático y ahorro de uso eficiente de agua, esta vez al grado tercero de la institución educativa del Municipio de Albania, con la

CE

 	DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ	 COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA
	Informe de Seguimiento del PEI	Versión 1.0 17/01/2020

finalidad de brindar mensajes sobre el cuidado del medio ambiente y protección de los recursos naturales, con representaciones lúdicas que permitan desde una edad temprana el entendimiento y toma de conciencia. Este tipo de actividades no solo ha recibido gran aceptación por parte de los docentes de las instituciones, sino de toda la comunidad educativa, lo que ha permitido continuar trabajando mancomunadamente por la protección del medio ambiente



- El día 22 de enero del presente año se realizó visita a la Empresa de Servicios públicos EMSESPA SA ESP del Municipio de Albania, con la finalidad de realizar seguimiento y fortalecimiento si es necesario en Temas relacionado con la Gestión del Riesgo, con el fin de mejorar su capacidad de prevención, respuesta y recuperación ante posibles emergencias y desastres. El Gerente Timoleón Sánchez informa que a la fecha no se ha actualizado en Plan de Emergencia y Contingencia de la Empresa en el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico, e informa que, para el mes de marzo del presente año, se iniciará su respectiva actualización.
- Se llevó a cabo visita técnica, ambiental y social el día 25 de febrero de 2025 presente año, del contrato de obra "CONSTRUCCIÓN RED DE ACUEDUCTO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MORELIA - DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ". Durante la visita técnica, se identificaron condiciones que comprometen la seguridad y el orden en la obra. Se evidenció una disposición inadecuada de materiales, incluyendo madera y residuos de bultos, lo que afecta la organización general del sitio y representa un riesgo potencial para la seguridad del personal y la integridad de las estructuras en ejecución
- Se realizó visita técnica, ambiental y social, el día 20 de diciembre de 2024, con el propósito de inspeccionar los tramos intervenidos en el proyecto. Desde el componente ambiental, y teniendo en cuenta que la obra está próxima a culminar, así mismo no se dispone de puntos ecológicos ni de bodegas, sin embargo, esto no afecta al cumplimiento del Plan de manejo debido a que fue ejecutado durante el tiempo establecido en las fichas ambientales. Aún está pendiente la recolección de un montículo de material generado en la obra, donde el Ingeniero Interventor manifiesta que este será levantado y dispuesto en un lugar autorizado antes de finalizar la obra.
- Se realizó visita técnica, ambiental y social, el día 27 de febrero de 2025 sobre a la ejecución de la obra del proyecto *Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera y Ambiental al contrato de obra civil que tiene por objeto "El Mejoramiento de la Calidad de Vida de la Población Vulnerable de Florencia en el departamento del Caquetá, a través de la Ampliación del Sistema de Acueducto para los barrios: Villa Clara, Nápoles, Villarreal y El Timmy – Caquetá.*, la visita se adelantó en compañía de la inspectora de la obra, el ingeniero residente, la ingeniera ambiental, el siso y los profesionales de los componentes técnico y social del PDA Caquetá. Desde el componente ambiental se realizó verificación a los diferentes frentes de obra, donde se evidencio la ausencia de señalización.
- Se realizó visita técnica, ambiental y social el día 27 de febrero de 2025 al proyecto de drenaje urbano de Belalcázar, durante el recorrido, se identificaron los tramos a intervenir, incluyendo sus respectivas cunetas, sumideros, zonas de aporte, la topografía del terreno y la disposición

Q



	DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ	
	Informe de Seguimiento del PEI	Versión 1.0 17/01/2020

final de las aguas lluvias. Durante el recorrido de obra, el ingeniero del componente ambiental destacó la importancia de avanzar en el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Resolución 1868 del 19 de diciembre de 2024, la cual otorga la autorización de ocupación de cauce. Destacó que es fundamental continuar con las acciones y gestiones necesarias para garantizar que se cumpla con lo dispuesto en esta normativa, y

- El día 28 de febrero del presente año, se realizó capacitación a los estudiantes de grado de la Institución Educativa Bajo Caldas de Florencia, se logró brindar conocimientos, ideas e iniciativas que contribuyan al compromiso ambiental desde las aulas de clases y desde el día a día de cada estudiante, aportando para favorecer la adaptación al cambio climático por medio de acciones concretas como, por ejemplo: ahorro de agua a través de duchas más cortas, cerrar las llaves, reciclar, evitar el uso de plásticos de un solo uso, entre otros.

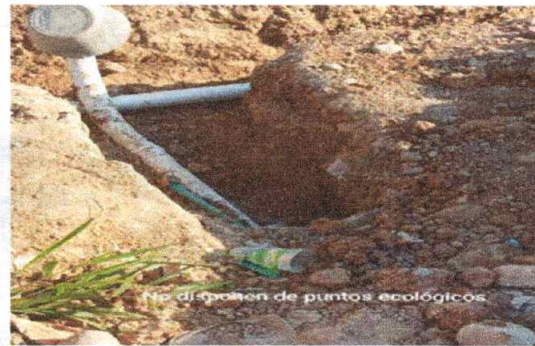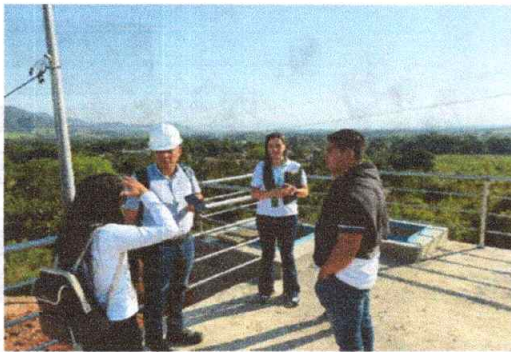

Q

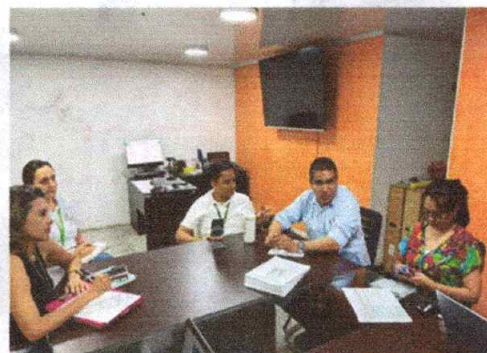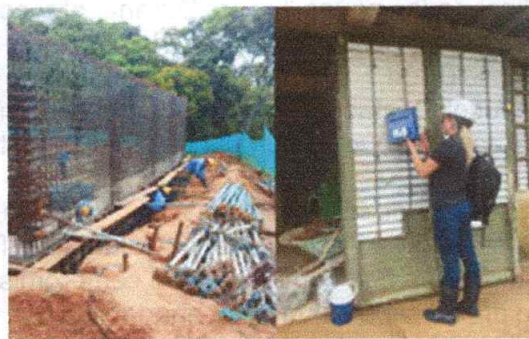

GP

7. COMPONENTE SOCIAL

Durante el período evaluado, el Componente Social del Plan Departamental de Agua del Caquetá llevó a cabo las siguientes actividades:

CAPACITACIONES EN SANEAMIENTO BÁSICO Y AGUA POTABLE			
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD	PROYECTO	PARTICIPANTES	EVIDENCIA FOTOGRÁFICA
Capacitación sobre Ahorro y Uso Eficiente del Agua , orientado a estudiantes de las Instituciones Educativas del departamento.	N/A	• I. E. Rural Bajo Caldas/ Florencia. • Institución Educativa Rural Las Lajas / Inspección Yurayaco – San José del Fragua	

SEGUIMIENTO SOCIAL A LOS PROYECTOS

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD	PROYECTO	PARTICIPANTES	EVIDENCIA FOTOGRÁFICA
Seguimiento Social a los Proyectos en etapa contractual y post contractual		Seguimiento social al proyecto "Construcción Red de Acueducto y Planta de Tratamiento de Agua Potable para el casco urbano del municipio de Morelia – Caquetá"	
		Seguimiento social a la ejecución del proyecto: "Construcción de Tramos de Alcantarillado en el municipio de Morelia, departamento del Caquetá"	
		Seguimiento Social "Mejoramiento de la Calidad de Vida de la Población Vulnerable de Florencia en el departamento del Caquetá, a Través de la Ampliación del Sistema de Acueducto para los barrios: Villa Clara, Nápoles, Villa Real y El Timy"	

SEGUIMIENTO CLUBES DEFENSORES DEL AGUA

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD	PROYECTO	PARTICIPANTES	EVIDENCIA FOTOGRÁFICA
Seguimiento a Club Defensores del Agua Conformados	N/A	I. E. Bajo Caldas / Florencia I. E. Agroecológico Amazónico / Paujil	 

SEGUIMIENTO A COMITÉS DE CONTROL SOCIAL

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD	PROYECTO	PARTICIPANTES	EVIDENCIA FOTOGRÁFICA
Seguimiento y Acompañamiento a los comités de control social y Veedores	Construcción Etapa I del Sistema de Alcantarillado Sanitario y Pluvial del casco urbano del municipio de Morelia en el departamento del Caquetá	María Santos Cuellar Ana Paola Sierra	
	Mejoramiento de la Calidad de Vida de la Población Vulnerable de Florencia en el departamento del Caquetá, a través de la Ampliación del Sistema de Acueducto para los Barrios: Villa Clara, Nápoles, Villa Real y El Timy.	Juan Carlos Ardila Leidy Tatiana Jara	
	Construcción Red de Acueducto y Planta de Tratamiento de Agua Potable para el casco urbano del municipio de Morelia - departamento de Caquetá	María Santos Cuellar Martha Cecilia Cuellar	


SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN A LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL EN OBRA

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD	PROYECTO	PARTICIPANTES	EVIDENCIA FOTOGRÁFICA
Registro de seguimientos realizados, Informe de revisión del Plan de Gestión Social, Registro de vallas instaladas de acuerdo a los lineamientos del PDA	Construcción Red de Acueducto y Planta de Tratamiento de Agua Potable para el casco urbano del municipio de Morelia - departamento de Caquetá	Martha Cecilia Cuellar Profesional Social	
	Construcción Etapa I del Sistema de Alcantarillado Sanitario y Pluvial del casco urbano del municipio de Morelia en el departamento del Caquetá	Ana Paola Sierra Profesional Social	

	Mejoramiento de la Calidad de Vida de la Población Vulnerable de Florencia en el departamento del Caquetá, A través de la Ampliación del Sistema de Acueducto para los Barrios: Villa Clara, Nápoles, Villa Real y El Timy.	Leidy Tatiana Jara Profesional Social	
--	---	--	---

CAPACITACIÓN CUIDADO DEL AMBIENTE			
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD	PROYECTO	PARTICIPANTES	EVIDENCIA FOTOGRÁFICA
Capacitación y Sensibilización en cuidado del ambiente, reducción del cambio climático y efecto invernadero	I. E. Rural Bajo Caldas	Estudiantes grado 8	

NOTAS INFORMATIVAS			
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD	PROYECTO	PARTICIPANTES	EVIDENCIA FOTOGRÁFICA
Notas Informativas del Desarrollo de las Actividades Realizadas	- Acompañamiento y apoyo a Jornadas de descentralización Inspección de Yurayaco municipio de San José del Fragua – Caquetá - Nota Informativa Visita de obra Construcción Etapa I del Sistema de Alcantarillado Sanitario y Pluvial del casco urbano del municipio de Morelia en el departamento del Caquetá - Nota informativa Construcción Red de Acueducto y Planta de Tratamiento de Agua Potable para el casco urbano del municipio de Morelia - departamento de Caquetá - Nota Informativa	Profesionales Componente Social del PDA Caquetá.	 

NOTAS INFORMATIVAS			
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD	PROYECTO	PARTICIPANTES	EVIDENCIA FOTOGRÁFICA
			 DESARROLLO DE LA NOTA PERIODISTICA Título de la Nota: Construyendo bienestar: Alcantarillado de Morelia en su fase final. Ciudad y Fecha de la Nota: Florencia, Caquetá, 25 de febrero de 2025. Apertura de la nota: El pasado 25 de febrero, realizamos una visita técnica a la obra "CONSTRUCCIÓN DE TUBOS DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE MORELIA, DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ" junto a un equipo técnico, social y ambiental. Durante la inspección, verificamos el estado del proyecto, asegurando su desarrollo conforme a los estándares de calidad y al cronograma. Esta obra es clave para mejorar las condiciones sanitarias del municipio, modernizando la red de alcantarillado. La comunidad ha expresado su satisfacción con los avances logrados, mientras trabajadores de la obra trabajan para garantizar una infraestructura eficiente y segura. Desarrollo de la actividad: El proyecto ha alcanzado un 95% de ejecución, con avances en excavaciones, instalación de tuberías de PVC y construcción de pozos de inspección. La mayoría de las tareas pendientes son ajustes en detalles de mampara, mejorando la estética. La inspección permitió revisar detalles finales y definir los trabajos pendientes, como la instalación de los últimos tramos de tubería y ajustes para optimizar el sistema antes de su entrega. Cierre de la actividad: Esta obra mejorará el saneamiento básico de Morelia, reduciendo obstrucciones y riesgos de inundaciones. La comunidad espera con optimismo la entrega del proyecto, que garantizará un sistema más confiable y eficiente. Desde el PDA Departamental de Aguas, realmente muestra compromiso con el desarrollo de infraestructura que beneficia a las comunidades. Estamos a un paso de la meta y pronto a entregar un Morelia con mejor infraestructura sanitaria. REGISTRO FOTOGRÁFICO

8. INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LOS COSTOS DEL GESTOR.

Al verificar el avance en el desarrollo de las actividades acumuladas a 28 de febrero de 2024, se tiene que los Costos del Gestor, muestran un importante avance en el cumplimiento de las metas, evidenciándose que cada uno de los componentes cumplió con la ejecución en el cumplimiento de las metas.

Realizando el seguimiento en la evolución de los Costos del Gestor 2025, encontramos la siguiente información acumulada:


COMPONENTE	ENERO			FEBRERO			CUMPLIMIENTO PDA CAQUETA 2025		
	Planeado	Entregado	% de Cumplimiento	Planeado	Entregado	% De Cumplimiento	Planeado	Entregado	% de Cumplimiento
ADMINISTRATIVA	0	0	0,0%	8	8	100,00%	1.145	8	3,96%
AMBIENTAL	0	0	0,0%	6	6	100,00%	164	6	1,76%
ASEGURAMIENTO	0	0	0,0%	10	10	100,00%	151	10	4,12%
FINANCIERA	0	0	0,0%	11	36	100,00%	263	36	16,07%
INFRAESTRUCTURA	0	0	0,0%	12	16	100,00%	106	16	15,15%
JURIDICA	0	0	0,0%	14	14	100,00%	262	14	6,67%
PLANEACION	0	0	0,0%	4	4	100,00%	55	4	3,33%
SOCIAL	0	0	0,0%	24	17	80,42%	324	17	5,02%
PDA CAQUETA	0	0	0,0%	89	111	97,55%	2.470	111	7,01%

En la tabla anterior, se puede observar el avance de cumplimiento de las metas por componentes de los Costos del Gestor, de acuerdo a las actividades programadas para el bimestre **enero - febrero de 2024** por el PDA Caquetá, se ha alcanzado un del **97.55% para el mes de febrero** (111 actividades realizadas de 89 programadas). Transcurrido el 9.09% del tiempo de ejecución del capítulo 2024; tenemos que el PDA Caquetá, en el cumplimiento de las metas cuenta con un acumulado del **7.01% de cumplimiento acumulado en promedio** en lo transcurrido del 2025, reportando el haber realizado 111 actividades de 2.470 actividades programadas para el 2025; para lo cual, cada componente acumula el siguiente porcentaje:

- Con un **100%** de cumplimiento tenemos al **Componente Administrativo**, reportando el haber entregado **8** actividades de **8** actividades planeadas.

- Con un **100%** de cumplimiento tenemos al **Componente Ambiental**, reportando el haber entregado **6** actividades de **6** actividades planeadas.
- Con el **100%** de cumplimiento tenemos al **Componente de Aseguramiento**, reportando el haber entregado **10** actividades de **10** actividades planeadas.
- Con un **100%** de cumplimiento tenemos al **Componente de Financiero**, reportando el haber entregado **11** actividades de **36** actividades planeadas.
- Con el **100%** de cumplimiento tenemos al **Componente de Infraestructura**, reportando el haber entregado **12** actividades de **16** actividades planeadas.
- Con el **100%** de cumplimiento tenemos al **Componente Jurídica**, reportando el haber entregado **14** actividades de **14** actividades planeadas.
- Con un **100%** de cumplimiento tenemos al **Componente de Planeación**, reportando el haber entregado **4** actividades de **4** actividades planeadas.
- Con el **80.42%** de cumplimiento tenemos al **Componente Social**, reportando el haber entregado **24** actividades de **17** actividades planeadas.

En la siguiente gráfica, podemos observar, como es el comportamiento de los componentes del PDA Caquetá, en el cumplimiento de las metas acumuladas al periodo febrero de 2025.

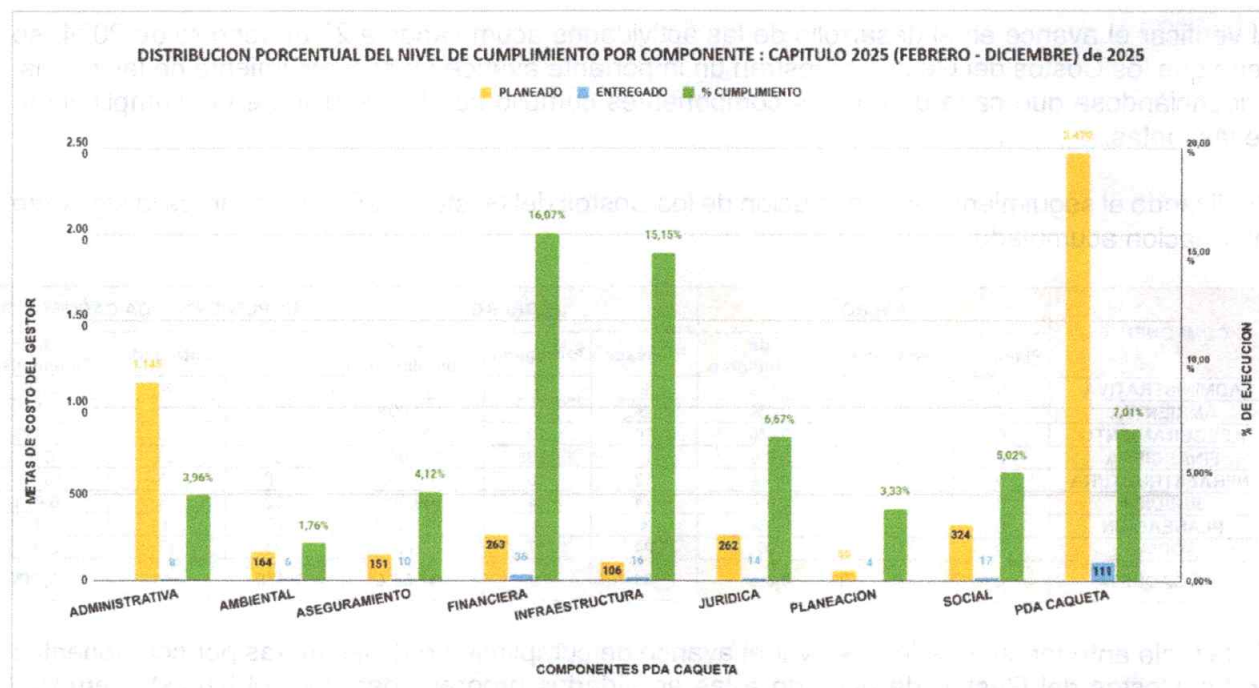


En la gráfica, se presentan los componentes del PDA Caquetá y el nivel de cumplimiento. De color amarillo, se observa la cantidad de actividades programadas, de color azul se observa la cantidad de actividades entregadas y en color verde se observa el porcentaje del nivel de cumplimiento. Las tres barras finales, se observa el total consolidado del PDA Caquetá, reportando un porcentaje del **7.01% de cumplimiento**, en el desarrollo de las metas.


El **7.01% de cumplimiento en promedio acumulado**, reportado por los Costos del Gestor, permite evidenciar un nivel de cumplimiento, frente al logro de los objetivos y acerca de las

 	DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ	 COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA
	Informe de Seguimiento del PEI	Versión 1.0 17/01/2020

actividades que está desarrollando el PDA Caquetá, en su incidencia en la población del departamento del Caquetá, promoviendo la política de los **Planes Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento (PDA)**, definidos en el Decreto **1425 de 2019**; se está cumpliendo de manera satisfactoria, manifestándose en el mejoramiento de la calidad de vida de los caqueteños.

Florencia, marzo de 2025.


HERLEY SUAREZ CUELLAR
Secretario de Infraestructura
Gestor del PDA

Vo.Bo. Yudy Narley García Rojas – Coordinadora PDA 

Vo.Bo. Yenny Camelo - Componente Financiero 

Vo.Bo. Ing. Neiser Andrés Castro Triviño - Componente Técnico 

Estructuró / Diagramó: E. Orlando Parra C. /Apoyo Gestor PDA 
