

## Informe de Seguimiento al Plan Estratégico de Inversiones – PEI

Fecha de inicio periodo informe: **01 de septiembre de 2025**  
Fecha de terminación periodo informe: **31 de octubre de 2025**  
No. Informe **5**

### 1. Justificación

De acuerdo con el Decreto 1425 de 2019, Artículo 2.3.3.1.2.3. Funciones del Gestor, Numeral 14.2. "Informe bimestral (septiembre - octubre de 2025) de la ejecución y seguimiento del Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento y de sus instrumentos de planeación, de acuerdo con el formato y medios que el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio determine para tal fin. En el informe también se señalará el avance del Plan Estratégico de Inversiones, detallando el cumplimiento de los cronogramas allí fijados, las metas propuestas, el estado de avance de los proyectos en ejecución y de los procesos de contratación", el Gestor, presenta el siguiente informe a los Miembros del Comité Directivo del PDA del departamento del Caquetá.

De conformidad al Decreto 1425 de 2019, Artículo 2.3.3.1.5.3 ítems 6.6 Párrafo Tercero, establece "La vigencia del Plan Estratégico de Inversiones (PEI) será la misma del periodo de gobierno de las entidades territoriales y del capítulo anual será hasta el 31 de diciembre del año de aprobación"; Por lo tanto, el PEI 2024-2027, se encuentra en proceso de formulación, conforme lo establece el Decreto en mención.

Es importante mencionar que en razón a las modificaciones realizadas por el MVCT a la metodología de estructuración del PEI 2024 - 2027, se ha presentado el siguiente desarrollo para la aprobación y ejecución del Capítulo 2025: 1. En Comité Directivo No. 57 se aprueba: a) Presentación del cierre financiero del Capítulo 2024 del PEI 2024-2027. B) Aprobación y asignación de recursos del Capítulo 2025 del PEI 2024-2025. C) Asignación de Costos del Gestor Capítulo 2025. por \$1.800. 000.oo. 2. En Comité Directivo No. 58 se hace Aprobación de: a) la primera modificación del Capítulo 2025 del PEI 2024-2027. b). Incorporación nueva fuente recursos financieros: Regalías 60%. c). Incorporación recursos financieros en los componentes Inversión en Infraestructura y Componente de Aseguramiento. d). Modificación cierre financiero 2025. e) Modificación metas capítulo 2025. f) Presentación modificación PAMs San Vicente del Caguán y San José del Fragua. g). Aprobación de delegación contratación a los municipios de San José del Fragua, Morelia, Puerto Rico, Albania y a la ESP del municipio de Curillo. 3. En Comité Directivo No. 59 se aprueba: a) La segunda modificación del Capítulo 2025 del PEI 2024-2027. b). Traslado de recursos entre componentes del PEI. c). Modificación cierre financiero 2025. d) Modificación metas capítulo 2025. e). Modificación al Cronograma 2025. f).Presentación modificación PAMs de municipios de Solita, Milán y Cartagena del Chairá. g) Asignación de recursos a proyectos de Preinversión de los municipios de Milán y Cartagena del Chairá. h) Aprobación de delegación contratación al municipio de Solita.

Informe de Avance del PEI 2024-2027-Capítulo 2025, con corte a 31 octubre de 2025.

Componente	Subcomponente	Valor Comprometido	Municipios		Departamento			Nación	Autoridad Ambiental	Valor Ejecutado Financiero (Expedición de Documento de Compromiso)	Soporte Documento Compromiso	Valor Ejecutado (Pagos Realizados)
			SGP Municipios	Otros Recursos Municipios	SGP Departamento.	Regalías Directas 60%	Recursos Propios Dpto.	Audiencias Públicas	CAR			
	<b>Total Inversión en Infraestructura</b>	<b>34.972.602.743,51</b>	<b>12.861.554.923,15</b>	<b>164.972.924,67</b>	<b>13.483.525.641,76</b>	<b>6.482.378.125,00</b>	<b>205.570.793,41</b>	<b>1.774.600.335,52</b>		<b>5.749.167.371</b>		<b>-</b>
	<b>Infraestructura en AAA</b>	<b>31.007.391.248,91</b>	<b>12.017.504.709,15</b>		<b>12.507.508.414,76</b>	<b>6.482.378.125,00</b>				<b>4.373.150.144</b>		<b>-</b>
Inversión en Infraestructura	Canalización de 300 metros de aguas residuales del Caño San Francisco del municipio de Belén de los Andaquies	1.840.595.681,50	400.000.000,00		1.440.595.681,50							
	Construcción mejoramiento y optimización del sistema de alcantarillado de aguas lluvias del barrio la esmeralda del municipio de Florencia, departamento del Caquetá.	3.589.142.681,13	2.576.837.572,57		1.012.305.108,56							
	Construcción del alcantarillado sanitario del centro poblado Santiago de la Selva del municipio de Valparaíso, departamento de Caquetá (primer fase)	1.457.241.000,00	1.293.460.326,54		163.780.673,46							
	Optimización de la Planta de tratamiento de agua potable PTAP, en la inspección de Mate guadua del municipio de La Montañita Caquetá	961.239.000,00	561.239.000,00		400.000.000,00							
	Construcción de una planta de tratamiento de agua potable (PTAP), para el centro poblado del corregimiento de Rio Negro, municipio de Puerto Rico – Caquetá.	957.000.000,00	957.000.000,00									
	Ampliación planta de tratamiento de agua potable casco urbano (PTAP), construcción de modulo adicional (Floculador, sedimentador, filtros y tanque de almacenamiento) Municipio de San José del Fragua, en el Departamento de Caquetá.	7.582.378.125,00	406.243.836,40		693.756.163,60	6.482.378.125,00						
	Construcción del Sistema de Alcantarillado en el municipio de Solita departamento del Caquetá	700.000.000,00	220.000.000,00		480.000.000,00							
	Optimización de redes de Alcantarillado urbano en el Municipio de Solita, Departamento de Caquetá.	1.678.795.770,00	1.031.795.770,00		647.000.000,00							
	Optimización de las redes de distribución de alcantarillado urbano en el municipio de Albania, departamento del Caquetá	1.878.000.000,00	272.255.472,22		1.605.744.527,78					1.878.000.000,00	CDRS 17976-17977-17978	
	Reposición parcial del alcantarillado barrio oasis municipio de Puerto Rico Caquetá	655.166.678,00	55.166.678,00		600.000.000,00					655.166.678,00	CDRS 17972-17973-17974-17975	
	Optimización de tramos de alcantarillado en el municipio de Morelia, Departamento de Caquetá.	1.839.983.466,00	40.000.000,00		1.799.983.466,00					1.839.983.466,00	CDRS 17979-17980-17981	
	Optimización de las redes de distribución de alcantarillado urbano en el Municipio de Albania, departamento del Caquetá Fase II	2.921.108.293,00	300.000.000,00		2.621.108.293,00							
	optimización del sistema de alcantarillado en los barrios el Centro y el Turbay del municipio de Curillo departamento del Caquetá en los tramos carreras 2 y 3 entre calles 12 y 14 y, calles 12 y 14 entre carreras 2 y 3 .	1.257.766.590,00	354.000.000,00		903.766.590,00							
	Optimización de la captación de agua en la cabecera municipal de San Vicente del Caguán	679.939.803,33	679.939.803,33									
Optimización sistema de alcantarillado en barrios del casco urbano del Municipio de San Vicente del Caguán Departamento de Caquetá	509.034.160,95	369.566.250,09		139.467.910,86								

	Construcción del sistema de suministro de agua para la inspección de Mononguete del municipio de Solano departamento de Caquetá.	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Reformulaciones	2.271.161.280,60	-	164.972.924,67	126.017.227,00	-	-	205.570.793,41	1.774.600.335,52	-	126.017.227	-
	Bolsa Recursos Reformulaciones	2.145.144.053,60	-	164.972.924,67	-	-	-	205.570.793,41	1.774.600.335,52	-	-	-
	Reformulación a la Construcción del Tanque de almacenamiento en el municipio de Albania, Departamento de Caquetá.	126.017.227,00	-	-	126.017.227,00	-	-	-	-	-	126.017.227	CDR 18664
	Preinversiones	1.544.050.214,00	844.050.214,00	-	700.000.000,00	-	-	-	-	-	1.100.000.000	-
	Actualización y ajuste de la formulación y estructuración de los estudios y diseños para la construcción de una nueva bocatoma y optimización del sistema de acueducto del casco urbano del municipio de Solano, departamento de Caquetá	600.000.000,00	\$ 300.000.000,00	-	\$ 300.000.000,00	-	-	-	-	-	600.000.000	17966-17967-17968
	Estudios y diseños para la construcción de un acueducto para las comunidades de San Francisco, San Rafael, Santa Rosa y Institución educativa Mamabwe del resguardo Indígena Agua Negra del municipio de Milán Departamento de Caquetá .	300.000.000,00	\$ 100.000.000,00	-	\$ 200.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Realizar estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo, y elaborar los estudios, diseños e ingeniería de detalle para establecer medidas de mitigación frente al riesgo por crecientes súbitas en la estructura de captación del sistema de acueducto de la cabecera municipal de Cartagena del Chaira, Caquetá.	\$ 144.050.214,00	\$ 144.050.214,00	-	\$ 0,00	-	-	-	-	-	-	-
	Actualización y ajuste de la formulación y estructuración de los estudios y diseños del proyecto construcción etapa uno del colector de alcantarillado sanitario sobre la rivera de la quebrada la sardina. municipio de Florencia, departamento de Caquetá.	500.000.000,00	\$ 300.000.000,00	-	\$ 200.000.000,00	-	-	-	-	-	500.000.000	17969-17970-17971
	Mecanismo Departamental	150.000.000,00	-	-	150.000.000,00	-	-	-	-	-	150.000.000	-
	Mecanismo Departamental	150.000.000,00	-	-	150.000.000,00	-	-	-	-	-	150.000.000	18047
	<b>Total Aseguramiento</b>	<b>443.582.092,00</b>	-	-	<b>443.582.092,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	Plan de Aseguramiento de la Prestación	443.582.092,00	-	-	443.582.092,00	-	-	-	-	-	-	-
	Formulación De Ruta Estratégica Para Asegurar La Prestación De Los Servicios Públicos En Morelia Y Valparaíso, Caquetá	130.238.050,00	-	-	130.238.050,00	-	-	-	-	-	-	-
	Mejora en el Uso y destinación de los recursos SGP-APSB	109.443.997,00	-	-	109.443.997,00	-	-	-	-	-	-	-
	Calidad de agua	203.900.045,00	-	-	203.900.045,00	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Total Ambiental</b>	<b>12.609.473.527,95</b>	<b>330.000.000,00</b>	-	<b>1.175.673.225,00</b>	-	<b>1.938.491.602,95</b>	-	<b>9.165.306.700,00</b>	<b>1.505.673.225</b>	<b>1.159.373.225</b>	<b>1.159.373.225</b>
	Plan Ambiental	12.609.473.527,95	330.000.000,00	-	1.175.673.225,00	-	1.938.491.602,95	-	9.165.306.700,00	1.505.673.225,00	1.159.373.225,00	1.159.373.225,00
	Adquisición de carro compactador, recolector de residuos sólidos para el casco urbano de San Vicente del Caguán	975.673.225,00	200.000.000,00	-	775.673.225,00	-	-	-	-	-	975.673.225,00	17994-17995
	Formulación y/o ajuste de 1 Plan de Ordenación y Manejo de Cuencas (POMCAS) - (Río Pescado)	5.250.000.000,00	-	-	-	-	-	-	5.250.000.000,00	-	-	-
	Formulación y adopción de 2 Planes de Ordenamiento del Recurso Hídrico (PORH)	1.672.706.700,00	-	-	-	-	-	-	1.672.706.700,00	-	-	-
	Reglamentar el uso de las aguas y/o vertimientos de 2 corrientes hídricas	242.600.000,00	-	-	-	-	-	-	242.600.000,00	-	-	-
	Ejecución del Plan de Ordenación y Manejo de Cuencas (POMCAS) del río Hacha	2.000.000.000,00	-	-	-	-	-	-	2.000.000.000,00	-	-	-
	Elaboración de estudios ambientales para el trámite de la licencia ambiental del proyecto "Construcción del relleno sanitario y obras complementarias en el municipio de Cartagena del Chaira departamento de Caquetá.	300.000.000,00	100.000.000,00	-	200.000.000,00	-	-	-	-	-	300.000.000	18057-18058
	Implementación de la estrategia de esquemas de pagos por servicios ambientales en el municipio de puerto rico en el departamento del Caquetá	566.390.602,95	-	-	-	-	-	566.390.602,95	-	-	-	-




	Implementación de un esquema de pago por servicios ambientales en el departamento del Caquetá	714.321.000,00				714.321.000,00				
	Fortalecimiento de la gestión integral de cambio climático en el departamento del Caquetá	187.780.000,00				187.780.000,00				
	Fortalecimiento a la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos	470.000.000,00				470.000.000,00				
	Fortalecimiento del programa de aprovechamiento del PGIRS del Municipio de San José del Fragua	230.000.000,00	30.000.000,00		200.000.000,00			230.000.000	18038-18039	183.700.000
	<b>Total Gestión del Riesgo</b>	<b>2.024.613.510,00</b>	<b>694.198.000,00</b>		<b>- 1.330.415.510,00</b>			<b>- 980.000.000</b>		<b>-</b>
	<b>Plan Gestión del Riesgo</b>	<b>2.024.613.510,00</b>	<b>694.198.000,00</b>		<b>- 1.330.415.510,00</b>			<b>- 980.000.000,00</b>		<b>-</b>
Gestión del Riesgo Sectorial	Ejecución de obras de mitigación del riesgo por el desabastecimiento de agua potable, en la bocatoma sobre la quebrada Las Margaritas, línea de aducción y PTAP Los Naranjos del municipio de La Montañita, departamento del Caquetá	980.000.000,00	479.498.000,00		00.502.000,00			980.000.000	18052-18053-18054	
	Apoyar a los municipios vinculados al PDA Caquetá en la atención de emergencias sectoriales de agua potable y saneamiento básico a los prestadores en caso que se supere la capacidad de respuesta local.	0,00			\$ 0,00					
	Construcción de viaducto para tubería de conducción del sistema de acueducto para el casco urbano del Municipio de Valparaiso	249.544.490,00			249.544.490,00					
	Recuperación y mitigación del riesgo para garantizar la prestación de servicios de acueducto, mediante la optimización de la captación de agua en los centros poblados de Guayabal y Puerto Betania del municipio de San Vicente del Caguán, departamento del Caquetá.	187.232.311,00			187.232.311,00					
	Construcción de muro de contención en el área de captación de agua sobre el río Caguán, fuente abastecedora del sistema de acueducto de la cabecera municipio de Cartagena del Chaira, en el Departamento de Caquetá.	607.836.709,00	214.700.000,00		393.136.709,00					
	<b>Total Gestión Social</b>	<b>350.000.000,00</b>			<b>- 350.000.000,00</b>			<b>- 350.000.000</b>		<b>-</b>
<b>Plan de Gestión Social</b>	<b>350.000.000,00</b>			<b>- 350.000.000,00</b>			<b>- 350.000.000</b>		<b>-</b>	
Gestión Social	Elaborar y entregar las piezas de divulgación escritas	55.000.000,00			55.000.000,00			55.000.000	19001	
	Distribución de piezas de comunicación orales	40.000.000,00			40.000.000,00			40.000.000	19001	
	Elaborar, producir y distribuir para su reproducción, las piezas para perifoneo	5.000.000,00			5.000.000,00			5.000.000	19001	
	Verificar que las obras que se encuentran en ejecución cuenten con el punto de atención o en su defecto, el respectivo buzón de sugerencias para el uso de la comunidad	3.000.000,00			3.000.000,00			3.000.000	19001	
	Promover que contratistas de obra cuenten con la ubicación de un espacio físico en el lugar de ejecución de la obra y/o proyecto en donde se ubique el punto de atención a la comunidad, el cual tenga establecido los días y horarios de atención	2.500.000,00			2.500.000,00			2.500.000	19001	
	Socializar a la comunidad beneficiaria de la obra y/o proyecto en ejecución del PDA Caquetá, la importancia y los aspectos relevantes del uso del buzón de sugerencias	4.200.000,00			4.200.000,00			4.200.000	19001	
	Realizar reunión de avance de obra o proyecto cuando su avance presupuestal sea igual o superior al 50% de ejecución en el marco del PDA Caquetá, con el fin de informar a la comunidad sobre las actividades desarrolladas en el tiempo transcurrido, imprevistos presentados y cualquier otra situación que beneficie o afecte su normal ejecución y cumplimiento de entrega en el tiempo establecido	3.000.000,00			3.000.000,00			3.000.000	19001	
	Realizar reunión para la rendición de cuentas en la obra o proyecto concluidos en el marco del PDA Caquetá, con el fin de informar a la comunidad beneficiada sobre los principales	3.000.000,00			3.000.000,00			3.000.000	19001	

resultados obtenidos en el balance general de la obra o de igual manera la rendición de cuentas del PDA Caquetá, dando a conocer todas las actividades desarrolladas durante el periodo												
Realizar reuniones extraordinarias en los eventos en que las obras y/o proyectos ejecutados en el marco del PDA Caquetá presenten novedades de suspensión, ampliación, prórroga en el tiempo de ejecución y/o terminación y liquidación anticipada, ya sea solicitada por el contratista ejecutor de la obra o por parte de la comunidad beneficiada, se coordinarán con los involucrados la fecha, lugar y hora, además de la convocatoria, escrita o por llamada para atender las inquietudes o solicitudes de la comunidad	3.000.000,00			3.000.000,00				3.000.000	19001			
Realizar recorridos en proyectos u obras en ejecución en el marco del PDA Caquetá con el equipo social y del equipo técnico del contratista, interventoría, prestador, municipio y veedores	4.200.000,00			4.200.000,00				4.200.000	19001			
Convocar y capacitar a los presidentes de las J.A.C. y la comunidad en general de los municipios donde se ejecutan proyectos u obras en el marco del PDA Caquetá, con el fin de establecer las pautas y directrices para la conformación de los Comités de Desarrollo y Control Social (CDCS), los vocales de control y comités de veeduría, de acuerdo con lo reglamentado por el Decreto 1429 de 1995	8.400.000,00			8.400.000,00				8.400.000	19001			
Fortalecer los Comités de Desarrollo y Control Social (CDCS), los vocales de control y comités de veeduría de los municipios donde se ejecuten proyectos u obras en el marco del PDA Caquetá	4.000.000,00			4.000.000,00				4.000.000	19001			
Acompañar las reuniones convocadas por los Comités de Desarrollo y Control Social (CDCS), los vocales de control y Comités de Veeduría de los municipios donde se ejecuten proyectos u obras en el marco del PDA Caquetá, que así lo requieran	2.500.000,00			2.500.000,00				2.500.000	19001			
Verificar que los Planes de Acompañamiento Social en Obra – PASO se encuentre acorde a los lineamientos establecidos por la Subdirección de Desarrollo Empresarial del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el cual deberá ser incorporado a los términos de referencia para la contratación de obras y, una vez inicien las estas deberá ser implementado por todos los contratistas	2.100.000,00			2.100.000,00				2.100.000	19001			
Realizar reuniones bimensuales con los equipos de gestión social de los contratistas para evidenciar la implementación del Plan de Gestión Social y el cumplimiento de metas acorde a lo propuesto	2.100.000,00			2.100.000,00				2.100.000	19001			
Apoyar al contratista y a las autoridades locales en la realización de reuniones de socialización y concertación en los municipios donde se ejecuten obras y/o proyectos en el marco del PDA Caquetá, teniendo en cuenta los aspectos socioculturales propios de las comunidades étnicas, así como los enfoques de género e inclusión social	2.100.000,00			2.100.000,00				2.100.000	19001			
Realizar capacitaciones en educación sanitaria a comunidades indígenas en donde se cuente con acceso a agua y saneamiento básico o en donde se estén desarrollando proyectos de los cuales sean beneficiarios por el PDA Caquetá	5.900.000,00			5.900.000,00				5.900.000	19001			
Desarrollo de Talleres de capacitación dirigidos a líderes comunitarios, autoridades locales, organizaciones de base comunitaria y demás actores en torno a las temáticas de Cultura de Pago y Uso Eficiente y Ahorro del Agua, Saneamiento Básico	15.000.000,00			15.000.000,00				15.000.000	19001			

DR



Costos Gestor	Valor	Fuente	Soportes		CDR	Valor Ejecutado Financiero (Expedición de Documento de Compromiso)	Valor Ejecutado (Pagos Realizados)
<p><b>COSTOS GESTOR</b></p> <p>Los Costos del Gestor del PEI Capítulo 2025 se asignan conforme a la Aprobación del Gobernador o Gobernadora del Departamento de Caquetá, de acuerdo con lo establecido en el ARTÍCULO 2.3.3.1.5.3. Plan Estratégico de Inversiones (PEI) del Decreto 1077 de 2015.</p> <p>Es pertinente manifestar que de acuerdo a lo establecido en dicho artículo, en caso de que el porcentaje de los Costos Gestor supere el 5%, la certificación de aprobación de los Costos Gestor para la vigencia suscrita por el Gobernador, deberá contener una justificación motivada que contenga el detalle de las acciones que generan un mayor costo, el cual debe estar relacionado con las funciones del Gestor, metas y cronograma establecidos para la respectiva vigencia así como las particularidades presentes en cada territorio.</p>	1.800.000.000,00	SGP DPTO	<p>Certificación Aprobación de Costos Gestor Capítulo 2025 Suscrita por el Gobernador del Departamento de Caquetá</p> <p>Fecha 07/01/2025</p>	<p>Certificación Cumplimiento de Costos Gestor Capítulo 2024 Suscrita por el Gobernador del Departamento de Caquetá Supervisor del Gestor del PDA</p> <p>Fecha 07/01/2025</p>	CDR 18037	\$ 1.800.000.000,00	670.620.000

	<b>DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ</b>	
	<b>Informe de Seguimiento del PEI</b>	<b>Versión 1.0 17/01/2020</b>

## 2. Informe Financiero septiembre - octubre de 2025.

### 2.2. Aportes del bimestre septiembre - octubre de 2025.

En el Seguimiento a los recursos enmarcados en el plan departamental de agua, con respecto a los Aportes de los entes vinculados al Plan Departamental de Agua para el periodo septiembre - octubre de 2025, es el siguiente:

DPTO/MUNICIPIO	SEPTIEMBRE 2025	OCTUBRE 2025	VALOR TOTAL 2025
DEPARTAMENTO SGP	1.373.927.550,00		5.856.252.913,00
DEPARTAMENTO NACION			0,00
DEPARTAMENTO PROPIOS			0,00
ALBANIA			213.073.742,00
BELEN DE LOS ANDAQUIES			0,00
CARTAGENA DEL CHAIRA			72.098.360,00
CURILLO			0,00
EL DONCELLO			0,00
EL PAUJIL			45.000.000,00
FLORENCIA			200.000.000,00
LA MONTAÑITA			413.856.137,35
MILAN			0,00
MORELIA SGP			150.000.000,00
MORELIA OTROS			0,00
PUERTO RICO			0,00
SAN JOSE DEL FRAGUA			0,00
SAN VICENTE DEL CAGUAN			322.000.000,00
SOLANO			43.015.192,00
SOLITA			0,00
VALPARAISO			311.000.000,00

(Componente Financiero PEI, 2025 – PDA Caquetá)

### 2.2. Informe de Rendimientos Financieros a septiembre - octubre de 2025.

El Patrimonio Autónomo FIA, encargado de gestionar, administrar y reportar la asignación de rendimientos Financieros a cada Fideicomitente, Directo o Indirecto, de conformidad con las políticas establecidas para tal fin, reporta informes para el mes de septiembre del 2025, de la siguiente manera, puesto que a la fecha del presente informe el consorcio no ha reportado el mes de octubre de 2025:

DPTO/MUNICIPIO	SEPTIEMBRE 2025	OCTUBRE 2025	VALOR TOTAL 2025
DEPARTAMENTO SGP	154.756.142,99		1.292.548.501,46
DEPARTAMENTO NACION	20.267.794,72		213.483.771,05
DEPARTAMENTO PROPIOS	11.297.985,08		105.471.484,70
ALBANIA	7.911.133,56		73.982.907,65
BELEN DE LOS ANDAQUIES	4.767.314,68		44.475.726,96
CARTAGENA DEL CHAIRA	12.019.702,40		111.802.130,79
CURILLO	5.102.605,23		47.615.614,34
EL DONCELLO	3.890.912,95		36.312.040,25
EL PAUJIL	1.009.330,42		8.145.530,72
FLORENCIA	25.543.379,99		236.076.443,14
LA MONTAÑITA	4.565.851,35		42.630.713,37
MILAN	4.181.441,31		39.022.561,78
MORELIA SGP	6.112.782,02		59.122.375,19
MORELIA OTROS	1.092.848,56		10.202.009,27
PUERTO RICO	6.929.910,88		64.684.325,85
SAN JOSE DEL FRAGUA	4.046.474,94		37.776.072,43
SAN VICENTE DEL CAGUAN	3.880.795,07		37.130.914,76
SOLANO	22.157.407,41		227.361.961,53
SOLITA	6.121.464,63		57.129.060,36
VALPARAISO	8.697.991,46		64.783.301,00

(Componente Financiero PEI, 2025 – PDA Caquetá)

### 2.3. CDRs Emitidos durante la vigencia 2024

DESCRIPCION EMPRESA	NUMERO DE CDR	TIPO DE GASTO	VALOR FINAL CDR	DESCRIPCION DEL CDR
CAQUETA	17966	PRE-INVERSION	300.000.000,00	ACTUALIZACIÓN Y AJUSTE DE LA FORMULACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA BOCATOMA Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SOLANO, DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ.
SOLANO-CAQUETA	17967	PRE-INVERSION	255.555.556,00	ACTUALIZACIÓN Y AJUSTE DE LA FORMULACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA BOCATOMA Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SOLANO, DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ.
SOLANO-CAQUETA	17968	INTERVENTORIA	44.444.444,00	INTERVENTORÍA A LA ACTUALIZACIÓN Y AJUSTE DE LA FORMULACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA BOCATOMA Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SOLANO, DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ.
CAQUETA	17969	PRE-INVERSION	165.000.000,00	ACTUALIZACIÓN Y AJUSTE DE LA FORMULACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN ETAPA UNO DEL COLECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO SOBRE LA RIVERA DE LA QUEBRADA LA SARDINA, MUNICIPIO DE FLORENCIA, DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ.
FLORENCIA - CAQUETA	17970	PRE-INVERSION	300.000.000,00	ACTUALIZACIÓN Y AJUSTE DE LA FORMULACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN ETAPA UNO DEL COLECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO SOBRE LA RIVERA DE LA QUEBRADA LA SARDINA, MUNICIPIO DE FLORENCIA, DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ.
CAQUETA	17971	INTERVENTORIA	35.000.000,00	INTERVENTORÍA A LA ACTUALIZACIÓN Y AJUSTE DE LA FORMULACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN ETAPA UNO DEL COLECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO SOBRE LA RIVERA DE LA QUEBRADA LA SARDINA, MUNICIPIO DE FLORENCIA, DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ.
CAQUETA	17972	INVERSION	550.869.752,26	REPOSICIÓN PARCIAL DEL ALCANTARILLADO BARRIO OASIS DEL MUNICIPIO DE PUERTO RICO -CAQUETÁ




PUERTO RICO - CAQUETA	17973	INVERSION	50.649.423,74	REPOSICIÓN PARCIAL DEL ALCANTARILLADO BARRIO OASIS DEL MUNICIPIO DE PUERTO RICO -CAQUETA
CAQUETA	17974	INTERVENTORIA	49.130.247,74	INTERVENTORIA A LA REPOSICIÓN PARCIAL DEL ALCANTARILLADO BARRIO OASIS DEL MUNICIPIO DE PUERTO RICO -CAQUETA
PUERTO RICO - CAQUETA	17975	INTERVENTORIA	4.517.254,26	INTERVENTORIA A LA REPOSICIÓN PARCIAL DEL ALCANTARILLADO BARRIO OASIS DEL MUNICIPIO DE PUERTO RICO -CAQUETA
CAQUETA	17976	INVERSION	1.516.315.956,78	OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ALCANTARILLADO URBANO EN EL MUNICIPIO DE ALBANIA DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
ALBANIA	17977	INVERSION	272.255.472,22	OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ALCANTARILLADO URBANO EN EL MUNICIPIO DE ALBANIA DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
CAQUETA	17978	INTERVENTORIA	89.428.571,00	INTERVENTORIA A LA OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ALCANTARILLADO URBANO EN EL MUNICIPIO DE ALBANIA DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
CAQUETA	17979	INVERSION	1.679.610.716,00	OPTIMIZACIÓN TRAMOS DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE MORELIA DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
MORELIA	17980	INVERSION	40.000.000,00	OPTIMIZACIÓN TRAMOS DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE MORELIA DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
CAQUETA	17981	INTERVENTORIA	120.372.750,00	INTERVENTORIA A LA OPTIMIZACIÓN TRAMOS DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE MORELIA DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
CAQUETA	17994	INVERSION	800.000.000,00	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO COMPACTADOR RECOLECTOR DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN DEPARTAMENTO DE CAQUETA
SAN VICENTE DEL CAGUAN	17995	INVERSION	175.673.225,00	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO COMPACTADOR RECOLECTOR DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN DEPARTAMENTO DE CAQUETA
CAQUETA	18037	ESTRUCTURA OPERATIVA	1.800.000.000,00	COSTOS DEL GESTOR CAPÍTULO 2025
CAQUETA	18038	OTROS	200.000.000,00	FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE APROVECHAMIENTO DEL PGIRS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA
SAN JOSE DE LA FRAGUA	18039	OTROS	30.000.000,00	FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE APROVECHAMIENTO DEL PGIRS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA
CAQUETA	18047	PRE-INVERSION	150.000.000,00	IMPLEMENTACIÓN DEL MECANISMO DEPARTAMENTAL DE VIABILIZACIÓN DE PROYECTOS
CAQUETA	18052	INVERSION	427.909.407,00	DESARROLLO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DEL RIESGO POR EL DESABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA BOCATOMA SOBRE LA QUEBRADA LAS MARGARITAS LÍNEA DE ADUCCIÓN Y PTAP LOS NARANJOS DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
LA MONTAÑITA	18053	INVERSION	479.498.000,00	DESARROLLO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DEL RIESGO POR EL DESABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA BOCATOMA SOBRE LA QUEBRADA LAS MARGARITAS LÍNEA DE ADUCCIÓN Y PTAP LOS NARANJOS DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
CAQUETA	18054	INTERVENTORIA	72.592.593,00	INTERVENTORIA AL DESARROLLO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DEL RIESGO POR EL DESABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA BOCATOMA SOBRE LA QUEBRADA LAS MARGARITAS LÍNEA DE ADUCCIÓN Y PTAP LOS NARANJOS DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
CAQUETA	18057	PRE-INVERSION	200.000.000,00	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS AMBIENTALES PARA EL TRÁMITE DE LA LICENCIA AMBIENTAL DEL PROYECTO -CONSTRUCCIÓN DEL RELLENO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE CARTAGENA DEL CHAIRÁ DEPARTAMENTO DE CAQUETA-
CARTAGENA DEL CHAIRA	18058	PRE-INVERSION	100.000.000,00	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS AMBIENTALES PARA EL TRÁMITE DE LA LICENCIA AMBIENTAL DEL PROYECTO -CONSTRUCCIÓN DEL RELLENO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE CARTAGENA DEL CHAIRÁ DEPARTAMENTO DE CAQUETA-
CAQUETA	19001	OTROS	350.000.000	PLAN DE GESTION SOCIAL 2025

(Componente Financiero PEI, 2024 – PDA Caquetá)

### 3. COMPONENTE DE ASEGURAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

#### 3.1. PLAN DE ASEGURAMIENTO 2025-2026 EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ.

Durante el mes de octubre de 2025, en el marco del Comité Directivo No. 59 del Plan Departamental de Agua del Caquetá, se aprobó la ejecución del Plan de Aseguramiento de la Prestación (PAP) 2025–2027, elaborado conforme a lo dispuesto en el artículo 2.3.3.1.2.3 del

	<b>DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ</b>	
	<b>Informe de Seguimiento del PEI</b>	<b>Versión 1.0 17/01/2020</b>

Decreto 1425 de 2019 y con el acompañamiento técnico del grupo de aseguramiento del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT).

El PAP 2025–2027 se estructura en torno a cuatro líneas estratégicas, cada una desarrollada dentro de su respectiva fase, para atender de manera integral los principales desafíos del sector:

- **Línea Estratégica 1 – Fase 1: Diagnóstico integral para el fortalecimiento de la gestión empresarial del prestador de servicios públicos.**

Contempla la realización de un diagnóstico integral que incluya los componentes institucional, legal, administrativo, financiero, comercial y técnico-operativo, permitiendo caracterizar el estado actual de la prestación de los servicios y establecer una línea base para la formulación de acciones de mejora.

- **Línea Estratégica 2 – Fase 2: Formulación de la estrategia para asegurar la prestación de los servicios públicos.**

Consiste en formular la estrategia para asegurar la prestación de los servicios públicos de agua potable y saneamiento básico, conforme al Decreto 1077 de 2015. Esta estrategia considerará alternativas como el fortalecimiento institucional, transformación empresarial o revisión de contratos de operación, basándose en los resultados del diagnóstico integral realizado.

- **Línea Estratégica 3 – Fase 3: Uso y destinación de los recursos SGP–APSB.**

Dirigida a implementar acciones de acompañamiento y asistencia técnica a las administraciones municipales y prestadores, con el objetivo de optimizar la planeación, ejecución y control de los recursos del Sistema General de Participaciones para Agua Potable y Saneamiento Básico (SGP–APSB), contribuyendo así a la reducción de los niveles de riesgo asociados a su manejo.

- **Línea Estratégica 4 – Fase 3: Calidad del agua.**

Enfocada en fortalecer la capacidad operativa de las Plantas de Tratamiento de Agua Potable (PTAP), mediante la dotación de equipos básicos de monitoreo y control, para garantizar el cumplimiento de los estándares de calidad establecidos por la normativa vigente y reducir el Índice de Riesgo de la Calidad del Agua (IRCA).

El Comité Directivo aprobó los recursos destinados a la ejecución del PAP, cuya implementación contempla tres procesos contractuales que se encuentran en fase de estructuración, en articulación con los componentes de Aseguramiento, Planeación y Jurídico del PDA.

En seguimiento a esta aprobación, el Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDR) No. 19534 fue expedido el 5 de noviembre de 2025, con un valor de \$443.582.092, con cargo a la fuente PA FIA – SGP Agua Potable y Saneamiento Básico, garantizando así la disponibilidad de recursos para el Plan de Aseguramiento 2025–2026.

Q

De acuerdo con el cronograma establecido, la etapa de estructuración y contratación se desarrollará en un plazo de dos meses, periodo durante el cual se consolidarán los insumos técnicos, financieros y jurídicos requeridos para su presentación ante el Comité de Contratación.

Con esta aprobación y asignación presupuestal, el PDA del Caquetá avanza hacia la ejecución efectiva del Plan de Aseguramiento, asegurando su desarrollo conforme a los lineamientos del MVCT y contribuyendo al fortalecimiento sostenible de los servicios de agua potable y saneamiento básico en el departamento.

### 3.2. PACA PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL AGUA - PACA.

En relación al proyecto Plan de Aseguramiento de Calidad de Agua "PACA", se han ejecutado los 8 subprogramas que los componen y actualmente se encuentra en proceso de cierre.

#### 3.2.1. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL AGUA - PACA.

PROGRAMA/SUBPROGRAMAS PACA	APROBADO PACA	CONTRATISTA	VALOR EJECUTADO	SALDO	VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO
Programa de Capacitación y Asistencia Técnica a los prestadores de Servicio de Acueducto	52.500.000,00		89.750.000,00	-37.250.000,00	
Subprograma de capacitación para operarios de planta de tratamiento.		María Angélica Losada Olarte	81.000.000,00		OK
Subprograma de capacitación para fontaneros		María Angélica Losada Olarte			OK
Subprograma de certificación en competencias laborales para operarios de acueducto		María Elza Morales García	8.750.000,00		OK
		María Elza Morales García		22.500.000,00	OK
Programa de Implementación equipo básico de control de calidad de agua	449.724.871,00		43.812.896,00	405.911.975,00	
Subprograma de mantenimiento y calibración externa de equipos existentes	43.812.896,00	CM y CIA Compañía Limitada	43.812.896,00		OK
Subprograma dotación kit básico de laboratorio	405.911.975,00	INGEODER PHARMA	491.521.838	54.950.360,36	OK
Programa de optimización del equipamiento de las PTAP	1.554.292.800,00	UTP PACA 2019	1.475.808.669,40	78.484.130,60	
Reposición de válvulas					OK
Reposición de módulos de sedimentación					
Reposición de lechos filtrantes					
Programa de optimización de sistemas de desinfección en las PTAP	306.450.000,00	UTP PACA 2019	326.053.080,60	-19.603.080,60	
Instalación de sistema de cloración de solución al vacío para la dosificación de gas cloro					OK
Instalación de bomba dosificadora para cloración con hipoclorito de calcio en solución					
Dotación de elementos de seguridad personales y colectivos para el manejo del cloro					
Programa de optimización de sistema dosificación de químicos (coagulantes y	262.536.000,00		175.045.000,00	87.491.000,00	

ayudantes de coagulación y/o estabilizadores de pH), para las PTAP convencionales.					
Realización de pruebas de tratabilidad		EN EJECUCIÓN		45.040.310,00	OK
3 dotación de sistema de dosificación de productos químicos		UTP PACA 2019	175.045.000,00		OK
3.1.6. Programa de macromedición para las PTAP	699.840.000,00	UTP PACA 2019	595.218.000,00	104.622.000,00	
Instalación de macromedición en entradas y salidas de las PTAP			595.218.000,00		OK
3.1.7. Programa de optimización de puntos de toma de muestras concertados en red de distribución	280.000.000,00		250.000.000,00	30.000.000,00	
Construcción de puntos de toma de muestras concertados		CONTRATAR SAS	250.000.000,00		OK
3.1.8. Programa de análisis de laboratorios físicoquímicos y microbiológicos para seguimiento y control de calidad de agua, en laboratorio autorizado por INS.	173.905.000,00	SERVAF S.A. E.S.P	147.116.992,36	26.788.007,64	OK
Interventoría a programas de: optimización del equipamiento de las PTAP, sistemas de desinfección en las PTAP, optimización de sistemas de dosificación de químicos para las PTAP convencionales (subprograma dotación de sistemas de dosificación de productos químicos) y macro medición.		JOSE MAURICIO ESPINEL GARNICA	166.972.800,00		OK

### 3.3. MUNICIPIOS CON FIRMA DE OTROSÍ Y MODIFICACIONES Y/O AUTORIZACIONES DE LOS RECURSOS DEL SGP-APSB CON DESTINO A INVERSIÓN AL PDA.

A continuación, se relacionan los dieciséis (16) municipios que conforman el departamento del Caquetá y que se encuentran vinculados al PDA Caquetá mediante convenio suscrito entre el Departamento, el municipio y el Gestor. Dichos entes territoriales reúnen los requisitos contemplados en el Decreto 1077 de 2015.

Municipio	Fecha Convenio U otrosí Vigente (DD/MM/AAA)	Estado Suscripción PAM	Fecha Suscripción PAM Vigente	Observaciones
Albania	28/08/2024	SUSCRITO	01/10/2024	Otrosí pendiente firma del Gobernador, con proyección de legalización en la semana del 18 al 22 de noviembre
Belén de los Andaquíes	18/10/2024	SUSCRITO	22/03/2024	Pendiente remisión de documentos por parte del municipio para suscripción del OTROSÍ 2025. Los documentos (CDP, formulario SARLAF, Certificado de compromisos vigentes, estados financieros, entre otros) fueron solicitados con oficio y mediante correo electrónico por parte del PDA, el municipio da respuesta el día 8 de septiembre de 2025 indicando que se encuentra en proceso de actualización del acuerdo municipal que autoriza aportes al PDA, programado para debatir en sesiones extraordinarias.
Cartagena del Chairá	09/10/2025	SUSCRITO	17/10/2024	Otrosí firmado el día 9 de octubre de 2025, pendiente transferencia.
Curillo	09/09/2025	SUSCRITO	15/03/2024	Otrosí firmado el día 9 de septiembre de 2025, pendiente transferencia.

El Doncello	28/10/2025	SUSCRITO	14/03/2024	Otrosí firmado el día 28 de octubre de 2025, pendiente transferencia.
El Paujil	NO SUSCRIBIO	SUSCRITO	13/03/2024	Pendiente remisión de documentos por parte del municipio para suscripción del OTROSÍ 2025. Los documentos (CDP, formularia SARLAF, Certificado de compromisos vigentes, estados financieros, entre otros) fueron solicitados con oficio y mediante correo electrónico por parte del PDA, dicha solicitud se realiza mensualmente.
Florencia	27/12/2024	SUSCRITO	16/09/2024	Otrosí pendiente firma del Gobernador, con proyección de legalización en la semana del 18 al 22 de noviembre
La Montañita	PENDIENTE	SUSCRITO	23/12/2024	Pendiente remisión de documentos por parte del municipio para suscripción del OTROSÍ 2025. Los documentos (CDP, formularia SARLAF, Certificado de compromisos vigentes, estados financieros, entre otros) fueron solicitados con oficio y mediante correo electrónico por parte del PDA, dicha solicitud se realiza mensualmente sin recibir respuesta alguna, La última solicitud se realizó el día 26 de septiembre de 2025.
Milán	09/09/2025	SUSCRITO	30/04/2025	Otrosí firmado el día 9 de septiembre de 2025, transferencia realizada el día 3 de octubre de 2025
Morelia	21/09/2025	SUSCRITO	10/12/2024	Otrosí firmado el día 21 de octubre de 2025, transferencia realizada el día 24 de octubre de 2025
Puerto Rico	26/10/2024	SUSCRITO	26/11/2024	Otrosí pendiente firma del Gobernador, con proyección de legalización en la semana del 18 al 22 de noviembre
San José del Fragua	22/09/2025	SUSCRITO	10/02/2025	Otrosí firmado el día 22 de septiembre de 2025, transferencia realizada el día 7 de octubre de 2025
San Vicente del Caguán	11/12/2024	SUSCRITO	10/03/2025	Otrosí pendiente firma del alcalde con proyección de legalización en la semana del 18 al 22 de noviembre
Solano	07/11/2024	SUSCRITO	26/02/2025	Otrosí pendiente firma del alcalde con proyección de legalización en la semana del 18 al 22 de noviembre
Solita	22/09/2025	SUSCRITO	11/04/2024	Otrosí firmado el día 22 de septiembre de 2025, pendiente transferencia,
Valparaíso	26/08/2025	SUSCRITO	25/07/2025	Otrosí firmado y transferencia realizada el 26 de agosto de 2025.

### 3.3.1. AUTORIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE GIRO DIRECTO DE LOS RECURSOS DEL SGP-APSB COMPROMETIDOS POR LOS MUNICIPIOS AL PDA CAQUETÁ

La modificación a la Autorización para Beneficiarios del Giro Directo de los Recursos del Sistema General de Participaciones para Agua Potable y Saneamiento Básico (SGP-APSB), se perfecciona a partir de la radicación y aprobación de la documentación correspondiente ante el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, la cual se evidencia a partir del giro de los recursos al Patrimonio Autónomo FIA.

Así las cosas, el proceso de proyección y afectación mensual de la Autorización de giro de los recursos comprometidos para la presente vigencia, ha sido efectuado por el municipio de

Valparaíso, teniendo en cuenta que los demás municipios se encuentran en proceso de firmas y remisión de documentos.

### 3.3.2. EL PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA - PDA REALIZA MESAS DE TRABAJO CON LOS ACTORES VINCULADOS PARA CONCERTAR LAS NECESIDADES PARA EL SECTOR APSB ANUALIDAD 2025 Y PROYECCIÓN A 2027.

El Gestor y Coordinador del Plan Departamental de Agua y su equipo de trabajo dan continuidad al proceso de concertación de necesidades en el sector de Agua Potable y Saneamiento Básico - APSB con los diferentes mandatarios de los municipios vinculados. Se realizó socialización de los avances obtenidos en las vigencias anteriores con los convenios tripartitos, la ejecución de los recursos y el impacto en los indicadores de línea base. Revisando los Planes de Acción municipales donde se propone el financiamiento de proyectos en pro de mejorar las condiciones y calidad de vida de las comunidades del Departamento.

### 3.4. SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE ACCIÓN MUNICIPAL

En este periodo se concertaron necesidades en el sector de Agua Potable y Saneamiento Básico con los municipios vinculados al PDA para las vigencias 2024-2027, definiendo las posibles fuentes de financiación de proyectos entre el Gestor y el municipio.




MUNICIPIO	NOMBRE PROYECTO / PROGRAMA / ACTIVIDAD	VALOR TOTAL (ESTIMADO)	AVANCE DEL PROYECTO
ALBANIA	Construcción del Tanque de almacenamiento en el municipio de Albania, Departamento de Caquetá.	1.324.561.409,00	Proyecto contratado por el municipio en la vigencia 2024
	Optimización de las redes de distribución de alcantarillado urbano en el municipio de Albania, departamento del Caquetá	1.878.000.000,00	Proyecto en proceso de viabilización
	Adecuación de la línea de conducción del acueducto municipal del casco urbano, cambiar tubería de asbesto cemento a PVC	245.000.000,00	Proyecto para ejecutar en la vigencia 2026
	Ampliación de red de distribución acueducto Centro poblado el Paraíso - "Agua a la Vereda"	550.000.000,00	Proyecto para ejecutar en la vigencia 2027
BELEN DE LOS ANDAQUIES	Canalización de 300 metros de aguas residuales del Caño San Francisco del municipio de Belén de los Andaquíes	1.840.595.681,50	
	Reposición de alcantarillado en el casco urbano	373.909.787,62	Proyecto pendiente de radicación por parte del municipio, ante el mecanismo viabilizador del PDA.
	Construcción de sistemas de tratamiento de aguas residuales en los centros poblados del municipio	1.306.628.212,23	Proyecto para ejecutar en la vigencia 2027
CARTAGENA DEL CHAIRA	Construcción de alcantarillado pluvial para recolección de aguas lluvias provenientes de los barrios Camilo Torres, Villa Chaira y Gaitán del municipio de Cartagena del Chaira departamento del Caquetá.	1.129.913.510,00	Proyecto contratado por el municipio en la vigencia 2024
	Construcción de muro de Contención para la reducción del riesgo en el área de Captación de Agua sobre el Río Caguán, Fuente Abastecedora del	644.613.510,00	Proyecto no ejecutado, se priorizan otras necesidades.

	Sistema de Acueducto en la Cabecera municipal de Cartagena del Chairá, departamento de Cauquetá		
	Elaboración de estudios ambientales para el trámite de la licencia ambiental del proyecto "construcción del relleno sanitario y obras complementarias en el municipio de Cartagena del Chairá departamento de Cauquetá"	300.000.000,00	Proyecto pendiente de radicación por parte del municipio, ante el mecanismo viabilizador del PDA.
	Construcción del relleno sanitario y obras complementarias en el municipio de Cartagena del Chaira departamento de Cauquetá.	1.114.700.000,00	Proyecto para ejecutar en la vigencia 2026
	Optimización del sistema de captación del agua cruda sobre el río Caguán, para abastecer el sistema de acueducto del municipio de Cartagena del Chaira	1.425.464.475,74	Proyecto para ejecutar en la vigencia 2027
CURILLO	Construcción de alcantarillado sanitario entre las calles 9° a la 11° y entre las carreras del 2° al 4° del municipio de Curillo – Cauquetá	667.603.489,00	Proyecto contratado por el municipio en la vigencia 2024
	Elaboración del plan maestro de acueducto y alcantarillado (incluye catastro de redes) del municipio de Curillo, en el departamento de Cauquetá.	400.000.000,00	Proyecto no ejecutado, se priorizan otras necesidades.
	Dotación de equipos para la medición de agua (macro medidores) y de llenado automático para la planta de tratamiento de agua potable de Curillo.	50.000.000,00	Proyecto no ejecutado, se priorizan otras necesidades.
	Construcción y reposición de la primera fase de red de alcantarillado sanitario en el barrio Turbay del municipio de Curillo departamento del Cauquetá	693.000.000,00	Proyecto para ejecutar en la vigencia 2026
	Construcción de tanque elevado de distribución de agua potable con capacidad de 100 metros cúbicos	500.000.000,00	Proyecto para ejecutar en la vigencia 2027
EL DONCELLO	Reposición de alcantarillado sanitario barrio la Libertad, municipio de el Doncello departamento del Cauquetá	243.876.000,00	Proyecto contratado por el municipio en la vigencia 2024
	Adquisición de un vehículo compactador - para la recolección de residuos sólidos del Municipio de El Doncello.	1.000.000.000,00	Proyecto para ejecutar en la vigencia 2026
	Construcción de nuevo tanque de almacenamiento de agua potable para la cabecera municipal del Doncello	1.000.000.000,00	Proyecto para ejecutar en la vigencia 2027
EL PAUJIL	Estudios y diseño para la construcción del Acueducto y Alcantarillado del centro poblado Versalles en el municipio El Paujil.	100.000.000,00	Proyecto pendiente de radicación por parte del municipio, ante el mecanismo viabilizador del PDA.
	Estudios y diseño para la construcción del Acueducto del centro poblado Bolivia del municipio El Paujil.	120.000.000,00	Proyecto pendiente de radicación por parte del municipio, ante el mecanismo viabilizador del PDA.
	Estudios y diseño para la Optimización sistema de acueducto en sus componentes de captación, desarenador, conducción, PTAP, tanque de almacenamiento y red de distribución para el municipio de El Paujil - Cauquetá	273.232.694,00	Proyecto pendiente de radicación por parte del municipio, ante el mecanismo viabilizador del PDA.
	Construcción del Acueducto y Alcantarillado del centro poblado Versalles en el municipio de El Paujil	276.155.771,00	Proyecto pendiente de radicación por parte del municipio, ante el mecanismo viabilizador del PDA.
	Construcción del Acueducto del centro poblado Bolivia del municipio El Paujil.	276.155.771,00	Proyecto para ejecutar en la vigencia 2026
	Optimización sistema de acueducto en sus componentes de captación, desarenador, conducción, PTAP, tanque de almacenamiento y red de distribución para el municipio de El Paujil - Cauquetá	1.104.623.084,00	Proyecto para ejecutar en la vigencia 2027

FLORENCIA	Construcción del sistema de alcantarillado del barrio la esmeralda del municipio de Florencia, departamento del Caquetá	1.746.585.992,00	
	Reformulación del proyecto "construcción etapa uno del colector de alcantarillado sanitario sobre la rivera de la quebrada la sardina. Municipio de Florencia, departamento de Caquetá"	500.000.000,00	Contratado por el municipio en la vigencia 2025
	Realizar los estudios y diseños para la construcción del sistema de alcantarillado del asentamiento de Paloquemado del municipio de Florencia, departamento del Caquetá	500.000.000,00	Proyecto no ejecutado, se priorizan otras necesidades.
LA MONTAÑITA	Ejecución de obras de mitigación del riesgo por el desabastecimiento de agua potable, en la bocanoma sobre la quebrada Las Margaritas, línea de aducción y PTAP Los Naranjos del municipio de La Montañita, departamento del Caquetá	980.000.000,00	
	Optimización de la Planta de Tratamiento de agua potable PTAP en la inspección de Mate guadua del municipio de La Montañita Caquetá.	964.239.000,00	
	Optimización sistema de acueducto vereda Itarca municipio de La Montañita departamento de Caquetá	853.000.000,00	Proyecto para ejecutar en la vigencia 2026
	Optimización de la red de alcantarillado sanitario en la inspección de Santuario del municipio de La Montañita Caquetá.	1.186.429.799,70	Proyecto para ejecutar en la vigencia 2027
MILAN	Canalización de aguas lluvias en la calle 4, entre cra 2 a la cra 6, del casco urbano de la inspección de San Antonio de Getuchá, en el municipio de Milán, departamento del Caquetá.	1.057.248.000,00	
	Construcción de acueducto rural para las veredas La Rastra y El Diamante la Diez en el municipio de Milán.	300.000.000,00	Proyecto pendiente de radicación por parte del municipio, ante el mecanismo viabilizador del PDA.
	Optimización de la planta de tratamiento de agua residuales PTAR de la cabecera municipal de Milán departamento de Caquetá	300.000.000,00	Proyecto para ejecutar en la vigencia 2026
	Optimización de la planta de tratamiento de agua residuales PTAR inspección de Remolinos de Aricuntí municipio de Milán departamento de Caquetá.	255.248.000,00	Proyecto para ejecutar en la vigencia 2027
MORELIA	Mejoramiento del sistema de captación mediante la ejecución de obras de mitigación del riesgo para el desabastecimiento sobre la quebrada La Batea en el municipio de Morelia	516.911.936,00	Proyecto en proceso de contratación.
	Optimización de tramos de alcantarillado en el municipio de Morelia departamento del Caquetá	1.840.000.000,00	Proyecto en proceso de viabilización
	Construcción tercera etapa sistema de alcantarillado municipio de Morelia departamento de Caquetá.	11.000.000.000,00	Proyecto pendiente de radicación por parte del municipio, ante el mecanismo viabilizador del PDA.
	Fortalecimiento institucional Creación Empresa de Servicios Públicos de Morelia (ESP).	225.000.000,00	Proyecto pendiente de radicación por parte del municipio, ante el mecanismo viabilizador del PDA.
	Construcción fuente alterna con energía renovable para sistema de bombeo PTAP del municipio de Morelia departamento de Caquetá.	225.000.000,00	Proyecto para ejecutar en la vigencia 2026
	Reposición sistema de alcantarillado sanitario municipio de Morelia departamento de Caquetá.	225.000.000,00	Proyecto para ejecutar en la vigencia 2027

PUERTO RICO	Reposición parcial del alcantarillado del barrio Oasis del municipio de Puerto Rico departamento de Caquetá.	655.166.678,00	Proyecto en proceso de contratación.
	Construcción de una planta de tratamiento de agua potable (PTAP), para el centro poblado del corregimiento de Rio Negro, municipio de Puerto Rico – Caquetá.	957.000.000,00	Pendiente por definir vigencia y aportes.
	Construcción de muro y captación alterna de agua sobre la quebrada La Conga, fuente abastecedora del sistema de acueducto de la cabecera municipal de Puerto Rico Caquetá	620.425.000,00	Pendiente por definir vigencia y aportes.
	Fase II construcción colectores interceptores sobre quebrada Las Damas, en los barrios: Las Damas, El Triunfo, Libertador, Las Américas y San Fernando, en el municipio de Puerto Rico, departamento de Caquetá.	457.000.000,00	Pendiente por definir vigencia y aportes.
	Construcción del colector de aguas lluvias de las calles 4° y 6° del casco urbano del municipio de Puerto Rico"	457.000.000,00	Pendiente por definir vigencia y aportes.
	Construcción de una planta de tratamiento de agua potable (PTAP) para el centro poblado de la vereda La Chipa Baja, municipio de Puerto Rico – Caquetá.	791.367.310,83	Proyecto no ejecutado, se priorizan otras necesidades.
	Fase III construcción colectores interceptores sobre quebrada Las Damas, en los barrios: Las Damas, El Triunfo, Libertador, Las Américas y San Fernando, en el municipio de Puerto Rico, departamento de Caquetá.	1.000.000.000,00	Pendiente por definir vigencia y aportes.
	Implementación del programa de gestión por demanda y sectorización.	600.000.000,00	Pendiente por definir vigencia y aportes.
	Estudios y diseños para la automatización y optimización de la planta de tratamiento de agua potable del municipio de Puerto Rico departamento del Caquetá.	220.000.000,00	Pendiente por definir vigencia y aportes.
	Estudios y diseños para la construcción de la PTAR, del municipio de Puerto Rico departamento del Caquetá.	120.000.000,00	Pendiente por definir vigencia y aportes.
Implementar el programa de aprovechamiento residuos sólidos definidos en el PGIRS del municipio de Puerto Rico, Caquetá	500.000.000,00	Pendiente por definir vigencia y aportes.	
SAN JOSE DEL FRAGUA	Construcción Celda de disposición final Relleno Sanitario El Cairo Municipio de San José del Fragua	929.730.612,00	Contratado por el municipio en la vigencia 2024
	Ampliación planta de tratamiento de agua potable casco urbano (PTAP) construcción de módulo adicional (Floculador, sedimentador, filtros y tanque de almacenamiento) Municipio de San José del Fragua, en el departamento de Caquetá.	1.100.000.000,00	
	Fortalecimiento del programa de aprovechamiento del PGIRS del municipio de San José del Fragua	230.000.000,00	
	Carro compactador recolector de residuos sólidos para la inspección de Yurayaco, Fraguita y Sabaleta del municipio de San José del Fragua departamento de Caquetá.	1.000.000.000,00	Proyecto para ejecutar en la vigencia 2027
SAN VICENTE DEL CAGUÁN	Adquisición de carro compactador, recolector de residuos sólidos para el casco urbano de San Vicente del Caguán	1.000.000.000,00	

	Optimización sistema de alcantarillado en barrios del casco urbano del Municipio de San Vicente del Caguán Departamento de Caquetá	317.621.653,53	Proyecto pendiente de radicación por parte del municipio, ante el mecanismo viabilizador del PDA.
	Optimización de la planta de tratamiento de agua potable mediante la adecuación de la planta de bombeo y filtros de la PTAP del Municipio de San Vicente del Caguán	600.000.000,00	Proyecto pendiente de radicación por parte del municipio, ante el mecanismo viabilizador del PDA.
	Construcción acueducto y alcantarillado centro poblado Piscinas del municipio de San Vicente departamento de Caquetá	116.000.000,00	Proyecto pendiente de radicación por parte del municipio, ante el mecanismo viabilizador del PDA.
	Compra de Micromedidores	200.000.000,00	Proyecto pendiente de radicación por parte del municipio, ante el mecanismo viabilizador del PDA.
	Manejo de Aguas Lluvias en el Centro	500.000.000,00	Proyecto pendiente de radicación por parte del municipio, ante el mecanismo viabilizador del PDA.
	Optimización sistema de alcantarillado en barrios del casco urbano del Municipio de San Vicente del Caguán Departamento de Caquetá	250.000.000,00	Proyecto para ejecutar en la vigencia 2026
	Construcción de tramo de alcantarillado pluvial en la vía Circunvalar del casco urbano del municipio de San Vicente del Caguán	600.000.000,00	Proyecto para ejecutar en la vigencia 2027
<b>SOLANO</b>	Reconstrucción del sistema de suministro de agua para la inspección de Mononguete del municipio de Solano departamento de Caquetá.	2.900.000.000,00	
	Adquisición de vehículo compactador recolector de residuos sólidos para el municipio de Solano departamento del Caquetá.	1.000.000.000,00	
	Construcción del relleno sanitario y obras complementarias en el municipio de Solano, departamento de Caquetá.	1.299.265.979,00	Pendiente para ejecutar en 2025
	Reformulación de los Estudios y diseños para la construcción de una nueva bocatoma para el acueducto del casco urbano del municipio de Solano, departamento de Caquetá.	600.000.000,00	Proyecto pendiente de radicación por parte del municipio, ante el mecanismo viabilizador del PDA.
	Construcción de Planta de Tratamiento de Agua Potable para el centro poblado las Mercedes del municipio de Solano departamento de Caquetá	900.000.000,00	Proyecto para ejecutar en la vigencia 2026
	Construcción del acueducto y alcantarillado de los 29 resguardos indígenas del municipio de Solano departamento de Caquetá.	2.000.000.000,00	Proyecto para ejecutar en la vigencia 2027
<b>SOLITA</b>	Construcción del Sistema de Alcantarillado en el municipio de Solita departamento del Caquetá	700.000.000,00	Proyecto pendiente de radicación por parte del municipio, ante el mecanismo viabilizador del PDA.
	Optimización del sistema de Acueducto en el municipio de Solita departamento del Caquetá	1.500.000.000,00	Proyecto para ejecutar en la vigencia 2026
	Reposición del Sistema de Alcantarillado en el municipio de Solita departamento del Caquetá	180.620.703,52	Proyecto para ejecutar en la vigencia 2027
<b>VALPARAÍSO</b>	Construcción del alcantarillado sanitario y su sistema de tratamiento de aguas residuales (PTAR) del centro poblado Santiago de la Selva del municipio de Valparaíso, departamento de Caquetá (Primer Fase)	1.457.241.000,00	Pendiente de permisos
	Implementación del programa de gestión por demanda y sectorización.	500.000.000,00	Pendiente radicación por parte del municipio

	<b>DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ</b>	
	<b>Informe de Seguimiento del PEI</b>	<b>Versión 1.0</b> <b>17/01/2020</b>



Construcción del sistema de acueducto y planta de tratamiento de agua potable (PTAP) en el centro poblado Playa Rica del municipio de Valparaíso, departamento de Caquetá	1.400.000.000,00	Proyecto para ejecutar en la vigencia 2026
Construcción de Acueducto Rural Núcleo La Florida en el municipio de Valparaíso, departamento de Caquetá	810.000.000,00	Proyecto para ejecutar en la vigencia 2027

### 3.5. ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL.

Durante los meses de septiembre y octubre de 2025, el grupo interdisciplinario del Componente de Aseguramiento adelantó diversas acciones orientadas al fortalecimiento de las capacidades institucionales de los actores municipales y regionales responsables de la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo.

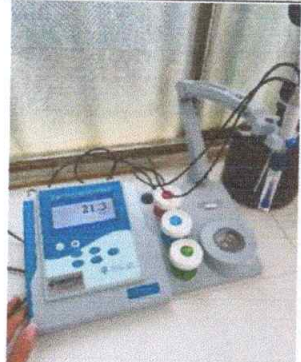

Estas actividades, de carácter operativo, técnico, administrativo, comercial y financiero, se desarrollaron con el propósito de fortalecer la gestión de los prestadores y promover la sostenibilidad de las inversiones y de la prestación de los servicios públicos en el mediano y largo plazo.



A continuación, se relacionan las principales acciones de fortalecimiento institucional ejecutadas durante este periodo:

TEMA	MUNICIPIO	PARTICIPANTES	REGISTRO FOTOGRÁFICO
Fortalecimiento institucional en el municipio de La Montañita sobre la importancia de la tarifa y micro medición de los servicios de acueducto, aseo y alcantarillado.	La Montañita	Empresa de servicios públicos y comunidad	
Asistencia técnica en la revisión de indicadores sectoriales APSB, normativa y marcos tarifarios aplicables a los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y ase	Solita	Empresa de servicios públicos	

<p>Fortalecimiento institucional en el municipio de Morelia, sobre la importancia de la tarifa y micro medición de los servicios de acueducto, aseo y alcantarillado.</p>	<p>Morelia</p>	<p>Empresa de servicios públicos y comunidad</p>	
<p>Asistencia técnica en la revisión de indicadores sectoriales APSB, normativa y marcos tarifarios aplicables a los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y ase</p>	<p>Valparaíso</p>	<p>Empresa de servicios públicos</p>	
<p>Asistencia institucional para el seguimiento compromiso de aportes y suscripción de otros vigencia 2025</p>	<p>La Montañita</p>	<p>Secretaria de planeación y Hacienda</p>	
<p>Asistencia técnica a la Empresa de Servicios públicos del municipio de Cartagena del Chairá Emserpucar S.A. E.S.P</p>	<p>Cartagena del Chaira</p>	<p>asesora ambiental de la empresa de servicios</p>	

92

<p>Asistencia técnica a la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS GRANO DE ORO (Fundación para el Desarrollo Social Comunitario Oxígeno) Y ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS LA ESMERALDA</p>	<p>Puerto Rico</p>	<p>Gestores</p>	
<p>Asistencia técnica a la Empresa prestadora de los servicios públicos domiciliarios en el municipio Morelia Caquetá AGUA RICA S.A.S E.S.P.</p>	<p>Morelia</p>	<p>Jefe oficina de servicios públicos y personal operativo</p>	
<p>Asistencia técnica a la Empresa prestadora de los servicios públicos domiciliarios en el municipio de Solita Emsersol S.A E.S.P</p>	<p>Solita</p>	<p>Personal Operativo</p>	
<p>Asistencia técnica a la Empresa prestadora de los servicios públicos domiciliarios en el municipio de El Doncello S.A. E.S:P</p>	<p>El Doncello</p>	<p>Personal Operativo</p>	

<p>Capacitación técnica operativa en la oficina de servicios públicos de Morelia</p>	<p>Morelia</p>	<p>gerente personal operativo</p>	
<p>Capacitación técnica operativa en la Empresa de Servicios públicos del municipio de Solita Emsersol S.A. E.S.P en <u>Manejo de Equipos de Laboratorio</u></p>	<p>Solita</p>	<p>Personal operativo planta de tratamiento de la empresa de servicios públicos</p>	

Fuente: (Aseguramiento, 2025)

92

## PROYECTOS

### Proyectos Viabilizados.

Municipio	Nombre del Proyecto/Actividad	Servicio(s)	Ubicación	Valor (Pesos)	Valor por Fuente				Número de Comité	Fecha de Presentación al Comité Técnico	Estado
					Municipio	Departamento	Nación	Otro			
Albania	Optimización de las Redes de Distribución de Alcantarillado Urbano en el municipio de Albania, departamento del Caquetá	Alcantarillado	Urbano	1.878.000.000	272.255.472,22	1.605.744.527,78			Comité Técnico 03 de 2024	23 de diciembre de 2024	APROBADO
									Comité Técnico 01 de 2025	14 de agosto de 2025	APROBADO AJUSTES
La Montañita	Desarrollo Ejecución de Obras de Mitigación del Riesgo por el Desabastecimiento de Agua Potable, en la Bocatoma sobre la quebrada Las Margaritas Línea de Aducción y PTAP los Naranjos del municipio de La Montañita, departamento del Caquetá	Acueducto	Urbano	970.925.925	479.498.000	491.427.925			Comité Técnico 03 de 2024	23 de diciembre de 2024	APROBADO
									Comité Técnico 01 de 2025	14 de agosto de 2025	APROBADO AJUSTES
									Comité Técnico 02 de 2025	07 de noviembre de 2025	APROBADO AJUSTES
Morella	Optimización de tramos de Alcantarillado, en el municipio de Morella, departamento de Caquetá"	Alcantarillado	Urbano	1.839.983.466	40.000.000,0	1.799.983.466,0			Comité Técnico 03 de 2024	23 de diciembre de 2024	APROBADO
									Comité Técnico 01 de 2025	14 de agosto de 2025	APROBADO AJUSTES
Albania	Construcción Tanque de Almacenamiento de Agua Potable para el municipio de Albania."	Acueducto	Urbano	1.324.561.409	553.561.409	771.000.000			Comité Técnico 05 de 2024	16 de noviembre de 2023	APROBADO
Cartagena del Chairá	Construcción de Alcantarillado Pluvial Para Recolección de Aguas Lluvias Provenientes de los barrios Camilo Torres, Villa Chaira y Gaitán del municipio de Cartagena del Chairá departamento del Caquetá	Alcantarillado	Urbano	1.129.913.510	1.000.000.000	129.913.510			Comité Técnico 05 de 2024	16 de noviembre de 2023	APROBADO
Solano	Construcción del Relleno Sanitario y Obras Complementarias en el municipio de Solano – Caquetá Fase 1	Aseo	Urbano	1.299.265.979	1.299.265.979	0			Comité Técnico 05 de 2024	16 de noviembre de 2023	APROBADO

<b>Curillo</b>	Construcción de Alcantarillado Sanitario entre las calles 9ª al 11 y entre las carreras del 2ª al 4ª del municipio.	Alcantarillado	Urbano	667.603.489	393.987.677	273.615.812		Comité Técnico 01 de 2024	02 de octubre de 2024	<b>APROBADO</b>
<b>Milán</b>	Adecuación y Canalización de Aguas Lluvias en la Calle 4, entre Cra 2 a la Cra 6, del casco urbano de la inspección de San Antonio de Getuchá, en el municipio de Milán, departamento del Caquetá.	Alcantarillado	Urbano	1.057.248.000	555.248.000	502.000.000		Comité Técnico 01 de 2024	02 de octubre de 2024	<b>APROBADO</b>
<b>San José del Fragua</b>	Construcción Celda de Disposición Final Relleno Sanitario El Cairo, municipio de San José del Fragua.	Aseo	Urbano	929.730.612	529.730.612	400.000.000		Comité Técnico 02 de 2024	31 de octubre de 2024	<b>APROBADO</b>
<b>Solano</b>	Adquisición de Vehículo Compactador Recolector de Residuos Sólidos para el municipio de Solano departamento del Caquetá.	Aseo	Urbano	975.673.225	500.000.000	475.673.225		Comité Técnico 02 de 2024	31 de octubre de 2024	<b>APROBADO</b>
<b>San Vicente del Caguán</b>	Adquisición de Vehículo Recolector de Residuos Sólidos para la Prestación del Servicio Público de Aseo en el municipio de San Vicente del Caguán del departamento de Caquetá	Aseo	Urbano	975.673.225	175.673.225	800.000.000		Comité Técnico 03 de 2024	23 de diciembre de 2024	<b>APROBADO</b>
<b>Puerto Rico</b>	Reposición Parcial del Alcantarillado barrio Oasis municipio de Puerto Rico Caquetá	Alcantarillado	Urbano	655.166.678	55.166.678	600.000.000		Comité Técnico 03 de 2024	23 de diciembre de 2024	<b>APROBADO</b>

### Proyectos en Proceso de Contratación.

Municipio	Nombre del Proyecto/Actividad	Estado	Servicio(s)	Ubicación	Valor (Pesos)	Fuente(s)	Fecha de Publicación en el SECOP	Observaciones
<b>Morelia</b>	Realizar la Interventoría Integral, la cual efectuará el seguimiento de los aspectos Contractuales, Técnicos, Administrativos, Financieros, Sociales y Ambientales al Contrato de Obra cuyo objeto es: Optimización Tramos de Alcantarillado en el municipio de Morelia, departamento del Caquetá.	Contrato Celebrado	Alcantarillado	Urbano	120.372.750	Componente en Infraestructura en Agua y Saneamiento PA FIA - SGP - Agua Potable y Saneamiento Básico	15/09/2025	Contrato celebrado el 20 de octubre del 2025.

Proyectos en Ejecución y/o Suspendidos

Municipio(s)	Nombre del Proyecto/Actividad	Estado	Ubicación	Valor Contratado	Valor Adiciones	% de Ejecución	Avance Financiero	No de Prorrugas	No de Suspensiones	Fecha de Terminación (Real o Estimado)
San José del Fragua	Realiza la Interventoría Técnica, Administrativa y Financiera al Contrato que tiene por Objeto "Reposición y Mejoramiento de la Segunda Etapa de la Red de Alcantarillado Sanitario de la inspección de Fragueta municipio de San José del Fragua, Caquetá"	Proceso de Liquidación	Urbano	46.300.144,5	0	100%	0%	0	0	26/12/2023
Albania	Construcción de Box Coulvert 2.00 X 1.50 m en el barrio Villa Demo, Calle 1ra y 2da sur del municipio de Albania, departamento de Caquetá	Liquidado	Rural	554.237.748	0	100%	86,72%	0	0	16/11/2023
Albania	Realizar la Interventoría Técnica, administrativa y Financiera al contrato que tiene por Objeto "Construcción de Box Coulvert 2.00 X 1.50 m - barrio Villa Demo calle 1ra y 2da sur del municipio de Albania, departamento de Caquetá"	Liquidado	Rural	41.626.200	0	100%	100%	0	0	16/11/2023
Belén de los Andaquíes	Optimización del Sistema de Acueducto (Adecuación Bocatoma, Desarenador, Cambio Red de Conducción, Adecuación PTAP) para el municipio de Belén de los Andaquíes - Caquetá	Suspendido	Urbano	1.973.850.210	984.238.953	84%	79%	3	4	20/10/2025
Belén de los Andaquíes	Interventoría para la Optimización del Sistema de Acueducto (Adecuación Bocatoma, Desarenador, Cambio de Red de Conducción, Adecuación PTAP) para el municipio de Belén de los Andaquíes. - Caquetá	Terminación Anticipada	Urbano	157.862.574	78.840.401	84%	58%	3	4	17/10/2025
Milán	Construcción del Acueducto Incluye PTAP de San Antonio de Getuchá - municipio de Milán - departamento del Caquetá	Liquidado	Rural	1.735.052.751	0	100%	0%	3	2	20/12/2023
Milán	Interventoría Integral (Técnica, Administrativa, Contable, Financiera, Jurídica y Ambiental) al Contrato de obra que tiene por Objeto: "Construcción del Acueducto Incluye PTAP de San Antonio de Getuchá - municipio de Milán - departamento del Caquetá"	Liquidado	Rural	93.677.847	0	100%	0%	3	2	20/12/2023
Valparaíso	Interventoría Integral (Técnica, Administrativa, Financiera, Contable y Jurídica) del contrato que tiene por Objeto "Optimización del Sistema de Acueducto para el casco urbano del municipio de Valparaíso - Caquetá"	Liquidado	Rural	110.148.311	0	100%	100%			06/10/2022
Florencia	Mejoramiento de la Calidad de Vida de la Población Vulnerable de Florencia en el departamento del Caquetá, a través de la Ampliación del Sistema de	En ejecución	Urbano	8.178.120.849	0	67%	44,46%	3	2	15/02/2026

Municipio(s)	Nombre del Proyecto/Actividad	Estado	Ubicación	Valor Contratado	Valor Adiciones	% de Ejecución	Avance Financiero	No de Prorrugas	No de Suspensiones	Fecha de Terminación (Real o Estimado)
	Acueducto para los barrios: Villa Clara, Nápoles, Villa Real y El Timmy. Florencia.									
Florencia	Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera y Ambiental al contrato de Obra Civil que tiene por Objeto "El Mejoramiento de la Calidad de Vida de la Población Vulnerable de Florencia en el departamento del Caquetá, a través de la Ampliación del Sistema de Acueducto para los barrios: Villa Clara, Nápoles, Villa Real y El Timmy – Caquetá.	En ejecución	Urbano	817.839.648	0	67%	44,46%	3	2	15/02/2026
Florencia	Interventoría Integral (Técnica, Administrativa, Contable, Jurídica y Ambiental) Al Contrato de Obra que por Objeto: Construcción de Box Couvert de Canal Cerrado en el Caño Brisas del Hacha ubicado en la Comuna Norte del municipio de Florencia, Caquetá.	Liquidado	Urbano	252.381.150	126.190.575	100%	90,49%	4	4	08/10/2021
Florencia	Realizar los Estudios y Diseños para la Construcción del Sistema de Alcantarillado del Barrio La Esmeralda del municipio de Florencia, departamento del Caquetá	Liquidado	Urbano	55,000,000	0	100%	100%	1	1	31/10/2024
La Montañita	"Construcción de la Red de Distribución de Agua Potable barrio Las Palmas en el municipio de La Montañita Caquetá"	Liquidado	Urbano	584,457,962	0	100%	100%	0	2	09/02/2024
La Montañita	Realizar Interventoría Técnica, Administrativa y Financiera al Contrato que tiene por Objeto "Construcción de la Red de Distribución de Agua Potable barrio Las Palmas en el municipio de La Montañita Caquetá"	Proceso de Liquidación	Urbano	58,295,125.00	0	100%	0%	0	2	09/02/2024
Morelia	Construcción Red de Acueducto y Planta de Tratamiento de Agua Potable para el casco urbano del municipio de Morelia - departamento de Caquetá	Liquidado	Urbano	3.500.000.000	0	100%	100%	3	0	22/05/2025
Morelia	"Interventoría Integral Técnica, Administrativa, Financiera, Contable, Jurídica y Ambiental al Contrato de Obra cuyo Objeto es "Construcción Red de Acueducto y Planta de Tratamiento de Agua Potable para el casco urbano del municipio de Morelia - departamento de Caquetá"	Proceso de Liquidación	Urbano	332,343,200	0	100%	0%	3	0	22/05/2025
Morelia	Realizar la Interventoría, Técnica, Jurídica, Administrativa y Contable del Contrato que tiene por objeto: Construcción de Tramos de Alcantarillado en el municipio de Morelia, departamento de Caquetá.	En Proceso de Liquidación	Urbano	98.313.249	0	100%	0%	1	0	28/02/2025
Belén de los Andaquíes	Realizar Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental al contrato que tiene por objeto	Liquidado	Rural	38.297.047	0	100%	100%	0	0	31/05/2024




Municipio(s)	Nombre del Proyecto/Actividad	Estado	Ubicación	Valor Contratado	Valor Adiciones	% de Ejecución	Avance Financiero	No de Prórrogas	No de Suspensiones	Fecha de Terminación (Real o Estimado)
	"Reposición del sistema de alcantarillado del Centro Poblado Rural Puerto Torres del municipio de Belén de los Andaquíes-Caquetá"									
Albania	Construcción Tanque de Almacenamiento de Agua Potable para el municipio de Albania.	En ejecución	Urbano	1.246.013.627	126.017.227	20%	0%	0	0	14/02/2026
	Realizar la Interventoría Integral, la cual efectuará el seguimiento de los aspectos Contractuales, Técnicos, Administrativos, Financieros, Sociales y Ambientales al contrato de obra cuyo Objeto es: Construcción Tanque de Almacenamiento de Agua Potable para el municipio de Albania	En ejecución	Urbano	76.524.193	0	20%	0%	0	0	14/02/2026
Cartagena del Chaira	Construcción de Alcantarillado Pluvial para la Recolección de Aguas Lluvias Provenientes de los barrios Camilo Torres, Villa Chaira y Alonso Gaitán del municipio de Cartagena del Chaira departamento del Caquetá.	En ejecución	Urbano	1.028.847.022	0	15%	0%	0	0	02/03/2026
	Interventoría Integral, la cual efectuará el seguimiento de los aspectos Contractuales, Técnicos, Administrativos, Financieros, Sociales y Ambientales al Contrato de Obra cuyo objeto es: Construcción de Alcantarillado Pluvial para la Recolección de Aguas Lluvias provenientes de los barrios Camilo Torres, Villa Chaira y Alonso Gaitán del municipio de Cartagena del Chaira departamento del Caquetá.	En ejecución	Urbano	83.719.664	0	15%	0%	0	0	02/03/2026
Curillo	Ejecución de la Obra Civil del proyecto denominado Construcción de Alcantarillado Sanitario entre las Calles 9° al 11° y entre las Carreras del 2° al 4° del municipio de Curillo - Caquetá	En ejecución	Urbano	623.928.494	0	33%	0%	0	0	08/12/2025
	Realizar la Interventoría Integral, la cual efectuara el seguimiento de los aspectos Contractuales, Técnicos, Administrativos, Financieros, Sociales y Ambientales al Contrato de Obra cuyo objeto es: Ejecución de la Obra Civil del proyecto denominado, Construcción de Alcantarillado Sanitario entre las Calles 9° al 11° y entre las Carreras del 2° al 4° del municipio de Curillo - Caquetá	En ejecución	Urbano	39.892.021	0	33%	0%	0	0	08/12/2025
El Doncello	Reposición de Alcantarillado Sanitario Barrio La Libertad, municipio de El Doncello departamento del Caquetá	Terminado - En proceso de Liquidación	Urbano	243.849.880	0	100%	0%	0	0	20/06/2025

Municipio(s)	Nombre del Proyecto/Actividad	Estado	Ubicación	Valor Contratado	Valor Adiciones	% de Ejecución	Avance Financiero	No de Prorrugas	No de Suspensiones	Fecha de Terminación (Real o Estimado)
El Doncello	Reposición y Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Pluvial en el barrio Belalcázar Carrera 1 del municipio de El Doncello departamento del Caquetá	Terminado	Urbano	549.531.859	0	96%	0%	2	0	31/10/2025
	Realizar la Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera y Jurídica al contrato que tiene por Objeto Reposición y Mejoramiento del Sistema del alcantarillado pluvial en el barrio Belalcázar Carrera 1 del Municipio de El Doncello Departamento del Caquetá	Terminado	Urbano	39.252.336	0	100%	0%	2	0	31/10/2025
Florencia	Realizar la Interventoría Integral (Técnica, Administrativa, Financiera, Contable y Jurídica) del Contrato de Consultoría que tiene por objeto: "Estudios y Diseños del Proyecto Construcción Etapa Uno del Colector de Alcantarillado Sanitario sobre la Rivera de La Quebrada La Sardina, municipio de Florencia, departamento de Caquetá	En ejecución	Urbano	35.000.000	0	10%	0%	0	0	14/01/2026
Milán	Adecuación y Canalización de Aguas Lluvias en la Calle 4, entre Cra 2 a la Cra 6, del casco urbano de la inspección de San Antonio de Getuchá, en el municipio de Milán, departamento del Caquetá	En ejecución	Urbano	988.082.242	0	85%	0%	0	0	21/01/2026
	Realizar la Interventoría Integral, la cual efectuará el seguimiento de los aspectos Contractuales, Técnicos, Administrativos, Financieros, Sociales y Ambientales al Contrato de Obra cuyo objeto es: Adecuación y Canalización de Aguas Lluvias en la Calle 4, entre Cra 2 a la Cra 6, del casco urbano de la inspección de San Antonio de Getuchá, municipio de Milán, departamento del Caquetá.	En ejecución	Urbano	65.065.757	0	85%	0%	0	0	21/01/2026
Morelia	Construcción de Tramos de Alcantarillado en el municipio de Morelia, Caquetá	En proceso de liquidación	Urbano	1.404.474.97	0	100%	67.2%	1	0	28/02/2025
	Realizar la Interventoría, Técnica, Jurídica, Administrativa y Contable del Contrato que tiene por objeto: Construcción de Tramos de Alcantarillado en el municipio de Morelia, departamento de Caquetá.	En Proceso de Liquidación	Urbano	98.313.249	0	100%	0%	1	0	28/02/2025
San José del Fragua	Construcción Celda Disposición Final Relleno Sanitario El Cairo, municipio de San José del Fragua	En Proceso de Liquidación	Urbano	860.861.678	0	100%	0%	0	0	28/10/2025
	Realizar la Interventoría Integral, la cual efectuará el seguimiento de los aspectos Contractuales, Técnicos, Administrativos, Financieros, Sociales y Ambientales al Contrato de Obra cuyo objeto es: Construcción Celda	En Proceso de Liquidación	Urbano	68.868.934	0	100%	0%	0	0	28/10/2025

Municipio(s)	Nombre del Proyecto/Actividad	Estado	Ubicación	Valor Contratado	Valor Adiciones	% de Ejecución	Avance Financiero	No de Prórrogas	No de Suspensiones	Fecha de Terminación (Real o Estimado)
	Disposición Final Relleno Sanitario El Cairo, municipio de San José del Fragua.									
Solano	Construcción de Relleno Sanitario y Obras Complementarias en el municipio de Solano, Caquetá Fase 1	Pendiente de Inicio	Urbano	860.861.678	\$0	0%	0%	0	0	Pendiente de Acta de Inicio
	Realizar la interventoría integral, la cual efectuará el seguimiento de los aspectos contractuales, técnicos, administrativos, financieros, sociales y ambientales al contrato de obra cuyo objeto es: "Construcción del relleno sanitario y obras complementarias en el municipio de Solano Departamento del Caquetá Fase 1".	Pendiente de Inicio	Urbano	84.836.228	\$0	0%	0%	0	0	Pendiente de Acta de Inicio

### Proyectos en Proceso de Incumplimiento

Municipio(s)	Nombre del Proyecto/Actividad	Estado	Ubicación	Valor (Pesos)	% de Ejecución	Fecha de Terminación (Real o Estimado)	Inconveniente Presentado
Curillo	Construcción de la Celda No. 3 y Obras Complementarias en el Relleno Sanitario para la Disposición Final de los Residuos Sólidos Ordinarios Generados en la cabecera municipal de Curillo	En proceso de incumplimiento	Urbano	\$1.283.948.626			Se solicitó proceso de presunto incumplimiento. Pendiente de programación de audiencia por parte del despacho jurídico de la Gobernación del Caquetá.
Curillo	Interventoría Integral (Técnica, Administrativa, Contable, Jurídica y Ambiental) al contrato de obra que tiene por objeto: "Construcción de la Celda No. 3 y Obras Complementarias en el Relleno Sanitario para la Disposición Final de los Residuos Sólidos Ordinarios Generados en la cabecera municipal de Curillo	En proceso de incumplimiento	Urbano	\$ 102.715.890,0			Se solicitó proceso de presunto incumplimiento. Pendiente de programación de audiencia por parte del despacho jurídico de la Gobernación del Caquetá.
Curillo, Albania, Belén de los Andaquíes y Cartagena del Chairá	Estudios de Factibilidad y Diseños para la Optimización del Sistema de Alcantarillado, Manejo de Aguas Lluvias y Diseño del Sistema de Tratamiento para Aguas Residuales Domésticas para el Casco Urbano de los municipios de Curillo, Albania, Belén de los Andaquíes y Cartagena del Chairá	Liquidado	Urbano	Consultoría \$1.463.702.701 Interventoría \$102.459.190,0	93,24%	24/7/2023	Mediante resoluciones 000187 del 07/02/2025 y 000698 del 14/04/2025 emitidas por el departamento jurídico de la Gobernación del Caquetá se declaró que los contratistas de consultoría e interventoría no incumplieron, los contratos de consultoría e interventoría se encuentran liquidados y pagados
Milán, Morelia, San José del Fragua, Solano y Valparaiso	Realizar la Interventoría Técnica, Administrativa y Financiera a la Consultoría de Estudios y Diseños de Proyectos en el Marco del Programa Agua para la Prosperidad - Plan Departamental de Agua del Caquetá.	Liquidado	Urbano	70'234.519.0			

	<b>DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ</b>	
	<b>Informe de Seguimiento del PEI</b>	<b>Versión 1.0</b> <b>17/01/2020</b>

## 6. COMPONENTE AMBIENTAL Y GESTIÓN DEL RIESGO.

Durante el período comprendido entre septiembre y octubre de 2025, se avanzó significativamente en la ejecución y supervisión de proyectos estratégicos de agua potable, alcantarillado sanitario, manejo de aguas lluvias y gestión de residuos sólidos en municipios prioritarios del Departamento del Caquetá. Se realizaron seis (6) visitas técnicas y ambientales, tres (3) comités de evaluación interventora y un acto de recepción de equipamiento clave, lo que refleja un compromiso activo con la transparencia, la calidad y el cumplimiento normativo. Los avances más relevantes incluyen el inicio de obras en Curillo y Albania, la inspección técnica de la interventoría en Florencia y Milán, y la recepción oficial del vehículo compactador para San Vicente del Caguán.

### Observaciones Técnicas y Ambientales Clave:

- Florencia: La visita ambiental confirmó que las obras de acueducto no afectan fuentes hídricas sensibles. Se recomienda continuar con monitoreo de calidad del agua en puntos de conexión.
- Curillo: El inicio de obras es oportuno, pero se observó ausencia de señalización de seguridad en zonas de excavación. Se exige cumplimiento inmediato del Plan de Manejo Ambiental y Social (PMAS).
- Albania: El avance es lento, pero controlado. Se recomienda incrementar la frecuencia de inspecciones a partir de octubre para evitar retrasos en el cronograma.
- Milán: La desviación en el ancho de la zanja puede comprometer la capacidad de drenaje. Se emitió notificación formal al contratista para corrección en 72 horas.
- San Vicente del Caguán: La recepción del vehículo compactador representa un hito estratégico. Se sugiere programar talleres de mantenimiento preventivo con el fabricante en noviembre.

Así mismo durante este periodo se realizó la promoción de cultura ciudadana en el uso eficiente del agua y manejo de residuos. Se llevaron a cabo 9 visitas técnicas, 3 comités técnicos, 2 jornadas sociales y 1 actividad de socialización comunitaria, evidenciando un enfoque integral que articula lo técnico, lo ambiental y lo social. Los hallazgos más relevantes incluyen el avance en obras de alcantarillado pluvial en El Doncello y Cartagena del Chairá, graves deficiencias operativas en las PTAR de Paujil y Milán, y el éxito de estrategias participativas en Morelia y Alameda. Este informe sintetiza los resultados, observaciones y recomendaciones para garantizar la sostenibilidad de los servicios públicos en el departamento.

El período reportado evidencia un avance significativo en la materialización de proyectos críticos de saneamiento y acceso al agua en el Caquetá, con un alto nivel de rigor técnico y ambiental en la supervisión.

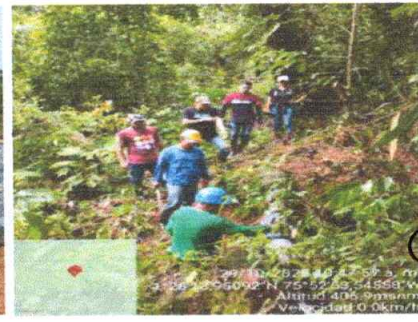
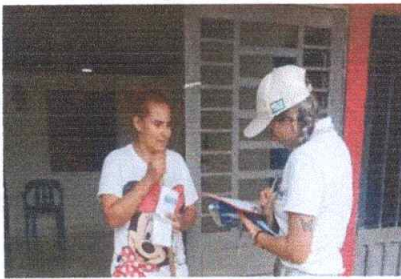
### Próximos pasos inmediatos:


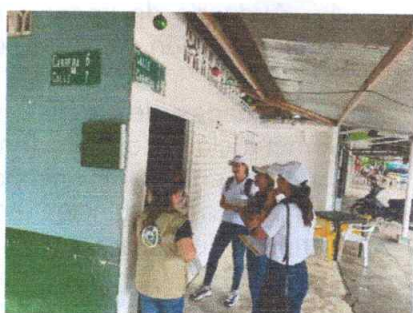
1. Reunión de seguimiento multisectorial: 25 de noviembre de 2025 (incluye Alcaldías, interventorías y Secretaría de Ambiente).
2. Informe de avance mensual: A partir de diciembre, con entrega quincenal de indicadores físicos y financieros.
3. Capacitación en mantenimiento: Programar talleres para personal de San Vicente del Caguán antes del 15 de diciembre.

- Auditoría de impacto social: Iniciar en diciembre en los barrios de Florencia para medir percepción de mejora en calidad de vida.

Las actividades desarrolladas entre septiembre y octubre reflejan un progreso tangible en la implementación de soluciones integrales de saneamiento básico, aunque persisten retos importantes en el cumplimiento técnico, la operación de infraestructuras existentes y la sostenibilidad ambiental. La articulación entre lo técnico y lo social ha permitido avanzar en la aceptación comunitaria de proyectos.

Así mismo se avanzó significativamente en la formulación de Planes de Gestión del Riesgo de Desastres (PGRD) para prestadores de servicios, se identificaron deficiencias críticas en instrumentos ambientales de obras en ejecución y se fortaleció la capacidad institucional mediante acompañamiento técnico, socialización y capacitación. Destacan: la emisión de oficios para exigir el cumplimiento de mínimos ambientales, la revisión de contratos clave, la socialización del contrato No. 202500000882 en 14 municipios y la realización de actividades pedagógicas sobre cambio climático. Estas acciones refuerzan el rol del PDA como facilitador del cumplimiento normativo y promotor de resiliencia en infraestructuras críticas.












## 7. COMPONENTE SOCIAL

Durante el período evaluado, el Componente Social del Plan Departamental de Agua del Caquetá llevó a cabo las siguientes actividades:

CAPACITACIONES EN SANEAMIENTO BÁSICO Y AGUA POTABLE			
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD	PROYECTO	PARTICIPANTES	EVIDENCIA FOTOGRÁFICA
<p>Capacitación sobre <b>Ahorro y Uso Eficiente del Agua</b>, orientado a estudiantes de las Instituciones Educativas del departamento.</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inspección de Maguare/ El Doncello - Caquetá</li> <li>- Feria de Florencia Expo Caquetá</li> <li>- Comunidad Municipio de Morelia - Caquetá</li> <li>- Auditorio del Concejo Municipio de Morelia - Caquetá</li> <li>- Comunidad Vereda Los Cauchos - Municipio de Cartagena del Chaira</li> <li>- I. E. R. Juan XXIII - Morelia</li> <li>- I. E. R. Bajo Caldas - Florencia</li> <li>- I. E. R. Palma Arriba - La montaña - Caquetá</li> <li>- I. E. R. Omar Gómez Chávez, Valparaíso - Caquetá</li> <li>- I. E. I. E. R. Solita, Municipio de Solita - Caquetá</li> <li>- I. E. R. Puerto Arango - Sede Principal/ Florencia</li> <li>- Casa a Casa Comunidad de la Montañita - Caquetá</li> <li>- I. E. Los Andes Sede Alpes / Florencia - Caquetá</li> <li>- I. E. Los Pinos / Florencia Caquetá</li> <li>- I. E. Campo Elias Marulanda / Solano Caquetá</li> </ul>	  






SOCIALIZACION PROYECTOS POR EJECUTAR DEL PDA –CAQUETA				
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD	PROYECTO	PARTICIPANTES	EVIDENCIA FOTOGRÁFICA	
Socialización o reuniones de los proyectos por ejecutar del PDA Caquetá con la comunidad y autoridades del orden Departamental y Municipal.	<p>Socialización inicial Proyecto cuyo objeto es: <b>“Construcción Tanque de Almacenamiento de Agua Potable para el municipio de Albania” en el municipio de Albania-Caquetá”</b></p> <p>Socialización inicial Proyecto cuyo objeto es: <b>“Construcción de Alcantarillado Pluvial para la Recolección de Aguas Lluvias provenientes de los barrios Camilo Torres, Villa Chaira, Alonso Gaitán y La Primavera del municipio de Cartagena del Chairá”</b></p>	<p>Empresa de Servicios Públicos Alcaldía Municipal Comunidad de Albania Componente Técnico Componente Ambiental Componente Social</p> <p>Empresa de Servicios Públicos Alcaldía Municipal Comunidad de Albania Componente Técnico Componente Ambiental Componente Social</p>		
CREACIÓN DE CLUB DEFENSORES DEL AGUA				
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD	PROYECTO	PARTICIPANTES	EVIDENCIA FOTOGRÁFICA	
Creación de Club Defensores del Agua	N/A	I. E. R. Arenoso Sede Santa Marta / San Vicente del Caguán		

SEGUIMIENTO A LOS CLUB DEFENSORES DEL AGUA			
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD	PROYECTO	PARTICIPANTES	EVIDENCIA FOTOGRÁFICA
Seguimiento a Club Defensores del Agua Conformados		<ul style="list-style-type: none"> <li>- I. E. R. Juan XXIII – Morelia</li> <li>- I. E. R. Bajo Caldas – Florencia</li> <li>- I. E. I. E. R. Solita – Municipio Solita</li> <li>- I. E. R. Palma Arriba – La Montañita</li> <li>- I. E. Omar Gómez Chávez – Valparaíso</li> <li>- I. E. Ángel Cuniberti / Curillo</li> <li>- I. E. Agroecológico Amazónico / El Paujil</li> <li>- I. E. Albania / Albania</li> <li>- I. E. Corazón Inmaculado de María / El Doncello</li> <li>- I. E. R. La Concordia Sede Galicia N° 2 / Paujil</li> <li>- I. E. Campo Elías Marulanda / Solano</li> <li>- I. E. El Chaira José María Córdoba/ Cartagena del Chaira – Caquetá</li> <li>- I. E. Los Pinos / Florencia - Caquetá</li> <li>- I. E. Acevedo y Gómez / Puerto Rico -Caquetá</li> </ul>	  

R

SEGUIMIENTO VEEDURIAS PROYECTOS EN EJECUCION				
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD	PROYECTO	PARTICIPANTES	EVIDENCIA FOTOGRÁFICA	
Seguimiento con las veedurías a los proyectos en ejecución del PDA Caquetá con la comunidad y autoridades del orden Departamental y Municipal.	"Construcción Celda de Disposición Final Relleno Sanitario El Cairo municipio de San José del Fragua".	Albeiro García Ana Paola Sierra  Carmen Amparo Ramírez Ana Paola Sierra  María Santos Martha Cecilia Cuellar  Tatiana Jara Horacio Gómez Ángel María Moreno Audely Bermeo		
	"Construcción de Alcantarillado Sanitario entre las Calles 9ª y 11ª y entre las Carreras 2ª y 4ª del municipio de Curillo – Caquetá".			
	"Construcción de la Red de Acueducto y Planta de Tratamiento de Agua Potable para el casco urbano del municipio de Morelia, departamento del Caquetá."			
	"Reposición y Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Pluvial en el barrio Belalcázar Carrera 1 del municipio de El Doncello departamento del Caquetá,"			
	"Construcción de Alcantarillado Pluvial para la Recolección de Aguas Lluvias provenientes de los barrios Camilo Torres, Villa Chaira y Alonso Gaitán del municipio de Cartagena del Chaira departamento del Caquetá."			
"Realizar LA Interventoría Integral, la cual efectuará el seguimiento de los aspectos Contractuales, Técnicos, Administrativos, Financieros, Sociales y Ambientales al Contrato de Obra cuyo objeto es: Adecuación y Canalización de Aguas Lluvias en la Calle 4, entre Cra 2 A La Cra 6, Del casco urbano de la inspección de San Antonio de Getuchá, municipio de Milán, departamento del Caquetá.				



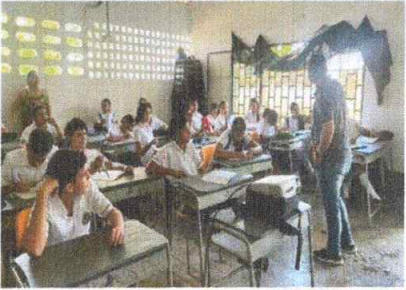
SEGUIMIENTO CDCS – E.S.P.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD	PROYECTO	PARTICIPANTES	EVIDENCIA FOTOGRÁFICA	
<p>Seguimiento y acompañamiento a los diferentes comités de control social relacionados al sector de agua potable y saneamiento básico</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Empresas de Servicios Públicos Aguas de Chiribiquete / Solano</li> <li>- Empresas de Servicios Públicos Agua Rica AAA.SA.ESP / Puerto Rico</li> <li>- Empresas de Servicios Públicos Aguas de San Antonio AAA SA ESP / Milán</li> <li>- Empresas de Servicios Públicos ESERCU / Curillo</li> <li>- Empresas de Servicios Públicos EMSERPA S.A ESP / Albania</li> </ul>	<p>Tatiana Jara</p>		
				
				




GR

SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN A LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL EN OBRA

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD	PROYECTO	PARTICIPANTES	EVIDENCIA FOTOGRÁFICA
<p>Seguimiento y verificación a la ejecución del Plan de Gestión Social en obra</p>	<p>"Construcción Celda de Disposición Final Relleno Sanitario El Cairo municipio de San José del Fragua".</p> <p>"Construcción De Alcantarillado Sanitario Entre Las Calles 9ª Y 11ª Y Entre Las Carreras 2ª Y 4ª Del Municipio De Curillo – Caquetá".</p> <p>"Construcción Tanque de Almacenamiento de Agua Potable para el municipio de Albania" en el municipio de Albania-Caquetá"</p>	<p>Ana Paola Sierra Tatiana Jara Martha Cuellar</p>	 
	<p>"Reposición y Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Pluvial en el Barrio Belalcázar Carrera 1 del municipio de El Doncello departamento del Caquetá."</p> <p>"Construcción de Alcantarillado Pluvial para la Recolección de Aguas Lluvias provenientes de los barrios Camilo Torres, Villa Chaira Y Alonso Gaitán del municipio de Cartagena del Chaira departamento del Caquetá."</p>		 
	<p>"Realizar La Interventoría Integral, la cual efectuará el Seguimiento de los aspectos Contractuales, Técnicos, Administrativos, Financieros, Sociales y Ambientales al contrato de obra cuyo objeto es: Adecuación y Canalización de Aguas Lluvias en la Calle 4, entre Cra 2 a la Cra 6, del casco urbano de la inspección de San Antonio de Getuchá, municipio de Milán, departamento del Caquetá.</p> <p>"Construcción de la Red de Acueducto y Planta de Tratamiento de Agua Potable para el casco urbano del municipio de Morelia, departamento del Caquetá."</p>		

CAPACITACION EN CAMBIO CLIMATICO - MEDIO AMBIENTE			
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD	PROYECTO	PARTICIPANTES	EVIDENCIA FOTOGRÁFICA
<p>Capacitación y/o taller en cuidado del ambiente, reducción del cambio climático, efecto invernadero, usos de energía limpia y renovable.</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• I. E. R. Juan XXIII – Morelia</li> <li>• I. E. I. E. R. Solita – Municipio Solita</li> <li>• I. E. R. Puerto Arango – Sede Principal/ Florencia</li> <li>• Casa a Casa Comunidad La Montañita - Caquetá</li> <li>• I. E. Acevedo y Gómez</li> </ul>	  

2

NOTAS INFORMATIVAS			
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD	PROYECTO	PARTICIPANTES	EVIDENCIA FOTOGRÁFICA
	N/A	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Municipio de Morelia – puerta - puerta</li> <li>- Inspección de maguaré / el Doncello – Caquetá</li> <li>- Feria de Florencia expo Caquetá 2025 - Florencia</li> <li>- I. E. R. Juan XXIII – Morelia</li> <li>- Campaña de sensibilización de ahorro y uso eficiente del agua, para fomentar la cultura del cuidado del recurso hídrico en el Caquetá</li> <li>- I. E. los pinos</li> <li>- Capacitación y socialización sobre agua potable y saneamiento básico, y manejo adecuado y protección de los recursos naturales</li> <li>- I. E. Jorge Eliecer Gaitán – vereda Lusitania – municipio de puerto rico Caquetá</li> <li>- Visita de seguimiento al club defensor del agua guardianes ambientales la I. E. Campo Elías Marulanda, del municipio de solano</li> <li>- Jornada medico humanitaria – vereda Santiago de la selva</li> <li>- Campaña de sensibilización de ahorro y uso eficiente del agua, para fomentar la cultura del cuidado del recurso hídrico en el Caquetá</li> <li>- Jornada medico humanitaria – municipio de solano Caquetá</li> <li>- Campaña de sensibilización de ahorro y uso eficiente del agua, para fomentar la cultura del cuidado del recurso hídrico en el Caquetá</li> <li>- Estudiantes de Curillo fortalecen su conciencia ambiental con jornada práctica</li> <li>- Estudiantes del paujil fortalecen su conciencia ambiental con jornada práctica</li> <li>- Construcción tanque de almacenamiento de agua potable del municipio de Albania</li> <li>- Curillo inicia obras de alcantarillado sanitario entre las calles 9° al 11° y entre las carreras del 2° al 4° del municipio de Curillo – Caquetá"</li> <li>- Albania contará con un nuevo tanque de almacenamiento de agua potable</li> <li>- comunidad de la montañita recibe jornada práctica ambiental</li> </ul>	  

## 8. INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LOS COSTOS DEL GESTOR.

Al verificar el avance en el desarrollo de las actividades acumuladas a 30 de junio de 2025, se tiene que los Costos del Gestor, muestran un importante avance en el cumplimiento de las metas, evidenciándose que cada uno de los componentes cumplió con la ejecución en el cumplimiento de las metas.

Realizando el seguimiento en la evolución de los Costos del Gestor 2025, encontramos la siguiente información acumulada:

COMPONENTE	SEPTIEMBRE			OCTUBRE			CUMPLIMIENTO PDA CAQUETA		
	Planeado	Entregado	% de Cumplimiento	Planeado	Entregado	% de Cumplimiento	Planeado	Entregado	% de Cumplimiento
ADMINISTRATIVA	104	148	100,00%	114	131	100,00%	1.141	1.149	82,62%
AMBIENTAL	17	29	100,00%	15	35	87,50%	164	195	100,00%
ASEGURAMIENTO	17	18	68,18%	10	12	75,00%	150	132	84,38%
FINANCIERA	23	33	100,00%	23	28	100,00%	263	288	89,88%
INFRAESTRUCTURA	10	31	75,00%	10	29	62,50%	106	175	91,67%
JURIDICA	29	34	100,00%	25	33	100,00%	262	255	74,87%
PLANEACION	5	7	100,00%	4	7	100,00%	56	47	56,67%
SOCIAL	42	83	96,97%	37	53	81,94%	419	456	89,09%
<b>PDA CAQUETA</b>	<b>247</b>	<b>383</b>	<b>92,52%</b>	<b>238</b>	<b>328</b>	<b>88,37%</b>	<b>2.561</b>	<b>2.697</b>	<b>83,65%</b>

En la tabla, se observa el avance de cumplimiento de las metas por componentes de los Costos del Gestor, de acuerdo a las actividades programadas para el bimestre septiembre - octubre de 2025 por el PDA Caquetá. Se ha alcanzado un cumplimiento del **92.52%** para el mes de **septiembre (383 actividades realizadas de 247 programadas)** y del **88.37%** para el mes de **octubre (328 actividades realizadas de 238 programadas)**. Transcurrido el **81.82% del tiempo de ejecución** del capítulo 2025; tenemos que el PDA Caquetá; en el cumplimiento de las metas cuenta con un acumulado del **83.65%** de cumplimiento acumulado en promedio, reportando el haber **realizado 2.697 actividades de 2.561 actividades programadas**; para lo cual, cada componente acumula el siguiente porcentaje:

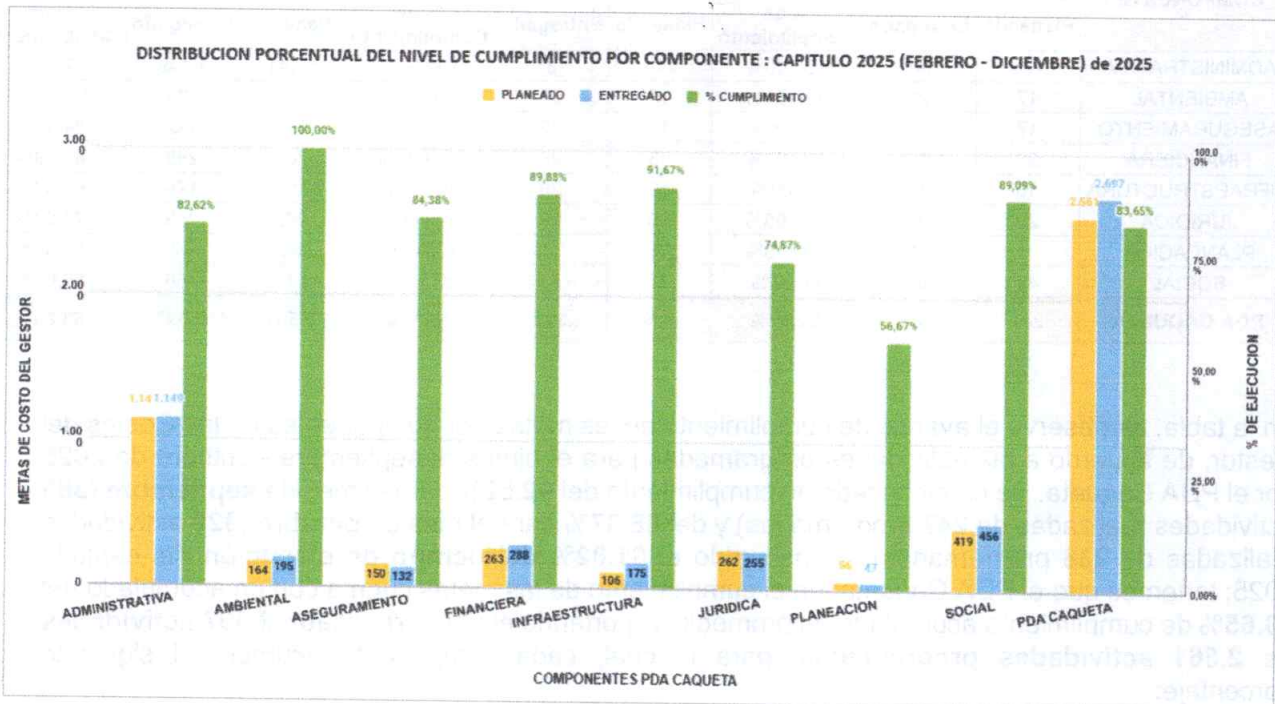
- Con un **82.62%** de cumplimiento tenemos al **Componente Administrativo**, reportando el haber entregado **1.149 actividades de 1.141 actividades planeadas**.
- Con un **100%** de cumplimiento tenemos al **Componente Ambiental**, reportando el haber entregado **195 actividades de 164 actividades planeadas**.
- Con el **84.38%** de cumplimiento tenemos al **Componente de Aseguramiento**, reportando el haber entregado **132 actividades de 150 actividades planeadas**.
- Con un **89.88%** de cumplimiento tenemos al **Componente de Financiero**, reportando el haber entregado **288 actividades de 263 actividades planeadas**.
- Con el **91.67%** de cumplimiento tenemos al **Componente de Infraestructura**, reportando el haber entregado **175 actividades de 106 actividades planeadas**.

9

- Con el **74.87%** de cumplimiento tenemos al **Componente Jurídica**, reportando el haber entregado **255** actividades de **262** actividades planeadas.
- Con un **56.67%** de cumplimiento tenemos al **Componente de Planeación**, reportando el haber entregado **47** actividades de **56** actividades planeadas.
- Con el **89.09%** de cumplimiento tenemos al **Componente Social**, reportando el haber entregado **456** actividades de **419** actividades planeadas.




Aunque algunos componentes han realizado más actividades de las programadas, no han alcanzado el 100% de cumplimiento, debido a que realizaron más actividades que no fueron programadas.

En la siguiente gráfica, podemos observar, como es el comportamiento de los componentes del PDA Caquetá, en el cumplimiento de las metas, para el periodo agosto de 2025.



En la gráfica, se presentan los componentes del PDA Caquetá y el nivel de cumplimiento. De color amarillo, se observa la cantidad de actividades planeadas, de color azul se observa la cantidad de actividades entregadas y en color verde se observa el porcentaje del nivel de cumplimiento. Las tres barras finales, se observa el total consolidado del PDA Caquetá, reportando un porcentaje del **83.65% de cumplimiento**, en el desarrollo de las metas.

El **83.65% de cumplimiento en promedio**, reportado por los Costos del Gestor, permite evidenciar un nivel **ALTO de cumplimiento**, frente al logro de los objetivos y acerca de las actividades que está desarrollando el PDA Caquetá, en su incidencia en la población del departamento del Caquetá,

	<p align="center"><b>DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ</b></p>	
	<p align="center"><b>Informe de Seguimiento del PEI</b></p>	<p align="center"><b>Versión 1.0 17/01/2020</b></p>

promoviendo la política de los **Planes Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento (PDA)**, definidos en el Decreto **1425 de 2019**; se está cumpliendo de manera satisfactoria, manifestándose en el mejoramiento de la calidad de vida de los caqueteños.

Florencia, noviembre de 2025.




**NIDIA CAROLINA TAMAYO BUITRAGO**  
**Secretaria de Infraestructura**  
**Gestora del PDA**

Vo.Bo. Yudy Narley García Rojas – Coordinadora PDA 

Vo.Bo. Ing. Lina Ortiz-Componente Ambiental y de Gestión del Riesgo 

Vo.Bo. Yenny Camelo-Componente Financiero

Vo.Bo. Ing. Neiser Andrés Castro Triviño-Componente Técnico 

Estructuró / Diagramó: E. Orlando Parra C. /Apoyo Gestor PDA 

Vo.Bo. Ing Salomón González-Componente Aseguramiento 

Vo.Bo. Ana Paola Sierra Pinillos-Componente Social 
