República de Colombia
Gobernación de Caquetá

CAQUETÁ

2013

INFORME CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE USO DE RECURSOS (CUR) NO. 64 SEGUNDO SEMESTRE 2013 INFORME DE AVANCE Y SEGUIMIENTO DE METAS DEL PAEI DEL PDA-PAP - INCUYE AVANCE DEL PLAN ANUAL ESTRATÉGICO Y DE INVERSIONES - PAEI 2013 PERÍODO MAYO - DICIEMBRE DE 2013.

PDA
Plan Departamental de Agua
CAQUETÁ

FLORENCIA - 05 -
DICIEMBRE - 2013

PARTICIPANTES DEL PAP-PDA DEPARTAMENTO DE CAQUETA

DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

GOBERNADOR: VICTOR ISIDRO RAMIREZ LOAIZA

MUNICIPIOS QUE HACEN PARTE DEL PDA - PAP

MUNICIPIO	NOMBRE DEL ALCALDE
ALBANIA	HAROLD ALEXANDER CHEVEZ ARDILA
BELEN DE LOS ANQUIES	JAIME URIEL MEJIA ZULUAGA
CARTAGENA DEL CHAIRA	LUIS FRANCISCO RUIZ AGUILAR
CURILLO	JOSE RUBEN MUÑOZ MUÑOZ
EL DOCELLO	FERNANDO TRONCOSO CASAÑAS
EL PAUJIL	RODRIGO ANDRES CASTRO B.
FLORENCIA	MARIA SUSUNA PORTELA LOSADA
MONTAÑITA	ARLEX GOMEZ LOPEZ
MILAN	ALFONSO LIZCANO MENDEZ
MORELIA	LUIS HUMBERTO BARRERA MUÑOZ
PUERTO RICO	WILMER CARDENAS RODRIGUEZ
SAN VICENTE DEL C.	DOMINGO EMILIO PEREZ CUELLAR
SAN JOSE DEL FRAGUA	CARLOS ENRIQUE DIAZ SALAZAR
SOLANO	ELISEO MURILLO CRIOLLO
SOLITA	MERLY SARRIA PEÑA
VALPARAISO	LUZ MILA CICERI ORTIZ

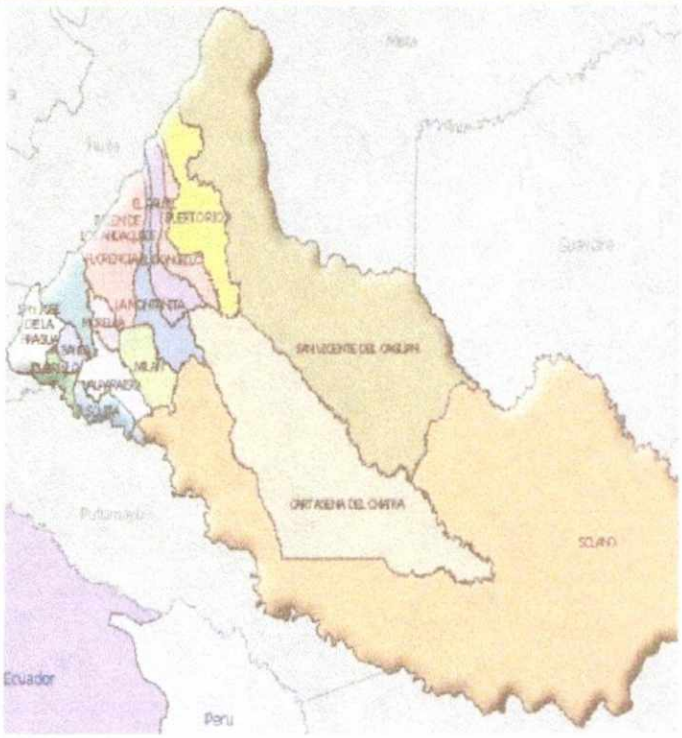

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - MVCT

DELEGADO MVCT - DR. JHON FREDDY NAVARRO GÓMEZ

DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN - DNP

DELEGADA DNP - DRA. SIRLY CASTRO TUIRÁN

CORPORACIÓN AMBIENTAL:

CORPOAMAZONIA – Dr. JUAN DE DIOS VERGEL

Florencia, 05, Diciembre DE 2013

MIEMBROS DEL COMITÉ DIRECTIVO DEL PAP-PDA

Gobernador del Caquetá	Dr. Víctor Isidro Ramírez Loaiza
Delegado Departamento	Dr. Álvaro Raúl Parra Erazo
Delegado MVCT	Dr. Jhon Freddy Navarro Gómez
Delegada DNP	Dra. Sirly Castro Tuirán
Alcalde de Milán	Dr. Alfonso Lizcano Méndez
Alcalde de El Doncello	Dr. Fernando Troncoso Casañas
Corporación Ambiental	Dr. Juan de Dios Vergel
Secretaria Comité Directivo	Dra. Jaime Hermosa Saavedra

Secretaría del Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento PAP-PDA del Departamento

GESTOR PDA - PAP – CAQUETA.

Jaime Hermosa Saavedra, Gestor -- **correo electrónico**:
apoyogestorpdacaqueta2012@hotmail.com

EQUIPO DE TRABAJO TECNICO, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE COMUNICACIONES

- Bernarda Álvarez Chávez, Abogada, Profesional Especializada, correo electrónico: alchabernarda@gmail.com
- Jhon Freddy Ríos Flórez, Admón. Financiero, Profesional Especializado, correo electrónico: j.rios27@hotmail.com
- Jorge Andrés Moncada, Ing. Civil, Profesional Especializado, correo electrónico: j_ams1124@hotmail.com
- William Pérez, Ing. Civil, Profesional Universitario, correo electrónico: wipeart@hotmail.com
- Oscar Eduardo Calderón Rosas, Contador Público, Profesional Especializado, correo electrónico: oscaredujdc@hotmail.com
- Israel Méndez Piamba, Admón. Publico, Profesional Universitario, correo electrónico: israelmendezpiamba@hotmail.com

Florencia, 05 De Diciembre DE 2013

PÁG.

	PRESENTACION	6
1.	MUNICIPIOS QUE HACEN PARTE DEL PAP-PDA.	7
1.1.	MUNICIPIOS QUE NO HACEN PARTE DEL PAP- PDA.	7
1.2	LOGROS Y RESULTADOS DEL PLAN DEPARTAMENTAL PARA EL MANEJO EMPRESARIAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO PAP-PDA.	8
	INSTRUMENTOS DE PLANEACION DEL PAP - PDA.	8
	ESTADO DE AVANCE CUMPLIMIENTO DEL OBJETO Y OBLIGACIONES DEL CONVENIO CUR No. 064 DE 2009.	
	PRINCIPALES LOGROS Y RESULTADOS DEL PLAN DEPARTAMENTAL PARA EL MANEJO EMPRESARIAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO PAP-PDA	
	INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN DEL PAP-PDA.	
	CUMPLIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL CRONOGRAMA DEL PAEI – 2013	
	PROCESOS DE CONTRATACIÓN ADELANTADOS.	
	ASPECTOS QUE INCIDIERON EN EL CRONOGRAMA DEL PAEI 2013	
	ACTIVIDADES REALIZADAS PLAN DE GESTION SOCIAL.	
	ESTADO ACTUALIZADO DE AVANCE DE LOS PROYECTOS DE PREINVERSION.	
	ESTADO DETALLADO ACTUALIZADO DE CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD DE RECURSOS EXPEDIDOS.	
	ESTADO DE PROYECTOS PRESENTADOS A MECANISMO DE VIABILIZACION	
	RELACION DE PROYECTOS CON CONCEPTO TECNICAMENTE ACEPTABLE ASIGNACIÓN DE RECURSOS A PROYECTOS.	
	RELACION DE PROYECTOS VIABILIZADOS.	
	PROCESOS EN CONTRATACION ADELANTADOS.	

INFORMACION DE PROYECTOS EN EJECUCION.

INFORMACION DE PROYECTOS TERMINADOS.

INFORMACION DE PROYECTOS EMERGENCIAS ATENDIDAS.

INFORMACION DE PROYECTOS POR PRESENTAR.

COMITES DIRECTIVOS EFECTUADOS.

ASPECTOS QUE INCIDIERON EN LA EJECUCION DEL PAEI 2013

CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS DEL GESTOR PAP-PDA-

ANEXOS

PRESENTACIÓN

En cumplimiento de las directrices establecidas en el Decreto 2246 de 2012, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio – MVCT, definió el Programa Agua y Saneamiento para la Prosperidad -Planes Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento PAP-PDA, como un conjunto de estrategia y coordinación interinstitucional formuladas y ejecutadas con el objeto de lograr la armonización integral de los recursos y la implementación de esquemas eficientes y sostenibles en la prestación de los servicios públicos domiciliarios de agua potable y saneamiento básico por parte de cada una de las entidades territoriales.

Con el fin, de garantizar la implementación, seguimiento a la ejecución del PAP-PDA y los asuntos relacionados con agua potable y saneamiento básico en el Departamento del Caquetá, mediante Comité Directivo de fecha: 02 - mayo de 2013, Acta No. 11 - 2013, se efectuó aprobación de los instrumentos de planeación del PAP-PDA de Departamento del Caquetá, definidos en el Artículo 17 del Decreto 2246 de 2012, exceptuando el Plan Ambiental 2013-2015.

La implementación del Plan Anual Estratégico y de Inversiones –PAEI 2013, como instrumento de planeación aprobado por parte del Comité Directivo del PAP-PDA, permitirá determinar el avance de cumplimiento sobre el cronograma y las acciones ejecutadas en cada uno de los componentes del Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento –PDA en el Departamento del Caquetá, de acuerdo con las fuentes de financiación.

En este sentido, teniendo en cuenta las disposiciones establecidas en el numeral 23 del artículo 14 del Decreto 2246 de 2012, El Gestor del PDA - PAP - Caquetá., presenta el Informe Convenio Uso de Recursos No. 64 Del Departamento de Caquetá INFORME COMPRENDIDO ENTRE EL MES DE MAYO A DICIEMBRE – PAEI 2013, sobre las acciones realizadas en el marco de implementación del Plan Departamental de Agua en el Departamento de Caquetá, durante el segundo período de 2013.

Este informe incluye el avance del Plan Anual Estratégico y de Inversiones, detallando el cumplimiento de los cronogramas allí fijados, las metas propuestas, el estado de avance de los proyectos de pre - inversión, Proyectos en ejecución y de los procesos de contratación, Proyectos terminados.

1. Relación de Municipios que hacen parte del PAP – PDA.

- Municipio de Albania – Convenio firmado el 15 de julio de 2010.
- Municipio de Belén de los A. Otrosí No. 1 al Convenio firmado el 19 de febrero de 2013.
- Municipio de Curillo – Otrosí No.1 al Convenio firmado en el mes de abril de 2013.
- Municipio de Cartagena del C. - Convenio firmado el 23 de diciembre de 2010.
- Municipio de El Doncello - Otrosí No.1 al Convenio firmado el 20 de febrero de 2013.
- Municipio de El Paujil - Otrosí No.1 al Convenio firmado el 21 de marzo de 2013.
- Municipio de Florencia - Convenio firmado el 23 de octubre de 2010.
- Municipio de Montañita - Convenio firmado el 06 de agosto de 2010.
- Municipio de Milán - Otrosí No.1 al Convenio firmado el 2 de octubre de 2013
- Municipio de Morelia - Otrosí No.1 al Convenio firmado el 01 de octubre de 2013
- Municipio de Puerto Rico - Otrosí No.1 al Convenio firmado el 22 de octubre de 2013
- Municipio de San Vicente del C. - Otrosí No.1 al Convenio firmado el 20 de febrero de 2013.
- Municipio de San José del F. - Otrosí No.1 al Convenio firmado el 15 de marzo de 2013.
- Municipio de Solano - Convenio firmado el 06 de agosto de 2010.
- Municipio de Solita - Otrosí No.1 al Convenio firmado el 15 de marzo de 2013.
- Municipio de Valparaíso - Convenio firmado el 20 de agosto de 2010.

1.1. Relación de Municipios que <u>No</u> hacen parte del PDA – PAP.

- Los 16 Municipios del Departamento del Caquetá se encuentran vinculados al PDA Caquetá. Se presenta una observación con los Municipios de Florencia, Montañita, Cartagena del Chaira y Solano, los cuales no están vinculados al contrato de Fiducia Mercantil, Irrevocable y Pagos, para comprometer recursos de inversión al Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico. Desde el Gestor se han realizados invitaciones para que estos Municipios legalicen su vinculación con el PDA Caquetá, pero ha sido imposible que estos Municipios atiendan el llamado que desde el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio y el Departamento del Caquetá, a través del Gestor del PDA Caquetá. El único Municipio que ha dado muestra de querer legalizar su compromiso con el PDA Caquetá, es el Municipio de Florencia, para el Comité Directivo a realizarse el día 11 de diciembre en la ciudad de Florencia se socializara el avance de esta tramite.

1.2 LOGROS Y RESULTADOS DEL PLAN DEPARTAMENTAL PARA EL MANEJO EMPRESARIAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO PAP-PDA.

El gestor del Departamento de Caquetá, como responsable de la gestión, implementación, seguimiento a la ejecución del PAP-PDA y los asuntos relacionados con agua potable y saneamiento básico en el Departamento de Caquetá, ha venido adelantando en el marco del Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento PAP-PDA, las acciones y estrategias tendientes al logro de las metas propuestas en cada uno de los componentes del Plan Anual Estratégico y de Inversiones – PAEI 2013, aprobado por parte del Comité Directivo realizado el 02 de mayo de 2013, mediante Acta No. 11 de 2013.

Los logros y resultados alcanzados en el marco del Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento PAP-PDA, durante el período de junio a diciembre de 2013, se encuentran descritos en los siguientes aspectos:

INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN DEL PAP-PDA

ESTADO ACTUALIZADO INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN PAP-PDA

INSTUMENTOS DE PLANEACION	APROBADO	FECHA	ACTA No.	OBSERVACIONES
Manual Operativo del PAP-PDA.	SI	02/05/2013	11	Se presentara a Comité Directivo, para ajustar los tiempos de contratación para la Interventoría, acordes al Decreto 2246 de 2012.
Plan General Estratégico y de Inversiones – PGEI 2013-2015	SI	02/05/2013	11	Se presentara a Comité Directivo, para realizar observaciones realizadas por el DNP.
Plan Anual Estratégico y de Inversiones – PAEI 2013.	SI	02/05/2013	11	Se presentara a Comité Directivo, para realizar observaciones realizadas por el DNP.
Plan de Aseguramiento de la Prestación de los Servicios Públicos Domiciliarios del PAP-PDA 2013-2015.	SI	26/07/2012	08	
Plan de Gestión Social 2013-2015.	SI	26/07/2012	08	
Reglamento Operativo del Comité Directivo del PAP-PDA	SI	02/05/2013	11	
El Plan Ambiental 2013 – 2015	NO	DIA/MES/AÑO		El Plan de Manejo Ambiental se perfecciona para ser presentado en el Próximo Comité Directivo en el cual se aprueben los Instrumentos de Planeación.

En cumplimiento de las disposiciones establecidas en el numeral 4 del artículo 14 del Decreto 2246 de 2012, El gestor en cabeza la Secretaria de Infraestructura, como gestora del PAP-PDA, elaboró y concertó con el Departamento de Caquetá las propuestas de Manual Operativo, Plan General Estratégico y de Inversiones – PGEI 2013-2015, Plan Anual Estratégico y de Inversiones – PAEI 2013, Plan de Aseguramiento para la Prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo, el Plan de Gestión Social y el Reglamento del Comité Directivo del PAP-PDA.

Los instrumentos de planeación definidos anteriormente, fueron concertados con el Departamento de Caquetá y Los Representantes de los Municipios pertenecientes al PAP-PDA, donde se soportan de manera técnica, económica y legalmente el contenido de dichos instrumentos, como lo ordena el Decreto 2246 de 2012.

Los instrumentos de planeación se encuentran en el siguiente estado:

Mediante Actas No. 08 del 26 de julio de 2012 y No. 11 de mayo de 2013.

CUMPLIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL CRONOGRAMA DEL PAEI – 2013

El Departamento de Caquetá, como gestor del Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento PAP-PDA, ha efectuado las gestiones, acciones y estrategias definidas para la implementación del Plan Anual Estratégico y de Inversiones – PAEI 2013, las cuales permitirán determinar el estado y avance de cumplimiento sobre el cronograma definido en dicho plan.

El resultado del seguimiento al PAEI, permitió establecer las acciones ejecutadas en cada uno de sus componentes, así como la actualización del cronograma con los proyectos viabilizados en el OCAD, como se evidencia en la siguiente tabla:

Tabla No. 1
Cronograma del PAEI 2013 - Actualizado

Componente de Aseguramiento de la Prestación de los Servicios Públicos de Agua Potable y Saneamiento Básico para el Bienestar.

COMPONENTES DEL PAEI		ACTIVIDADES	VALOR	PERIODO PROGRAMADO		% EJECUTADO	RECURSOS EJECUTADOS	OBSERVACIONES
				FECHA DE INICIO	FECHA FINAL			
Aseguramiento de la Prestación de los Servicios	Plan de Aseguramiento de la Prestación	**FASE I: DIAGNÓSTICO Y PREFACTIBILIDAD**	**$ 200.000.000**	Enero 2014	Febrero 2014	0	0	Está en proceso de perfeccionar los estudios previos para 6 Municipios del

COMPONENTES DEL PAEI		ACTIVIDADES	VALOR	PERIODO PROGRAMADO		% EJECUTADO	RECURSOS EJECUTADOS	OBSERVACIONES
				FECHA DE INICIO	FECHA FINAL			
Públicos	FASE I: DIAGNÓSTICO Y PREFACTIBILIDAD	Realización de la actualización del diagnóstico de los municipios		Enero 2014	Febrero 2014	0	0	Departamento.
		Levantamiento línea base – diagnóstico		Enero 2014	Febrero 2014	0	0	
		Capacidad y disponibilidad de pago		Enero 2014	Febrero 2014	0	0	
		Acompañamiento al municipio para la certificación para el manejo de los recursos SGP		Enero 2014	Febrero 2014	0	0	
	Gestor del PAP-PDA	**Gestor del PAP-PDA**	$ 900.000.000	Julio 31 2013	Abril 30 2014	**84**	**$ 757.016.500**	Estos recursos están en ejecución.
	REMUNERACIÓN DEL GESTOR DEL PAP-PDA	Desarrollar las acciones necesarias para alcanzar el cumplimiento de los objetivos de la política del sector de agua potable y saneamiento básico. La observancia de los principios y el cumplimiento de los objetivos y las metas del PAP-PDA.	$ 563.100.000	Mayo-2013	Junio-2013	40.43	$ 225.168.000	El gestor del PAP-PDA Caquetá, ha realizado acompañamiento, asesoramiento y seguimiento a los municipios vinculados al Plan, para el proceso de certificación a que se refiere el artículo 4 de la Ley 1176 de 2007.
		Elaborar, concertar y presentar las propuestas de Manual Operativo, Plan General Estratégico de Inversiones, Plan Anual Estratégico de Inversiones, Plan de Aseguramiento para la Prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo, y Plan Ambiental del PAP-PDA, al Comité Directivo para su respectiva aprobación.	$91.200.000	Mayo-2013	Abril-2013	59.76	$ 54.500.000	Se elaboraron y concertaron los instrumentos de planeación definidos para la implementación del PAP-PDA, entre ellos tenemos: Manual Operativo, Plan General Estratégico de Inversiones, Plan Anual Estratégico de Inversiones, PAP-PDA. Estos instrumentos fueron al Comité Directivo para su respectiva aprobación.
		Implementar y establecer el nivel de avance de cumplimiento del Plan General Estratégico y de Inversiones, Plan Anual Estratégico de Inversiones,	$ 83.700.000	Mayo-2013	Diceimbre -2013	56	$ 47.000.000	Una vez aprobados por parte del Comité Directivo del PAP-PDA, los instrumentos de Planeación definidos en el Artículo 17 del Decreto 2246 de 2012, se vienen implementando las acciones definidas en dichos planes.
		Adelantar las acciones para que los prestadores de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo que forman parte del PAP-PDA, reporten la información al Sistema Único de Información de Servicios Públicos, SUI, o el que haga sus veces, con la oportunidad y calidad que determinen la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.	$36.000.000	Mayo-2013	Diciembre -2013	44.44	$ 16.000.000	El día 15 de marzo de 2013, se llevó la capacitación sobre el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 11 de la Ley 1176 de 2007, los procesos de certificación y el manejo de los recursos de SGP, con una asistencia de 31 personas, representadas por 15 municipios del Departamento del Caquetá , y con la presencia de la Consorcio FIA y del Ministerio de Vivienda, Ciudad y

COMPONENTES DEL PAEI		ACTIVIDADES	VALOR	PERIODO PROGRAMADO		% EJECUTADO	RECURSOS EJECUTADOS	OBSERVACIONES
				FECHA DE INICIO	FECHA FINAL			
								Territorio - MVCT
		Promover, estructurar y adelantar las gestiones para implementar los esquemas de transformación y fortalecimiento institucional en un Municipio y/o grupo de Municipios y/o Distritos del departamento, de acuerdo con lo aprobado por el Comité Directivo	$ 600.000.000	Diciembre-2013	Febrero-2014	0	0	Está en proceso de perfeccionar los estudios previos para 6 Municipios del Departamento.
		Elaborar y presentar los proyectos para el mejoramiento de los sistemas de acueducto, alcantarillado y aseo de los municipios del PAP-PDA ante el mecanismo de viabilización de proyectos y realizar las correcciones o modificaciones cuando se requieran.	$80.000.000	Mayo-2013	Abril-2014	50	$40.000.000	Durante la vigencia 2013, el Gestor del PAP-PDA, ha presentado ante el mecanismo de viabilización OCAD, tres (3) proyectos para el mejoramiento de los sistemas de acueducto, alcantarillado y aseo en los municipios de El Pajil, Milán y Florencia Departamento del Caquetá
		Adelantar de manera oportuna los procesos de contratación de los proyectos viabilizados con recursos del PAP-PDA, de acuerdo con lo previsto en el Decreto 2246 de 2012, el Manual Operativo, el Plan General Estratégico de Inversiones, Plan Anual Estratégico y de Inversiones y el Plan de Aseguramiento de los Prestación de los Servicios, velando por la pluralidad de oferentes y la publicidad de dichos procesos en el portal de contratación.	$80.000.000	Mayo-2013	Abril-2014	50	$40.000.000	Durante la vigencia lo corrido de la vigencia 2013, el Gestor del PAP-PDA, ha adelantado de manera oportuna seis (6) procesos de contratación de los proyectos viabilizados por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio - MVCT y el OCAD, los cuales representan la suma de $22.852.579.330=
		Preparar, convocar y desarrollar audiencias públicas de rendición de cuentas para la divulgación de los procesos de contratación y seguimiento de los avancen que se adelanten en el marco del PAP-PDA, así como suministrar la información requerida por los organismos de control.	$ 38.941.000	Enero-2014	Junio-2014		0	Se tiene proyectado realizar una audiencia pública iniciando la vigencia 2014.
		Asistir a las entidades territoriales del departamento para efectos de la certificación a que se refiere el artículo 4° de la Ley 1176 de 2007 y la estrategia de monitoreo, seguimiento y control a que se refiere el Decreto 028 de 2008.	$ 36.000.000	Enero-2013	Diciembre -2013	44.44	$16.000.000	El Gestor del PAP-PDA Caquetá, ha realizado acompañamiento, asesoramiento y seguimiento a los municipios vinculados al Plan, para el proceso de certificación a que se refiere el artículo 4 de la Ley 1176 de 2007 y la estrategia

COMPONENTES DEL PAEI		ACTIVIDADES	VALOR	PERIODO PROGRAMADO		% EJECUTADO	RECURSOS EJECUTADOS	OBSERVACIONES
				FECHA DE INICIO	FECHA FINAL			
								de monitoreo, seguimiento y control a que se refiere el Decreto 028 de 2008. I
		Rendir bimestralmente al Comité Directivo un informe sobre el estado y avance del aseguramiento de la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y ases de cada uno de los municipios que conforman el PAP-PDA, así como del Plan Anual Estratégico de Inversiones con sus respectivas metas y estado de avance de los proyectos en ejecución y contratación.	$ 0	Mayo-2013	Diciembre -2013		0	
		Diseñar e implementar los procesos, procedimientos y los instrumentos de planeación requeridos para la coordinación, gestión, implementación y seguimiento a la ejecución del PAP-PDA del Departamento del Caquetá.	$ 0	Mayo-2013	DIciembre -2013		$ 0	Se diseñaron los procesos, procedimientos y los instrumentos de planeación requeridos para la gestión, implementación y seguimiento al Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento PAP-PDA.
TOTAL COMPONENTE			**$ XXXXXX**		**0**		**$ XXXXXXX**	

Componente en Inversiones de Infraestructura en Agua y Saneamiento Básico

COMPONENTE	MUNICIPIO	COMPONENTE	PROYECTO	VALOR DEL CONTRATO	PLAZO EJECUCION	CONTRATO No.	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
Inversiones en Infraestructura en Agua y Saneamiento	Albania, Curillo y San José del Fragua	ACUEDUCTO REGIONAL	CONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL PARA LOS MUNICIPIOS DE ALBANIA, SAN JOSE DEL FRAGUA Y CURILLO FASE I	$9.677.435.310	NUEVE (09) MESES	001 de 12 de abril 2013	0	SE ENCUENTRAN ADJUDICADO A R&U CONSTRUCTORES
	Albania, Curillo y San José del Fragua	ACUEDUCTO REGIONAL	**INTERVENTORIA** CONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL PARA LOS MUNICIPIOS DE ALBANIA, SAN JOSE DEL FRAGUA Y CURILLO FASE I	$774.077.280	NUEVE (09) MESES	032 del 14 de nov. 2013	0	SE ENCUENTRAN ADJUDICADA A CONSORCIO ING INTERVENTORES ASOCIADOS PDA CAQUETA Y ACTA DE INICIO DEL 20 DE NOV. DE 2013.
	Belén de los Andaquíes	ACUEDUCTO	OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO (ADECUACION BOCATOMA, DESARENADOR, CAMBIO RED DE CONDUCCION, ADECUACION PTAP) PARA EL MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES.	$1.972.062.186	SEIS (06) MESES	111-25-13-06 del 22 de octubre 2013	0	SE ENCUENTRAN ADJUDICADA AL GRUPO EMPRESARIAL LIBANO S.A.S
	Belén de los Andaquíes	ACUEDUCTO	**INTERVENTORIA** OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO (ADECUACION BOCATOMA, DESARENADOR, CAMBIO RED DE CONDUCCION, ADECUACION PTAP) PARA EL MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES.	$157.908.017	SEIS (06) MESES	030 del 14 de nov. 2013	0	. SE DIO INICIO AL CONTRATO EL DIA 20 DE NOV. DE 2013. UNION TEMPORAL ECI S.A.S

	Solita	ACUEDUCTO	OPTIMIZACION DE LAS REDES DEL ACUEDUCTO URBANO Y CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE TIPO CONVENCIONAL PARA EL MUNICIPIO DE SOLITA – CAQUETA	$1.849.622.795	SEIS (06) MESES	04 del 20 de junio de 2013	0	SE ENCUENTRAN ADJUDICADO A R&U CONSTRUCTORES
	Solita	ACUEDUCTO	**INTERVENTORIA** OPTIMIZACION DE LAS REDES DEL ACUEDUCTO URBANO Y CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE TIPO CONVENCIONAL PARA EL MUNICIPIO DE SOLITA – CAQUETA	$147.969.824	SEIS (06) MESES	031 del 14 de nov. 2013	0	SE DIO INICIO AL CONTRATO EL DIA 20 DE NOV. DE 2013. GERMAN VILLANUEVA CALDERON
	San Vicente del Caguan	ACUEDUCTO	OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y LINEA DE CONDUCCION PARA LOS BARRIOS VILLA DEL NORTE Y LA PRADERA EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN – CAQUETA	$1.339.442.916	SEIS (06) MESES	226 del 7 Nov. 2013	0	SE ENCUENTRAN ADJUDICADO A CONSTRUCAGUAN
	San Vicente del Caguan	ACUEDUCTO	**INTERVENTORIA** OPTIMIZACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y LINEA DE CONDUCCION PARA LOS BARRIOS VILLA DEL NORTE Y LA PRADERA EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN – CAQUETA	$106.984.660	SEIS (06) MESES	029 del 14 de nov. 2013	0	SE DIO INICIO AL CONTRATO EL DIA 20 DE NOV. DE 2013. CONSORCIO CAGUAN
TOTAL COMPONENTE				$ -				

Componente Ambiental Agua y Saneamiento Básico

COMPONENTE	MUNICIPIO	PROYECTO	VALOR DEL CONTRATO	PLAZO DE EJECUCION	CONTRATO No.	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
	Todo el Departamento	Desarrollo del componente verde del Plan Departamental de Agua de Caquetá. Convenios solidarios con las comunidades para la recuperación de las cuencas abastecedoras. Implementar Una Estrategia para el Manejo Integral de Residuos Sólidos en el Departamento del Caquetá	$378.000.000	**CUATRO (04) MESES**	**ND**	**0**	**Se radico el Proyecto Global en el Banco de Proyectos del Dpto., Se adelantara procesos contractuales para ejecutar e implementar las estrategias que se pretenden cumplir con los recursos comprometidos.**
TOTAL COMPONENTE							

Componente Social

COMPONENTES DEL PAEI		ACTIVIDADES	VALOR	PERIODO PROGRAMADO		% DE AVANCE EJECUTADO	RECURSOS EJECUTADOS	OBSERVACIONES
				FECHA DE INICIO	FECHA FINAL			
Componente Social	**Plan de Gestión Social del PAP-PDA**	**FASE O ETAPAS DE IMPLEMENTACIÓN**						
		1. PARTICIPACIÓN CIUDADANA	**$**				**0**	Pendientes para Asignar Recursos en el Próximo

		Puntos de Atención al Usuario	$	may-13	dic-13		0	Comité Directivo donde se aprueben los Instrumentos de Planeación.
		Transparencia, Audiencia Pública o Rendición de Cuenta	$	dic-13	ene-14		0	
		2. LÍNEA DE COMUNICACIÓN	**$0**				**0**	Estos Recursos están distribuidos para la ejecución de todo el PDA Caquetá
		Página WEB	$5.000.000	may-13	dic-13		0	
		Manejo de Medios de Comunicación	$	dic-13	dic-13		0	
		Diseño, impresión y socialización de afiches	$26.682.400	dic-13	dic-13		0	
		3. LÍNEA DE CAPACITACIÓN	**$0**				**0**	
		Fortalecimiento de Competencias Laborales al Gestor para el desarrollo de las actividades del PAP-PDA	$0	may-13	dic-13		0	Pendientes para Asignar Recursos en el Próximo Comité Directivo donde se aprueben los Instrumentos de Planeación.
		Fortalecimiento de las capacidades y competencias locales, institucionales y comunitarias, para el cumplimiento y seguimiento de las acciones del PAP-PDA.	$0	may-13	dic-13		0	
TOTAL COMPONENTE		**TOTALES**	**$**				**0**	

Componente Transversal Rural de Agua Potable y Saneamiento Básico

COMPONENTES DEL PAEI		ACTIVIDADES	VALOR	PERIODO PROGRAMADO		% DE AVANCE EJECUTADO	RECURSOS EJECUTADOS	OBSERVACIONES
				FECHA DE INICIO	FECHA FINAL			
Componente Transversal Rural de Potable y Saneamiento Básico para el Bienestar	MUNCIPIOS DEL DPTO DEL XXXXXXXX Pre inversión (Estudios y Diseños)	Estudios y diseños sector rural	**$ XXXXXXXX**	JULIO - 2013	DICIEMBRE -2013		0	Se trabaja con los Municipio de Milán y Solano para cumplir con el Auto 004 de 2009 y atender las NBI dé la Comunidad Indígena de los Korewajes.
TOTAL COMPONENTE		**TOTALES**	**$ XXXXXXXXX**				**0**	

Analizados los resultados de avance del PAEI, se observa que algunos instrumentos de planeación definidos en el PAP-PDA, se encuentran en proceso de transferencia de los recursos definidos para su financiación.

Las actividades adelantadas en las líneas del Plan de Gestión Social se encuentran representadas en la siguiente tabla:

Actividades Realizadas Plan de Gestión Social - Segundo Semestre de 2013

El componente del Plan de Gestión Social se incluyó en el Comité Directivo No. 08 del 26 de julio de 2012, donde se programó las actividades a alcanzar pero no se asignaron los recursos para ejecutar el plan de gestión social. Como compromiso para el próximo

Comité Directivo donde se aprueben los Instrumentos de Planeación para la Vigencia 2014, asignar los recursos necesarios para llevar a cabo el Plan de Gestión Social ya que se inició la contratación de las obras de inversión en el Departamento.

- **Estado Actualizado de avance de los Proyectos de pre inversión (consultorías contratadas).**

El estado de los proyectos y consultorías contratadas se encuentran detalladas en el Tabla No. 1.

- **Estado Detallado Actualizado de Certificados de Disponibilidad de Recursos expedidos**.

No. CDR	Fecha de Expedición	Aprobación Comité Directivo del PDA	Entidad Territorial	Descripción	Valor	Fuentes Recursos	Valor Contrato	Pagos Realizados	Saldos Por Pagar	Observaciones
38	21/07/2013	No. 11	Gobernación	Aseguramiento para la Prestación de los Servicios y Desarrollo Institucional, Costo del Gestor, Vigencia 2013.	900.000.000	SGP - APSB DPTO	563.100.000	225.868.000	337.232.000	Este rubro comprende todos los contratos de cosultoria que apoyan al Gestor PDA Caquetá para la continuación de la Politica Pública de en el Dpto del Caquetá.
39	31/07/2013	No. 11	Puerto Rico - Caquetá	Optimización y Ampliación Del Sistema de Acueducto del Casco Urbano del Municipio de Puerto Rico - Caquetá.	1.556.197.769	AP - Nación				Estos CDR's fueron anulados y liberados a raiz que el Municipio presenta inconvenientes para la legalización de la vinculació al PDA Caquetá, ya que el Tribunal Administrativo del Caquetá a declarado llegal sus Acuerdos Municipales para la vinculación del mismo al PDA.
40	31/07/2013	No. 11		**Interventoria** Optimización y Ampliación Del Sistema de Acueducto del Casco Urbano del Municipio de Puerto Rico - Caquetá.	146.244.459	SGP - APSB DPTO				
2	31/07/2013	No. 11		Optimización y Ampliación Del Sistema de Acueducto del Casco Urbano del Municipio de Puerto Rico - Caquetá.	271857.965	SGP - APSB MPIO				
41	31/07/2013	No. 11	Albania - Caquetá	Construcción Sistema de Acueducto Regional, Para los Municipios de Alabnia, San José del Fragua y Curillo - Caquetá	9.677.435.310	AP - Nación	9.677.363.975			El contratista no a requerido el pago del anticipo al PDA Caquetá
42	31/07/2013	No. 11		**Interventoria** Construcción Sistema de Acueducto Regional, Para los Municipios de Alabnia, San José del Fragua y Curillo - Caquetá	774.194.824	SGP - APSB DPTO	774.077.280	77.407.728	696.669.552	El Interventor no a requerido el pago del anticipo al PDA Caquetá
43	31/07/2013	No. 11	Solita	Optimización de la Redes del Acueducto Urbano y Contrucción Planta de Agua Potable Tipo Convencional para el Municipio de Solita - Caquetá	1.757.677.878	AP - Nación	ND			El contratista no a requerido el pago del anticipo al PDA Caquetá
44	31/07/2013	No. 11		**Interventoria** Optimización de la Redes del Acueducto Urbano y Contrucción Planta de Agua Potable Tipo Convencional para el Municipio de Solita - Caquetá	147.969.824	SGP - APSB DPTO	147.962.640	14.796.264	133.166.376	Esta firmada el acta de incio del día 20 de nov. 2013, no han requerido el pago del anticipo al PDA Caquetá
3	31/07/2013	No. 11		Optimización de la Redes del Acueducto Urbano y Contrucción Planta de Agua Potable Tipo Convencional para el Municipio de Solita - Caquetá	91944.917	SGP - APSB MPIO				
45	01/08/2013	No. 11	Belén de los Andaquies	Optimización del Sistema de Acueducto (adecuación, Bocatoma, Desarenador, Cambio de Red de Conducció, Adecuación PTAP) para el Municipio de Belén de los Andaquíes.	1.911055.872	AP - Nación	ND			
46	01/08/2013	No. 11		**Interventoria** Optimización del Sistema de Acueducto (adecuación, Bocatoma, Desarenador, Cambio de Red de Conducció, Adecuación PTAP) para el Municipio de Belén de los Andaquíes.	157.908.017	SGP - APSB DPTO	157.862.574	15.786.257	142.076.317	Esta firmada el acta de incio del día 20 de nov. 2013, ya esta radicada la orden de pago del anticipo en el Consorcio FIA.
2	01/08/2013	No. 11		Optimización del Sistema de Acueducto (adecuación, Bocatoma, Desarenador, Cambio de Red de Conducció, Adecuación PTAP) para el Municipio de Belén de los Andaquíes.	62.794.338	SGP - APSB MPIO	ND			
47	08/08/2013	No. 11	San Vicente del Caguan	Optimización de la Planta de Tratamiento de Agua Potable, Tanque de Almacenamiento y Linea de Conducción para los Barrios Villa del Norte y La Pradera en el Municipio de San Vicente del Caguan - Caquetá	1.339.442.916	AP - Nación	1.323.344.114	397.003.234	926.340.880	No se ha firmado acta de inicio por consiguiente el contratista no a requerido el pago del anticipo al PDA Caquetá
48	08/08/2013	No. 11		**Interventoria** Optimización de la Planta de Tratamiento de Agua Potable, Tanque de Almacenamiento y Linea de Conducción para los Barrios Villa del Norte y La Pradera en el Municipio de San Vicente del Caguan - Caquetá	107.155.433	SGP - APSB DPTO	106.984.660	10.698.466	96.286.194	Esta firmada el acta de incio del día 20 de nov. 2013, ya esta radicada la orden de pago del anticipo en el Consorcio FIA.
49	24/10/2013	No. 11	Gobernación	Garantizar la Transformación, Modernización Empresarial Y/O Fortalecimiento Institucional de Entidades Prestadoras	200.000.000	SGP - APSB DPTO				

- **Estado de proyectos presentados a mecanismo de viabilización.**

MUNICIPIO	NOMBRE DE PROYECTO	VALOR DEL PROYECTO	CONCEPTO TÉCNICO ACEPTABLE	DEVUELTO PARA AJUSTES
El Paujil	OPTIMIZACION SISTEMA DE ACUEDUCTO EN SUS COMPONENTES DE CAPTACION, ADUCCION, DESARENADOR, CONDUCCION, PTAP, TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y REDES DE DISTRIBUCION PARA EL MUNICIPIO DE EL PAUJIL - CAQUETA PRIMERA FASE	$1.798.297.061,00	NO	SI
Solano	OPTIMIZACION SISTEMA DE ACUEDUCTO EN SUS COMPONENTES DE CAPTACION, ADUCCION, DESARENADOR, CONDUCCION, PTAP, TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y REDES DE DISTRIBUCION PARA EL MUNICIPIO DE SOLANO – CAQUETA	$369.886.272,00	NO	SI
Morelia	CONSTRUCCION RED DE ACUEDUCTO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MORELIA	$2.115.768.607,00	SI	SI
San José del Fragua	PROYECTO CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL BARRIO VILLA SARAI DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA – CAQUETÁ	$276.632.691,60	No	SI
Florencia	CONSTRUCCIÓN ALCANTRAILLADO SANITARIO URBANIZACION EL BOSQUE (VEREDA SANTO DOMINGO) MUNICIPIO DE FLORENCIA	$935.928.930,00	No	No
Doncello	MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LAS VEREDAS PEÑAS NEGRAS - PUERTO MANRIQUE - BERLIN CON PLANTAS COMPATAS POTABILIZADORA DE AGUAS - MUNICIPIO EL DONCELLO - DEPARTAMENTO DE CAQUETA.	$300.000.000,00	No	No

- **Estado de proyectos presentados a mecanismo de viabilización, que requieran Reformulación.**

MUNICIPIO	NOMBRE DE PROYECTO	VALOR DEL PROYECTO	CONCEPTO TÉCNICO ACEPTABLE	DEVUELTO PARA AJUSTES	RAZON POR LA QUE REQUIERE REFORMULARSE	OBSERVACIONES
Solano	OPTIMIZACION SISTEMA DE ACUEDUCTO EN SUS COMPONENTES DE CAPTACION, ADUCCION, DESARENADOR, CONDUCCION, PTAP, TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y REDES DE DISTRIBUCION PARA EL MUNICIPIO DE SOLANO – CAQUETA	$369.886.272,00	NO	SI	Rediseño	Tiene más de 54 puntos para ajustar.
San José del Fragua	PROYECTO CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL BARRIO VILLA SARAI DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA – CAQUETÁ	$276.632.691,60	NO	SI	Rediseño	El Proyecto se rediseño y cambio el valor del proyecto (Reformular Fuentes de Financiación)

- **Relación de proyectos con concepto técnicamente aceptable asignación de recursos a proyectos – PAEI 2013:**

LISTADO DE PROYECTOS - PARA ASIGNAR RECURSOS -		ESTRUCTURACION FINANCIERA - ASIGNACION DE RECURSOS				
MUNICIPIO	NOMBRE DE PROYECTO	VALOR DEL PROYECTO	CONCEPTO DE VIABILIDAD	SGP – APSB PDTO	Audiencias Públicas	SGP - APSB Municipios
Belén de los Andaquíes	OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO (ADECUACION BOCATOMA, DESARENADOR, CAMBIO RED DE CONDUCCION, ADECUACION PTAP) PARA EL MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES.	$2.131758.228	SI	$157.908.017	$1911055.872	$62.794.339
Puerto Rico	OPTIMIZACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PUERTO RICO - CAQUETA	$1974.300.193	SI	$146.244.459	$1556.197.769	$271857.965
San Vicente del Caguan	OPTIMIZACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y LINEA DE CONDUCCION PARA LOS BARRIOS VILLA DEL NORTE Y LA PRADERA EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN – CAQUETA	$1446.598.349	SI	$107.155.433	$1339.442.916	
Albania, San José del Fragua y Curilo	CONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL PARA LOS MUNICIPIOS DE ALBANIA, SAN JOSE DEL FRAGUA Y CURILLO FASE I	$10.451630.134	SI	$774.194.824	$9.677.435.310	
Solita	OPTIMIZACION DE LAS REDES DEL ACUEDUCTO URBANO Y CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE TIPO CONVENCIONAL PARA EL MUNICIPIO DE SOLITA – CAQUETA	$1997.592.619	SI	$147.969.824	$1757.677.878	$91944.917
Morelia	CONSTRUCCION RED DE ACUEDUCTO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MORELIA	$2.115.768.607	SI	$1834.287.126	$281481481	

- **Proyectos Viabilizados, relacionando Objeto, valor, metas, población beneficiada, Impactos, fuentes de financiación.**

  Impactos de los proyectos con concepto técnicamente aceptable / (Proyectos con recursos asignados PAEI).

NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO	ETAPA	ACUEDUCTO						ALCANTARILLADO		Cobertura inicial en Habitantes	Cobertura Final en Habitantes	Nuevos Habitantes	OBSERVACIONES
			CALIDAD		COBERTURA (%)		CONTINUIDAD (HORAS)		COBERTURA (%)					
			IRCA ACTUAL	IRCA CON PROYECTO	INDICE ACTUAL	INDICE CON PROYECTO	INDICE ACTUAL	INDICE CON PROYECTO	INICE ACTUAL	INDICE CON PROYECTO				
Construcción sistema de acueducto regional para los municipios de Albania, Curillo y San José de Fragua	San José de Fragua	Viabilizado y pendiente por licitar	8,9	Menor de 5	95%	99%	22	24	90	90	3485	9363	5878	
	Albania		21,3	Menor de 5	97%	99%	20	24	90	90	2384	6394	4010	
	Curillo		5,7	Menor de 5	85%	99%	3	24	30	30				Una vez se ejecute la Fase II
Optimización del sistema de acueducto (Adecuación bocatoma, desarenado, cambio de red de conducción, adecuación PTAP) para el municipio de Belén de los Andaquíes.	Belén de los Andaquíes	Viabilizado y pendiente por licitar	0,2	0,2	94%	99%	12	24	85,5	85,50%	3510	6083	2573	
Optimización de las redes de acueducto urbano y construcción planta de tratamiento de agua potable tipo convencional para el municipio de Solita - Caquetá	Solita	Viabilizado y pendiente por licitar	39,6	Menor de 5	95%	95%	12	24	80	80%	1752	3047	1295	
Optimización de la planta de tratamiento de agua potable, tanque de almacenamiento y línea de conducción para los barrios villa norte y la pradera en el municipio de San Vicente del Caguán - Caquetá	San Vicente del Caguán	Viabilizado y pendiente por licitar	33,3	Menor de 5	98%	99%	12	18	48	48	0	2600	2600	
Optimización y ampliación del sistema de acueducto del casco urbano del municipio de Puerto Rico - Caquetá	Puerto Rico	Viabilizado y pendiente por licitar	28,2	Menor de 5	95%	99%	12	24	86	86	9697	13186	3489	
Construcción de red de acueducto y la planta de tratamiento de agua potable para el casco urbano del municipio de Morelia – Caquetá	Morelia	Viabilizado y pendiente por licitar	56,9	Menor de 5	82%	95%	8	24	75	75	1446	1763	317	
Construcción del acueducto y alcantarillado del barrio villa Sarai del Municipio de San José de Fragua – Caquetá	San José de Fragua	Radicado en el MVCT	0	Menor de 5	0	100%	0	24	0	100%	150	150		No existe obras
Optimización sistema de acueducto en sus componentes de captación, aducción, desarenador, conducción, ptap, tanque de almacenamiento y redes de distribución para el municipio de Paujil - Caquetá Primera Fase	Paujil	Viabilización	5,69	Menor de 5	90%	99%	6	18	82	82	8635	9595	960	
Optimización sistema de acueducto en sus componentes de captación, aducción, desarenador, conducción, ptap, tanque de almacenamiento y redes de distribución para el municipio de Solano – Caquetá	Solano	Viabilización	20,2	Menor de 5	85%	99%	6	20	80	80	1624	1911	287	
Construcción alcantarillado sanitario urbanización El Bosque (Vereda Santo Domingo) del municipio de Florencia - Caquetá	Florencia	Radicado en le MVCT	4,7	Menor de 5	98%	98%	0	24	0	100%	552	552		No existen obras
Mejorar la calidad de vida de los habitantes de las veredas Peñas Negras - Puerto Manrique - Berlín con plantas compactas potabilizadora de aguas del municipio el Doncello - Caquetá	Doncello	Radicado en MVCT	90	Menor de 5	0	100%	0	24	0	0	1256	1256		No existen obras

PROCESOS EN CONTRATACIÓN ADELANTADOS.

El Departamento del Caquetá, Secretaria de Infraestructura (GESTOR PDA-PAP), como gestora del Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento PAP-PDA, ha adelantado procesos de contratación para el cumplimiento

de las metas y objetivos de la política del sector de agua potable y saneamiento básico en los municipios vinculados al PAP-PDA del Departamento del Caquetá.

Durante el SEGUNDO semestre de 2013, se han suscritos cuatro (04) procesos de contratación de Interventorías que ascienden en la suma de **$1.038.924.514**, como se describe en la siguiente tabla:

Tabla No. 02
Procesos de Contratación Realizados

No.	PLAZO	FECHA	OBJETO	CONTRATISTA	VALOR TOTAL
29	SEIS (6) MESES	14 DE NOV. DE 2013	**INTERVENTORIA** OPTIMIZACION DE LAS REDES DEL ACUEDUCTO URBANO Y CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE TIPO CONVENCIONAL PARA EL MUNICIPIO DE SOLITA – CAQUETA	CONSORCIO CAGUAN	$106.984.660
30	SEIS (6) MESES	14 DE NOV. DE 2013	**INTERVENTORIA** OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO (ADECUACION BOCATOMA, DESARENADOR, CAMBIO RED DE CONDUCCION, ADECUACION PTAP) PARA EL MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES.	UNION TEMPORAL ECI S.A.S	$157.862.574
31	SEIS (6) MESES	14 DE NOV. DE 2013	**INTERVENTORIA** OPTIMIZACION DE LAS REDES DEL ACUEDUCTO URBANO Y CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE TIPO CONVENCIONAL PARA EL MUNICIPIO DE SOLITA – CAQUETA	GERMAN VILLANUEVA CALDERON	$147.962.640
32	NUEVE (9) MESES	14 DE NOV. DE 2013	**INTERVENTORIA** CONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL PARA LOS MUNICIPIOS DE ALBANIA, SAN JOSE DEL FRAGUA Y CURILLO FASE I	CONSORCIO ING INTERVENTORES ASOCIADOS PDA CAQUETA	$774.077.280
TOTAL					**$1.038.924.514**

INFORMACION DE PROYECTOS EN EJECUCION.

Se recomienda adjuntar fotografías con el estado actual de ejecución de los proyectos en ejecución. Además, se recomienda incluir el estado financiero de los proyectos en ejecución: desembolsos efectuados y por desembolsar.

Los proyectos que se encuentran en ejecución están en proceso de iniciación, los contratista de la obra civil se encuentran perfeccionando el contrato, están concertando las actas de inicio con el interventor, se han radicado dos órdenes de pago ante el Consorcio FIA para los respectivos desembolsos, por lo anterior expuesto no se anexan fotografías ya que las obras civiles no han iniciado.

INFORMACION DE PROYECTOS TERMINADOS.

Se recomienda adjuntar fotografías con el estado final de ejecución de los proyectos terminados.

INFORMACION DE PROYECTOS EMERGENCIAS ATENDIDAS.

Para la vigencia 2013, no se atendió proyectos de emergencia.

INFORMACION DE PROYECTOS POR PRESENTAR.

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE PROYECTO	VALOR PROYECTO	SOLICITANTE	FECHA ESTIMADA DE PRESENTACIÓN
Caquetá	Florencia	Construcción del Sistema de Acueducto, Alcantarillado Sanitario y Obra de Urbanismo de la Urbanización Ana María del Municipio de Florencia – Departamento del Caquetá	$	ENTE TERRITORIAL	31/01/2014
	San José del Fragua	Construcción del Alcantarillado de Agua Servidas en la Inspección de Zabaleta del Municipio de San José del Fragua - Caquetá	$	ENTE TERRITORIAL	31/01/2014
	Florencia	Construcción de un Colector de Aguas Servidas, para Disminuir la Contaminación que Cae al Río Orteguaza que Afecta a Otros municipios de del Caquetá	$	ENTE TERRITORIAL	31/01/2014
	Solano	Sistema de Acueducto y Alcantarillado del Casco Urbano del Municipio de Solano, Departamento del Caquetá	$	ENTE TERRITORIAL	31/01/2014

COMITES DIRECTIVOS EFECTUADOS

Relacionar la información de los comités directivos efectuados. Incluir como anexo las actas suscritas.

RESUMEN COMITES DIRECTIVOS EFECTUADOS

No. DE COMITÉ	FECHA	TEMAS TRATADOS	COMPROMISOS	OBSERVACIONES
11	02/05/2013	Presentación y aprobación Instrumentos de Planeación. Socialización Línea Base y Aseguramiento de la prestación del Servicio. Socialización Plan de Gestión Social (Gerencia Asesora)	Por parte de la Gerencia Asesora SAI PDA Caquetá, quedo el compromiso de socializar el Aseguramiento de la Prestación del servicio y el PGS, en compañía del MVCT y el DNP.	Quedaron aprobados, pero se requiere de ajustar algunas observaciones realizadas por el MVC y DNP
12	29/11/2013	Avance de la contratación del PAP – PDA Caquetá, Municipios (obra civil) Interventoría (gestor PDA Caquetá)	Cumplir con las fechas del cronograma del proceso contractual	Se definió que el Municipio de San Vicente del Caguan desmotaría el proceso que adelanto para la contratación de la interventoría del proyecto.

13	11/12/2013	Avance de la contratación del PAP – PDA Caquetá. Modificaciones al PGEI y el PAEI 2013. Reformulación Fuentes de Financiación Proyecto Villa Saray. Socialización AEGyR.	Para los Municipios que agilicen las actas de inicio con los contratistas. Coordinar con la Corpoamazonia las actividades del componente ambiental del PDA Caquetá	La empresa auditora HIPSITEC se comprometió a la entrega de un modelo de indicadores de gestión.

ASPECTOS QUE INCIDIERON EN LA EJECUCIÓN DEL PAEI 2013

El Departamento de Caquetá – Plan Departamental de Agua., como responsable de la gestión, implementación y seguimiento a la ejecución del PAP-PDA, debe tramitar ante el Departamento del Caquetá, los proyectos relacionados con el fortalecimiento para la remuneración del Gestor y los asociados con el plan de aseguramiento de la prestación de los servicios públicos de agua potable y saneamiento básico, infraestructura, ambiental y social, con el fin de obtener la viabilización que permita la asignación de los recursos definidos por diferentes fuentes que financian los componentes del Plan Anual Estratégico y de Inversiones – PAEI 2013. *Señale el avance del Plan Anual Estratégico de Inversiones, detallando el cumplimiento de los cronogramas allí fijados, las metas propuestas, el estado de avance de los proyectos en ejecución y de los procesos de contratación*

Estos procesos inciden en la ejecución de las metas y objetivos trazados en los componentes del PAEI 2013, los cuales se vienen desarrollando de acuerdo a los procedimientos establecidos para cada una de las fuentes de financiación.

CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS DEL GESTOR DEL PAP-PDA

En cumplimiento de los compromisos establecidos en el Comité Directivo del PAP-PDA, realizado el 02 de mayo de 2013, mediante Acta No. 11 - 2013, relacionados con los Planes de Acción de cada uno de los municipios vinculados al PDA del Caquetá, se presenta a continuación el cumplimiento del avance de elaboración y suscripción de los mismos, como se evidencia a continuación:

Tabla No. 03
Planes de Acción Elaborados y Firmados por Municipios del PAP-PDA

MUNICIPIOS VINCULADOS AL PDA	% DE PLANES DE ACCIÓN DEL PAP-PDA ELABORADOS			% DE PLANES DE ACCIÓN DEL PAP-PDA FIRMADOS		
	PROGRAMADOS	ELABORADOS	% DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO	ELABORADOS	FIRMADOS	% DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO
Albania	Acta No. 01	SI	10%		SI	10%
Belén de los Andaquíes	Acta No. 02	SI	50%		SI	50%
Cartagena del Chaira	Acta No. 04	SI	0%		SI	0%
Curillo	Acta No. 05	SI	0%		NO	0%
El Doncello	Acta No. 06	SI	0%		SI	0%
El Paujil	Acta No. 15	SI	50%		NO	50%
Florencia	Acta No. 07	SI	0%		NO	0%

MUNICIPIOS VINCULADOS AL PDA	% DE PLANES DE ACCIÓN DEL PAP-PDA ELABORADOS			% DE PLANES DE ACCIÓN DEL PAP-PDA FIRMADOS		
	PROGRAMADOS	ELABORADOS	% DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO	ELABORADOS	FIRMADOS	% DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO
Milán			100%			100%
Montañita	Acta No. 14	SI	0%		NO	0%
Morelia	Acta No. 08	1	30%		SI	30%
Puerto Rico						
San José del Fragua	Acta No. 12	SI	30%		SI	30%
San Vicente del Caguan	Acta No. 03	SI	30%		SI	30%
Solano						
Solita	Acta No. 11	SI	0%		NO	0%
Valparaiso	Acta No. 09	1	30%		SI	30%
TOTALES			95%			100%

De los dieciséis (16) municipios vinculados al PAP-PDA del Caquetá, sólo se han elaborado y concertado trece (13) Planes de Acción con los municipios descritos en la tabla anterior, debido a que el Municipio de Milán – Puerto Rico- Solano , ha atendido o no ha atendido los requerimientos efectuados por parte del Gestor del PAP- PDA., como responsable de la gestión, implementación, seguimiento a la ejecución del PAP-PDA y los asuntos relacionados con agua potable y saneamiento básico en el Departamento del Caquetá.

De los trece (13) planes de acción elaborados y concertados con los municipios vinculados al PAP-PDA, se han firmado el 50% de ellos, por parte del Representante del Departamento del Caquetá, los Alcaldes de los municipios pertenecientes al PAP-PDA, como Gestor del PAP-PDA.

En cuanto al Plan de Aseguramiento para la Prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo 2013-2015, se aprobó la Fase I que consta del Diagnóstico y Pre - factibilidad a realizarse en los seis (06) municipios vinculados en el PAP-PDA, la cual tiene plazo de entrega a fines del mes de febrero de 2014. De acuerdo con los resultados de la Fase I, se establecerá en la Fase II el escenario de acción frente a cada municipio perteneciente al PAP-PDA Caquetá y en la Fase III la puesta en marcha de la estrategia establecida en la Fase II, para lo cual se ajustará el Plan de Aseguramiento de la Prestación.

En este sentido, se viene elaborando por parte del Gestor del PAP-PDA, los pliegos para el proceso de licitación del diagnóstico y Pre - factibilidad de los servicios públicos de agua potable y saneamiento básico en los municipios vinculados en el PAP-PDA, así como sobre el tema del estudio de capacidad y disponibilidad de pago.

JAIME HERMOSA SAAVEDRA
Gestor del PAP-PDA

ANEXOS

Anexar la información correspondiente a comités, reuniones, convenios, contratos suscritos, actas de concertación con alcaldes, comités directivos presenciales, comités virtuales, oficios, **COPIA DE PLANES DE ACCION,** compromisos suscritos por parte de los municipios (Actas), Cdr's expedidos, relación de obras contratadas, estado de avances y **toda documentación importante en el marco del PDA y el programa APP.**

IMPORTANTE

Este informe se encuentra fundamentado en la cláusula Decima Octava del Convenio Interadministrativo de Uso de Recursos No 64 de 2009. En el marco de la Política de Planes Departamentales de Agua y Saneamiento Básico (Hoy Programa Agua para la Prosperidad-Planes Departamentales de Agua –PAP-PDA.):

> *"(…) DECIMA OCTAVA. – INFORMES: EL DEPARTAMENTO deberá presentar al MINISTERIO informes semestrales en los cuales se incluya el estado de avance del cumplimiento del objeto y las obligaciones previstas en el presente convenio,* ***los cuales deberán ser presentados con los respectivos soportes, actas, comunicaciones, ordenanzas departamentales, acuerdos municipales, etc., a que haya lugar.*** *(…)"*

Y el Artículo 14, numeral 23 del Decreto No. 2246 del 31 de Octubre de 2012:

> *"(…)* ***Artículo 14. Funciones del Gestor****. Son funciones del Gestor: (...) 23. Enviar informe a todos los miembros del Comité Directivo con una periodicidad de dos meses, en el que se señale el avance del Plan Anual Estratégico de Inversiones, detallando el cumplimiento de los cronogramas allí fijados, las metas propuestas, el estado de avance de los proyectos en ejecución y de los procesos de contratación (…)".*

ANEXO
SEGUIMIENTO AL PLAN DE GESTION SOCIAL

En atención al cronograma de trabajo del Plan de Gestión Social – PGS PAP-PDA diseñado para el periodo 2013, en el cual se establecieron cada una de las actividades a desarrollar, se diligencia el siguiente formato, cualquier observación, inclusión de actividades, dificultades o sugerencias que tenga respecto al tema por favor hacer la correspondiente anotación.

INFORMACIÓN GENERAL:

Departamento		
Nombre del Gestor	**# Celular**	**Correo Electrónico**
JAIME HERMOSA SAAVEDRA	3203703390	Jaimehs2011@hotmail.com
Nombre Responsable PGS	**# Celular**	**Correo Electrónico**
ISRAEL MENDEZ PIAMBA ANGEL ANTONIO ARAGONES MARTHA CECILIA CUELLAR CALDERON	3103181974 3212493108 3204944087	israelmendezpiamba@gmail.com engel1083@hotmail.com marthacecu@hotmail.com

DATOS DEL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL PAP-PDA:

Fecha aprobación Comité Directivo	**# Acta de Comité Directivo**
26 de julio de 2012	**No. 08**
Presupuesto asignado	**Presupuesto ejecutado**
ND	**ND**
Cuenta con Cronograma de Trabajo del PGS PAP-PDA	**SI _____** **NO _X_**
Fecha de inicio del PGS PAP-PDA	

Si la respuesta es NO, explique la o las causas?
El PGS fue presentado por la Gerencia Asesora SAI PDA Caquetá, al Comité Directivo No. 08 el 26 de julio de 2012, en cuyo plan se relaciona las actividades que comprende la gestión social, pero no implementaron un cronograma de trabajo con fechas puntuales para el cumplimiento de las metas de las actividades, tampoco realizaron una estimación de los recursos que se necesitaban para la ejecución de las actividades y poder ejecutar el PGS. El contrato de la Gerencia Asesora terminó en el mes de mayo de 2013, por lo anterior el Gestor realizó contratación de personal especializado para continuar con las actividades que entrego la Gerencia. El grupo de apoyo al Gestor en el componente social trabaja en el cronograma para ejecutar las actividades propuestas y la asignación de recursos, con esta nueva estrategia se pretende cumplir con las metas propuesta para la vigencia 2014, en la cual se presentara en el próximo Comité Directivo del PAP – PDA Caquetá, donde se socialice y aprueben los instrumentos de planeación del PAP – PDA.

ANEXO
SEGUIMIENTO METAS FISICAS Y FINANCIERAS - PLAN ANUAL ESTRATÉGICO Y DE INVERSIONES DEL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ

MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	Componente	Monto del Proyecto PAEI 2013	REPORTE DE PROYECTO				PROGRAMACION CONTRATACION	REPORTE FIDUCIA			Indicador de Avance PAEI 2013
				Viabilizado		Contratado			Avance Financiero			
				Monto Viabilizado	Fecha de Viabilizado	Monto Proyectado Contratado	Porcentaje avance fisico		Monto CDR Solicitados	Monto Contratados	Pagos Realizados	
Albania, San José del Fragua y Curillo	CONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL PARA LOS MUNICIPIOS DE ALBANIA, SAN JOSE DEL FRAGUA Y CURILLO FASE I	Inversión	$9.677.435.310	$9.677.435.310	31-jul-13	$9.677.363.975	0%	cumplido	$9.677.435.310	$9.677.363.975	ND	0%
	Interventoria CONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL PARA LOS MUNICIPIOS DE ALBANIA, SAN JOSE DEL FRAGUA Y CURILLO FASE I	Inversión	$774.194.824	$774.194.824	31-jul-13	$774.077.280	0%	cumplido	$774.194.824	$774.077.280	ND	0%
Belén de los Andaquies	OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO (ADECUACION BOCATOMA, DESARENADOR, CAMBIO RED DE CONDUCCION, ADECUACION PTAP) PARA EL MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES.	Inversión	$1.973.850.211	$1.973.850.211	31-jul-13	$1.972.062.186	0%	cumplido	$1.973.850.211	$1.972.062.186	ND	0%
	INTERVENTORIA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO (ADECUACION BOCATOMA, DESARENADOR, CAMBIO RED DE CONDUCCION, ADECUACION PTAP) PARA EL MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES.	Inversión	$157.908.017	$157.908.017	31-jul-13	$157.862.574	0%	cumplido	$157.908.017	$157.862.574	$15.786.257	100%
San Vicente del Caguan	OPTIMIZACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y LINEA DE CONDUCCION PARA LOS BARRIOS VILLA DEL NORTE Y LA PRADERA EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN – CAQUETA	Inversión	$1.339.442.916	$1.339.442.916	13-ago-13	$1.323.344.114	0%	cumplido	$1.339.442.916	$1.323.344.114	NO	0%
	INTERVENTORIA OPTIMIZACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y LINEA DE CONDUCCION PARA LOS BARRIOS VILLA DEL NORTE Y LA PRADERA EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN – CAQUETA	Inversión	$107.155.433	$107.155.433	13-ago-13	$106.984.660	0%	cumplido	$107.155.433	$106.984.660	$10.698.466	100%
Solita	OPTIMIZACION DE LAS REDES DEL ACUEDUCTO URBANO Y CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE TIPO CONVENCIONAL PARA EL MUNICIPIO DE SOLITA – CAQUETA	Inversión	$1.849.622.795	$1.849.622.795	31-jul-13	$1.849.622.658	0%	cumplido	$1.849.622.795	$1.849.622.658	ND	0%
	Interventoria OPTIMIZACION DE LAS REDES DEL ACUEDUCTO URBANO Y CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE TIPO CONVENCIONAL PARA EL MUNICIPIO DE SOLITA – CAQUETA	Inversión	$147.969.824	$147.969.824	31-jul-13	$147.962.640	0%	cumplido	$147.969.824	$147.962.640	ND	0%
Gobernación	Costo del Gestor vigencia 2013	Asegura miento	$900.000.000	$900.000.000	31-jul-13	$900.000.000	100%	cumplido	$900.000.000	$662.184.594	$307.130.958	74%
TOTAL			$16.927.579.330	$16.927.579.330		$16.909.280.087			$16.927.579.330	$16.671.464.681	$333.615.681	

COMPONENTE	PRIORIZADO PAEI 2013		VIABILIZADO - VAS	CONTRATADO		GIRADO FIDUCIA	
	Monto	# Proyectos	Monto	Monto	# Proyectos	Monto	# Proyectos
Inversión	$29.560.834.907	11	$18.001.879.523	$14.822.392.933	4		
Pre inversión	$900.000.000	8	$900.000.000				
Aseguramiento	$900.000.000	28	$900.000.000	$662.184.594		$307.130.958	25
Institucional	$600.000.000	2	$600.000.000				
Ambiental	$378.000.000	3	$378.000.000				
Emergencias	$200.000.000	N/A	$200.000.000				
Interventoría	$2.436.866.793	11	$1.333.472.557	$1.186.887.154	4	$26.484.723	2
TOTAL	**$34.975.701.700**	**63**	**$22.313.352.080**	**$16.671.464.681**	**8**	**$333.615.681**	**27**

ANEXO
SEGUIMIENTO AL PLAN AMBIENTAL

SEGUIMIENTO ESTRUCTURACIÓN DEL PLAN AMBIENTAL

Esta etapa será incluida en el informe hasta que sea aprobado el Plan Ambiental para el PAP-PDA.

Indicar si el documento del Plan Ambiental se encuentra en:

- **Estructuración:** Mostrar los avances en la estructuración del Plan Ambiental, los participantes y gestión adelantada por parte del Gestor para la construcción del mismo. Mesas de trabajo realizadas con la Autoridad Ambiental Competente, Gobernación y otros actores.
