

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA-GESTOR PAP-PDA

PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA DE CAQUETÁ





**INFORME DE AVANCE DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA EN EL CAQUETÁ
PLAN ANUAL ESTRATEGICO DE INVERSIONES PAEI 2017**



PERIODO COMPRENDIDO: SEPTIEMBRE-OCTUBRE DE 2017

FLORENCIA 2017

Concepto	Nombre y apellido	Cargo	Firma
Elaboró	Blanca Flor Carvajal Becerra	Apoyo Administrativo Servicios Profesionales PAP-PDA	
Revisión contractual	Jhon Freddy Ríos Flórez	Apoyo Técnico Servicios Profesionales PAP-PDA	
Revisión Jurídica	Diego Fernando Jaramillo Alvira	Apoyo jurídico Servicios Profesionales PAP-PDA	

Página 1 de 30

Con usted hacemos más por el Caquetá

Carrera 13 Calle 15 Esquina – Teléfono: (098) 4358240-4361144 Fax: 4353367

www.caqueta.gov.co – infraestructura@caqueta.gov.co

www.pdacaqueta.gov.co – apoyogestor@pdacaqueta.gov.co

Florencia – Caquetá – Colombia



En aras de continuar con el cumplimiento a lo dispuesto en el Plan de Desarrollo Departamental "CON USTED HACEMOS MAS POR EL CAQUETÁ 2016 – 2019" y en cumplimiento del Decreto 1077 de 2015, "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario para el Sector Agua Potable y Saneamiento Básico" establece en su artículo 2.3.3.1.2.5. Numeral 2 que el Gestor es el responsable de la gestión, implementación, seguimiento a la ejecución del PAP-PDA y los asuntos relacionados con Agua Potable y Saneamiento Básico en el Departamento, en concordancia al Plan Anual Estratégico de Inversiones 2017 del PAP-PDA Caquetá.

El pasado 10 de marzo de 2017 en sesión de Comité Directivo No. 22 del PAP-PDA, se aprobaron los Instrumentos de Planeación por parte de los Integrantes del Comité Directivo del PAP-PDA Caquetá, los cuales se relacionan:

- Plan General Estratégico de Inversiones 2016-2019 (Ajuste)
- Plan Anual Estratégico de Inversiones 2017
- Plan Ambiental 2017 -2019
- Plan de Gestión Social PGS 2017

Cuadro No. 1 PLAN ANUAL ESTRATEGICO DE INVERSIONES 2017 APROBADO

COMPONENTE	FUENTE DE RECURSOS (Millones de Pesos)	
	VALOR PGEI AJUSTADO	VALOR PAEI 2017
Aseguramiento de la Prestación de los Servicios y Desarrollo Institucional	5.500	1.300
Gestor (Anexo productos)	3.000	1.000
Plan de Gestión Social	900	300
Plan de Aseguramiento	1.600	
Infraestructura, Obras y Servicios	59.316	36.786
Obras	54.493	33.746
Interventoría	4.473	2.740
Pre-inversión	350	300
Ambiental	2.500	1.460
Gestión de Riesgo Sectorial	1.600	430
TOTAL	68.916	39.976

Que el 09 de mayo de 2017, se llevó a cabo sesión de Comité Directivo Virtual del PAP-PDA, en el cual se aprobó el primer ajuste al Plan Anual Estratégico de Inversiones 2017. Según Acta de Comité Directivo No. 23 de 2017.

Que el 08 de septiembre de 2017, se llevó a cabo sesión de Comité Directivo Virtual del PAP-PDA, en el cual se aprobó el tercer ajuste al Plan Anual Estratégico de Inversiones 2017. Según Acta de Comité Directivo No. 25 de 2017.

Concepto	Nombre y apellido	Cargo	Firma
Elaboró	Bianca Fior Carvajal Becerra	Apoyo Administrativo Servicios Profesionales PAP-PDA	
Revisión contractual	Jhon Freddy Ríos Flórez	Apoyo Técnico Servicios Profesionales PAP-PDA	
Revisión Jurídica	Diego Fernando Jaramillo Alvira	Apoyo jurídico Servicios Profesionales PAP-PDA	

NIT.800.091.594-4
SI/PDA-40

Conforme a lo anterior se presenta el tercer informe del avance en la ejecución de las actividades realizadas en cumplimiento de la política pública del Plan Departamental de Agua de Caquetá, conforme al PAEI 2017. Según las prioridades del sector en el departamento de Caquetá y en el marco del Manual Operativo del PAP – PDA, los componentes de inversión del PAEI, son agrupados en cuatro (4) ejes estratégicos:

- Aseguramiento de la Prestación de los Servicios y Desarrollo Institucional.
- Infraestructura, obras y servicios.
- Componente Ambiental.
- Gestión del Riesgo Sectorial.

1. COMPONENTE DE ASEGURAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

1.1. FORTALECIMIENTO DEL GESTOR

En el cumplimiento de este componente y avance de los productos del Gestor PAP-PDA Caquetá, inmersos en el PAEI 2017 conforme al Decreto 1077 de 2015, en su ARTÍCULO 2.3.3.1.4.14. Funciones del Gestor, los cuales se relacionan en la siguiente matriz:

Para alcanzar el cumplimiento a los compromisos asumidos en el Plan Anual Estratégico e Inversiones – PAEI 2017, la Secretaría de Infraestructura – Gestor PAP-PDA Caquetá, se establecieron las actividades y productos en correlación a los 4 componentes para el cumplimiento de las metas.

VER CUADRO EN EXCEL (Matriz productos del Gestor PAP-PDA Caquetá)

1.2. SALDO A LA FECHA RECURSOS DEL GESTOR 2017 PAP – PDA CAQUETA

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE RECURSOS No. 2351 DEL 23 DE MARZO DE 2017	
VALOR DEL CDR No. 2351	\$ 1.000.000.000
VALOR CONTRATADO A CORTE JUNIO DE 2017	\$ 942.754.000
SALDO POR EJECUTAR GESTOR PAP-PDA 2017	\$ 57.246.000

1.3. ACTORES PARTICIPANTES DEL PROGRAMA AGUA PARA LA PROSPERIDAD – PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA PAP - PDA EN EL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ.

El Programa Agua para la Prosperidad - Plan Departamental de Agua del Caquetá PAP - PDA, cuenta con los 16 Municipios del Departamento como participantes vinculados mediante Convenio de Cooperación y Apoyo Financiero – CCAF suscrito entre el Departamento, Municipio y Gestor (Tripartito), los cuales reúnen los requisitos contemplados en el Decreto 1077 de 2015.

1.4. MUNICIPIOS CON SUSCRIPCIÓN DE NUEVA VINCULACIÓN MEDIANTE CONVENIO DE COOPERACIÓN Y APOYO FINANCIERO – CCAF PARA LA VINCULACIÓN AL PAP-PDA CAQUETÁ.

Concepto	Nombre y apellido	Cargo	Firma
Elaboró	Blanca Flor Carvajal Becerra	Apoyo Administrativo Servicios Profesionales PAP-PDA	
Revisión contractual	Jhon Freddy Ríos Flórez	Apoyo Técnico Servicios Profesionales PAP-PDA	
Revisión Jurídica	Diego Fernando Jaramillo Alvira	Apoyo jurídico Servicios Profesionales PAP-PDA	

Página 3 de 30

Con usted hacemos más por el Caquetá

Carrera 13 Calle 15 Esquina – Teléfono: (098) 4358240-4361144 Fax: 4353367

www.caqueta.gov.co – infraestructura@caqueta.gov.co

www.pdacqueta.gov.co – apoyogestor@pdacaqueta.gov.co

Florencia – Caquetá – Colombia



NIT.800.091.594-4
SIVPDA-40

Dentro de los logros resaltantes por el Gestor y su equipo de trabajo fue vincular nuevamente al municipio de Cartagena del Chairá al PAP-PDA, donde dicho municipio se encuentra realizando el aporte conforme a lo consignado en el convenio tripartito No. 026 y a la autorización de giro de los recursos del sector de agua potable y saneamiento comprometido en esta vigencia.

1.5. MUNICIPIOS VINCULADOS AL PAP-PDA CON CONVENIO TRIPARTITO

El departamento de Caquetá cuenta con sus 16 municipios vinculados al PAP-PDA mediante convenio suscrito entre el Departamento, el Municipio y el Gestor como lo son:


1. Albania
2. Belén de los Andaquíes
3. Cartagena del Chairá
4. Curillo
5. El Doncello
6. El Paujil
7. Florencia
8. La Montañita
9. Milán
10. Morelia
11. Puerto Rico
12. San José del Fragua
13. San Vicente del Caguán
14. Solano
15. Solita
16. Valparaíso

De los anteriores municipios se encuentran aportando recursos al Patrimonio Autónomo FIA catorce (14) municipios, donde los municipios de San Vicente del Caguán y Solita no han legalizado el aporte de la vigencia 2016 y la actual, pese a las diferentes acciones realizadas por el Gestor del PAP-PDA. Esta situación ocasiona que para la financiación de proyectos en el sector para el acceso de recursos que posee en la bolsa común, tanto de la Nación el Departamento y del Municipio, deben estar al día en el giro de sus aportes, a través de la suscripción de autorizaciones y/o modificaciones de giro que se desarrollan en cada anualidad.

1.6. MUNICIPIOS DESCERTIFICADOS POR LA SUPERSERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS DE SGP-APSB VIGENCIA 2015.

El Departamento de Caquetá posee dos (2) municipios descertificados por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios – SSPD para la administración de los recursos del SGP-APSB:

- 1) Curillo, descertificado mediante Resolución No. SSPD – 20164010053435 del 30 de septiembre de 2016, correspondiente a la vigencia 2015

Concepto	Nombre y apellido	Cargo	Firma
Elaboró	Bianca Flor Carvajal Becerra	Apoyo Administrativo Servicios Profesionales PAP-PDA	
Revisión contractual	Jhon Freddy Ríos Flórez	Apoyo Técnico Servicios Profesionales PAP-PDA	
Revisión Jurídica	Diego Fernando Jaramillo Alvíra	Apoyo jurídico Servicios Profesionales PAP-PDA	

Página 4 de 30

Con usted hacemos más por el Caquetá

Carrera 13 Calle 15 Esquina – Teléfono: (098) 4358240-4361144 Fax: 4353367

www.caqueta.gov.co – infraestructura@caqueta.gov.co

www.pdacaqueta.gov.co – apoyogestor@pdacaqueta.gov.co

Florencia – Caquetá – Colombia



 <p>GOBERNACIÓN DE CAQUETA REPUBLICA DE COLOMBIA</p>	<p>INFORME BIMENSUAL DEL AVANCE DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA DE CAQUETÁ PAP-PDA PAEI 2017</p>	 <p>Con Usted Hacemos Más por Caquetá</p>
--	--	--

NIT 800.091.594-4
SI/PDA-40

- 2) Milán, mediante Resolución No. SSPD – 20174010042945 del 30 de marzo de 2017, la cual resuelve en su artículo primero: CONFIRMAR la Resolución No. SSPD 20164010053755 del 30 de septiembre de 2016

Ante esta situación, el Departamento administra los recursos del SGP-APSB y es condicionada su inversión a las necesidades y compromisos que reporta el municipio.

A La fecha de este informe Bimensual se ha tramitado el pago de Transferencia de Recursos de Subsidios de Alcantarillado, Acueducto y Aseo de los Municipios de Milán y Curillo correspondiente a los meses de enero a agosto de 2017, excepto la Empresa de San Antonio de Getuchá de Milán cancelado hasta julio de 2017, por falta de radicación de las demás cuentas.

1.7. MUNICIPIOS CON FIRMA DE OTROSI Y MODIFICACIONES Y/O AUTORIZACIONES DE LOS RECURSOS DEL SGP-APSB CON DESTINO A INVERSIÓN AL PDA.

El PAP-PDA Caquetá han suscrito trece (13) modificaciones y autorizaciones de giro de los recursos del SGP-APSB para inversión en PDA, con el fin dar cumplimiento a la anualidad 2017 correspondiente a los municipios de Albania, Curillo, Belén de los Andaquíes, Milán, Morelia, Valparaíso, Florencia, La Montañita, El Doncello, Puerto Rico, Solano, San José del Fragua y Cartagena del Chairá; este último ente territorial con nueva vinculación mediante convenio tripartito.

En el siguiente cuadro, se aprecia los detalles de cada actor vinculado:

MUNICIPIO	OTROSI 2017 AL CCAF	PORCENTAJE DE COMPROMISO		APORTE 2017 (Millones/pesos)
		SUBS. AAA + INV. PDA	INVERSIÓN PDA	
Albania	No. 4 (13/06/2017)		Hasta el 35	150
Belén de los Andaquíes	No. 3 (13/06/2017)	60		165
Cartagena del Chairá	CCAF 026 (09/06/2017)		20	404
Curillo (*)	No. 5 (03/05/2017)	65		157
El Doncello	No. 4 (15/05/2017)	60		186
Florencia	No. 3 (23/06/2017)		10	514
La Montañita	No. 2 (15/05/2017)		15	239
Milán (*)	No. 5 (03/05/2017)	Hasta el 55		237
Morelia	No. 5 (28/06/2017)	60		146
Paujil	En proceso de trámite	Hasta el 60		0
Puerto Rico	No. 2 (23/06/2017)		23	443
San José del Fragua	No. 4 (03/08/2017)	65		400
San Vicente del Caguán	En proceso de trámite	70		0
Solano	No. 1 (03/08/2017)		20	382
Solita	En proceso de trámite	70		0
Valparaíso	No. 3 (03/05/2017)	50		250

(*) Municipios descertificados por la SSPD

1.8. FORMULACIÓN DE PLANES DE ACCIÓN SEGÚN LAS NECESIDADES CONCERTADAS ENTRE EL MUNICIPIO Y EL GESTOR DEL PAP-PDA

Concepto	Nombre y apellido	Cargo	Firma
Elaboró	Blanca Flor Carvajal Becerra	Apoyo Administrativo Servicios Profesionales PAP-PDA	
Revisión contractual	Jhon Freddy Ríos Flórez	Apoyo Técnico Servicios Profesionales PAP-PDA	
Revisión Jurídica	Diego Fernando Jaramillo Alvira	Apoyo Jurídico Servicios Profesionales PAP-PDA	

Página 5 de 30

Con usted hacemos más por el Caquetá

Carrera 13 Calle 15 Esquina – Teléfono: (098) 4358240-4361144 Fax: 4353367

www.caqueta.gov.co – infraestructura@caqueta.gov.co

www.pdacaqueta.gov.co – apoyogestor@pdacaqueta.gov.co

Florencia – Caquetá – Colombia



NIT. 800.091.594-4
S/PPDA-40

Se encuentra suscritos trece (13) planes de acción correspondiente a la vigencia 2017, identificando y concertando necesidades con el fin de priorizar proyectos direccionados al cumplimiento de los Planes de Desarrollo 2016 – 2019 de los municipios, del departamento y de los productos de Gestor contemplados en el Plan General Estratégico de Inversiones – PGEI y el Plan Anual Estratégico de Inversiones – PAEI 2017 en el sector de agua potable y saneamiento básico. A continuación, se relacionan los municipios que tienen suscrito Plan de Acción:

- 1) Cartagena del Chaira
- 2) Curillo
- 3) Belén de los Andaquíes
- 4) El Paujil
- 5) La Montañita
- 6) Morelia
- 7) Milán
- 8) Puerto Rico
- 9) San José del Fragua
- 10) Solano
- 11) Florencia
- 12) Valparaíso
- 13) El Doncello




Con respecto a los diez (10) primeros actores vinculados al PAP-PDA, se le priorizaron proyectos y viabilizaron recursos de financiación en Comité Directivo del PDA el 10 de marzo de 2017, con el objetivo de iniciar la ejecución en la presente vigencia, de acuerdo al Plan General Estratégico y de Inversiones PGEI 2016 – 2019 ajustado y al Plan Anual Estratégico de Inversiones PAEI 2017. Así mismo se aprecia que los municipios que no se encuentran aportando al PAP-PDA, no han suscrito Plan de Acción, a excepción del municipio de Albania, toda vez que están actualizando información en el diagnóstico de la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, con el fin de direccionar las inversiones en el sector.

1.9. ACTUALIZACIÓN DE LA LÍNEA BASE DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO E INFRAESTRUCTURA EXISTENTE DE LA ZONA URBANA Y RURAL.

Se espera que con la culminación del contrato de consultoría que tiene como alcance la implementación del "Plan de Aseguramiento de la prestación de los servicios públicos del departamento del Caquetá 2016" a través de la realización de actividades de fortalecimiento institucional direccionado a 15 municipios, se actualice la línea base que presente el diagnóstico general de la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo; así como la infraestructura existente de la zona, con el fin de retroalimentar la información para cada municipio vinculado al PAP-PDA, y así actualizar el diagnóstico del Departamento en el sector, con el fin de establecer indicadores precisos en el sector de agua potable y saneamiento básico, en cuanto a la cobertura, continuidad y calidad.

1.9.1. INDICADORES PRESTADORES DE SERVICIOS PÚBLICOS ÁREA RURAL

Se apoya en el acompañamiento a la Secretaría de Planeación de cada municipio del departamento para la toma de datos, con el fin de establecer una línea base que contengan características generales de la prestación de los servicios de acueducto y/o abastecimientos de agua, alcantarillado y aseo; así mismo

Concepto	Nombre y apellido	Cargo	Firma
Elaboró	Blanca Flor Carvajal Becerra	Apoyo Administrativo Servicios Profesionales PAP-PDA	
Revisión contractual	Jhon Freddy Ríos Flórez	Apoyo Técnico Servicios Profesionales PAP-PDA	
Revisión Jurídica	Diego Fernando Jaramillo Alvira	Apoyo jurídico Servicios Profesionales PAP-PDA	

Página 6 de 30

NIT 800.091.594-4
SI/PDA-40

las generalidades para conocer el estado de la infraestructura existente de la zona rural. En la actualidad se cuenta con información relacionada en indicadores de cobertura en acueducto rural del 67.06%, la cobertura de Alcantarillado del 38.94%; la cobertura de Aseo del 25.34%. Para acueducto, dicho porcentaje corresponde al consumo de agua cruda, toda vez que ninguno de los municipios de la zona rural recibe el consumo de agua tratada; el porcentaje de cobertura de alcantarillado corresponde a las soluciones individuales existentes mediante pozos sépticos y sitios a la intemperie donde vierten afectan directamente a lagunas, lagos, quebradas y humedales; el porcentaje de cobertura de aseo corresponde a los sitios de las zonas rurales que hacen la recolección mediante volquetas.

Municipios visitados.

Se han realizado visitas técnicas a las Inspecciones de los siguientes municipios:

La Montaña:	El Paujil:	El Doncello:
Mateguadua	Bolivia	Rio Negro
El Triunfo		Lusitania
Unión Peneya		La Chipa
San Vicente:	Valparaíso:	San José del Fragua:
Campo Hermoso	Playa Rica	Zabaleta
El Doncello:		
Puerto Manrique		
Maguaré		

De acuerdo a lo anterior, los centros poblados visitados poseen un expediente donde se encuentra el diagnóstico del estado actual de las infraestructuras existentes.

Las infraestructuras existentes en estas zonas requieren la construcción y/o la optimización de los sistemas en el sector; ante esta situación es importante realizar un estudio hídrico de las fuentes de abastecimiento, donde este indique la viabilidad de inversión. A raíz de las visitas realizadas a los centros poblados anteriormente enunciados, las inversiones presentan falencias constructivas, quedando inconclusas y solo quedan como soluciones directas de consumo de agua cruda.

El sistema de alcantarillado en dichas zonas presentan infraestructura que actualmente son en tuberías de egres, cemento y PVC, con un tiempo de construcción de hace 30 años, toda vez que estos sistemas ya cumplieron su vida útil, por ende se requiere la construcción y/o optimización, teniendo en cuenta el desarrollo del centro poblado y los niveles topográficos de la zona, para que las aguas residuales sean direccionadas a una planta de tratamiento que ayude a mitigar la contaminación de humedales, quebradas, nacimientos y represas de dichas zonas.

Concepto	Nombre y apellido	Cargo	Firma
Elaboró	Blanca Flor Carvajal Becerra	Apoyo Administrativo Servicios Profesionales PAP-PDA	
Revisión contractual	Jhon Freddy Ríos Flórez	Apoyo Técnico Servicios Profesionales PAP-PDA	
Revisión Jurídica	Diego Fernando Jaramillo Alvira	Apoyo jurídico Servicios Profesionales PAP-PDA	

Página 7 de 30

NIT.800.091.594-4
S/PPDA-40



1.9.2. CAPACITACIONES OPERARIOS DE LAS PTAP

Como parte del apoyo técnico y acompañamiento a los operadores de la prestación de los servicios públicos en las cabeceras municipales del departamento, se inició la construcción de una línea base del estado estructural y equipamiento de las PTAP en el departamento del Caquetá, con el ánimo de elaborar un Plan de Aseguramiento de la Calidad del Agua para el departamento que tenga como fin último el mejoramiento de la calidad de vida de los caqueteños.

Buscando atender las necesidades inmediatas en operación y mantenimiento de las PTAP y monitoreo y control de los procesos de potabilización, se realizaron capacitaciones a los operarios de las PTAP en los municipios de El Paujil, Solita, Belén de los Andaquíes y El Doncello. Las temáticas abordadas fueron:

- Operación y mantenimiento de los sistemas de potabilización
- Preparación de soluciones
- Pruebas de jarras y determinación de dosis óptimas para el tratamiento
- Estimación de caudales de entrada y salida de la PTAP
- Monitoreo y control del proceso de potabilización
- Laboratorio de proceso y pruebas analíticas a realizar
- Implementación de registros de operación y monitoreo y control del proceso.

Adicionalmente se brindo asesoría permanente a las ESP de los municipios de Cartagena del Chaira, Milán y Valparaíso para la realización de adecuaciones y adquisición de reactivos de laboratorio necesarios para implementar las pruebas de monitoreo del proceso y verificación de la calidad de agua suministrada a redes de distribución.

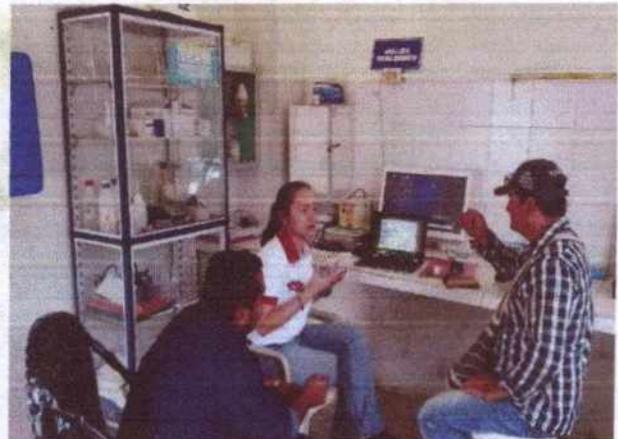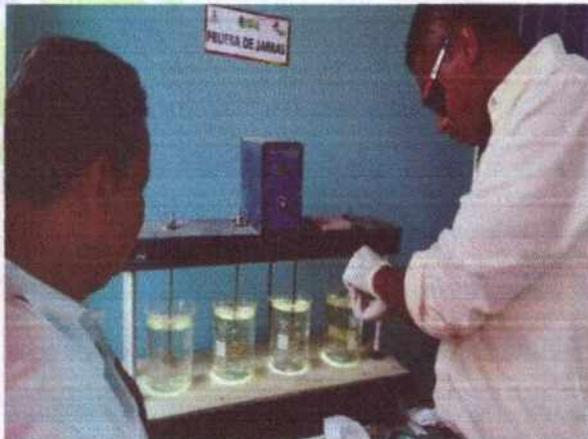

El Gestor del PAP-PDA continuará trabajando en pro del fortalecimiento institucional desde la óptica del marco legal, técnico, comercial, financiero y social.

2. IMPLMENTACION PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ.

Concepto	Nombre y apellido	Cargo	Firma
Elaboró	Bianca Fior Carvajal Becerra	Apoyo Administrativo Servicios Profesionales PAP-PDA	
Revisión contractual	Jhon Freddy Ríos Flórez	Apoyo Técnico Servicios Profesionales PAP-PDA	
Revisión Jurídica	Diego Fernando Jaramillo Alvira	Apoyo jurídico Servicios Profesionales PAP-PDA	

Página 8 de 30

Con usted hacemos más por el Caquetá

Camera 13 Calle 15 Esquina – Teléfono: (098) 4358240-4361144 Fax: 4353367

www.caqueta.gov.co – infraestructura@caqueta.gov.co

www.pdacaqueta.gov.co – apoyogestor@pdacaqueta.gov.co

Florencia – Caquetá – Colombia

 GOBERNACIÓN DE CAQUETÁ <small>REPUBLICA DE COLOMBIA</small>	INFORME BIMENSUAL DEL AVANCE DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA DE CAQUETÁ PAP-PDA PAEI 2017	
--	---	---


NIT 800.091.594-4
SI/PDA-40

Balance del estado financiero actual del contrato de consultoría, su estado es el siguiente:

PAGOS A SEPTIEMBRE DE 2017	
CONTRATO No	017 de 2017
OBJETO	CONSULTORÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL "PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ 2016".
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL ASEGURAMIENTO CAQUETÁ
VALOR CONTRATO	\$1.503.998.000
VALOR ANTICIPADO (30%)	\$451.199.400
VALOR PAGO ACTA No 1	\$485.599.508
VALOR LEGALIZACIÓN PAGO ANTICIPO Acta 1	\$100.000.000
SUBTOTAL DE PAGOS	\$836.798.908
SALDO POR PAGAR	\$667.199.092
SALDO POR LEGALIZAR DEL PAGO ANTICIPADO	\$351.199.400
RETENCION LIQUIDACION 10%	\$150.399.800

Tabla 14 Productos entregados el mes de septiembre

PRODUCTO	FECHA DE ENVIÓ
Programa de Uso eficiente y Ahorro de Agua PUEAA	20 de septiembre de 2017
Catastro de usuarios de La Montañita	18 de septiembre de 2017
Catastro de usuarios de El Paujil	
Catastro de usuarios de El Doncello	
Catastro de usuarios de Puerto Rico	
Catastro de usuarios Puerto Rico – informe parcial	
Catastro de usuarios Puerto Rico – informe parcial	17 de agosto de 2017
Informe contrato de condiciones Uniformes de La Montañita	30 de agosto de 2017
Informe contrato de condiciones Uniformes de El Doncello	
Informe contrato de condiciones Uniformes de El Paujil	
Informe contrato de condiciones Uniformes de Puerto Rico	
Informe contrato de condiciones Uniformes de San Vicente del Caguán	
Informe contrato de condiciones Uniformes de Solano	
Informe contrato de condiciones Uniformes de Belén de los Andaquies	
Informe contrato de condiciones Uniformes de Valparaiso	
Informe contrato de condiciones Uniformes de Solita	
Informe contrato de condiciones Uniformes de Milán	
Informe contrato de condiciones Uniformes de la Inspección de San Antonio de Getachá	

Concepto	Nombre y apellido	Cargo	Firma
Elaboró	Blanca Flor Carvajal Becerra	Apoyo Administrativo Servicios Profesionales PAP-PDA	
Revisión contractual	Jhon Freddy Ríos Flórez	Apoyo Técnico Servicios Profesionales PAP-PDA	
Revisión Jurídica	Diego Fernando Jaramillo Alvira	Apoyo jurídico Servicios Profesionales PAP-PDA	

Página 9 de 30

Con usted hacemos más por el Caquetá

Carrera 13 Calle 15 Esquina – Teléfono: (098) 4358240-4361144 Fax: 4353367

www.caqueta.gov.co – infraestructura@caqueta.gov.co

www.pdacaqueta.gov.co – apoyogestor@pdacaqueta.gov.co

Florencia – Caquetá – Colombia



NIT. 800.091.594-4
SVPDA-40

<p>Estudio de costos y tarifas del servicio de aseo de La Montañita</p> <p>Estudio de costos y tarifas del servicio de aseo El Doncello</p> <p>Estudio de costos y tarifas del servicio de aseo El Paujil</p> <p>Estudio de costos y tarifas del servicio de aseo Puerto Rico</p> <p>Estudio de costos y tarifas del servicio de aseo San Vicente del Caguán</p> <p>Estudio de costos y tarifas del servicio de aseo Belén de los Andaquíes</p> <p>Estudio de costos y tarifas del servicio de aseo Valparaiso</p> <p>Estudio de costos y tarifas del servicio de aseo Solita</p> <p>Estudio de costos y tarifas del servicio de aseo Milán</p> <p>Estudio de costos y tarifas del servicio de aseo Inspección de San Antonio de Getachá</p>	<p>14 de septiembre de 2017</p>
--	---------------------------------

Actividades Administrativas


En cumplimiento de las obligaciones expresas en la cláusula séptima del contrato No. 033 de 2017, la interventoría realizó la socialización de los productos entregados por la consultoría desde el día 12 de septiembre hasta el 15 de septiembre, en compañía del consultor y la supervisión (ver registro fotográfico) de las visitas realizadas a los siguientes municipios:

Socialización municipio La Montañita.

El día 12 de septiembre se dirigió la interventoría, en compañía del Apoyo de la Supervisión y la Consultoría a la empresa SERVIMONTAÑITA S.A E.S.P., sin embargo, a pesar de estar programada esta reunión mediante el oficio remitido por la Supervisión, se realizó de manera informal debido al poco interés que mostro la gerencia de la empresa en recibirnos.

En las actas quedo consignado los temas que fueron tratados con este funcionario, reunión en la que se realizó énfasis de la importancia de hacer las correcciones respectivas a la parte legal de la creación de la empresa.

Imagen No. 2 Socialización ESP Municipio de la Montañita

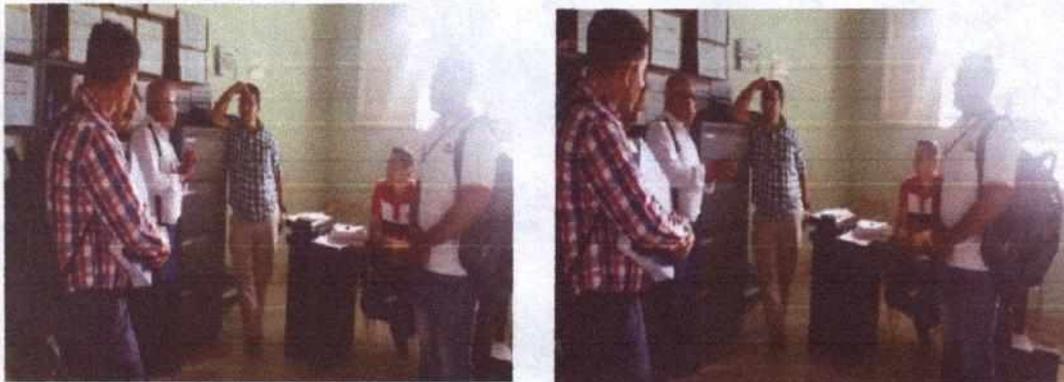

Concepto	Nombre y apellido	Cargo	Firma
Elaboró	Blanca Flor Carvajal Becerra	Apoyo Administrativo Servicios Profesionales PAP-PDA	
Revisión contractual	Jhon Freddy Ríos Flórez	Apoyo Técnico Servicios Profesionales PAP-PDA	
Revisión Jurídica	Diego Fernando Jaramillo Alvira	Apoyo jurídico Servicios Profesionales PAP-PDA	

Socialización municipio El Paujil

Ese mismo día en horas de la tarde, se realizó socialización en el municipio de Paujil, se realizó en la empresa de servicios públicos EMSERPAUJIL S.A E.S.P. en la cual asistieron profesionales de la consultoría, interventoría, Supervisión y la gerente de la empresa de servicios públicos, quien mostro un gran interés en el trabajo que se viene haciendo a través del PDA de Caquetá y solicito apoyo para actualizar el SUI, y poder actualizar la maestra de facturación con los resultados del catastro de usuarios.

Imagen No. 3 Socialización ESP Municipio de El Paujil




Socialización municipio El Doncello

En la socialización realizada en el municipio de El Doncello el día 13 de septiembre de 2017, no se logró que la Gerente de la empresa atendiera la visita, sin embargo, la alcaldesa del municipio mostró un gran interés en nuestra visita por lo que se le expuso las razones por las cuales deben tener la prestación de los servicios públicos a través de una empresa que esté cumpliendo con lo establecido en la ley 142 de 1994.

Imagen No. 4 Socialización ESP Municipio El Doncello



Concepto	Nombre y apellido	Cargo	Firma
Elaboró	Bianca Flor Carvajal Becerra	Apoyo Administrativo Servicios Profesionales PAP-PDA	
Revisión contractual	Jhon Freddy Ríos Flórez	Apoyo Técnico Servicios Profesionales PAP-PDA	
Revisión Jurídica	Diego Fernando Jaramillo Alvira	Apoyo jurídico Servicios Profesionales PAP-PDA	



**INFORME BIMENSUAL DEL AVANCE DEL PLAN
DEPARTAMENTAL DE AGUA DE CAQUETÁ PAP-PDA
PAEI 2017**



NIT 800.091.594-4
SIVPDA-40



En la socialización realizada el mismo día en el municipio de Puerto Rico, el alcalde mostro un gran interés por apoyar la labor que viene realizando el PDA de Caquetá y solicito una compañía permanente para llevar a cabo los ajustes a la parte legal de la empresa.

Imagen No. 5 Socialización Alcaldía Municipio de Puerto Rico



Socialización municipio de San Vicente del Caguán

El día 14 de septiembre en el municipio de San Vicente del Caguán, se logró tener una breve reunión con el Gerente de la Empresa Aguas del Caguán y con el secretario de planeación del municipio, donde se expuso las razones por las cuales deben tener la prestación de los servicios públicos a través de una empresa que esté cumpliendo con lo establecido en la ley 142 de 1994.

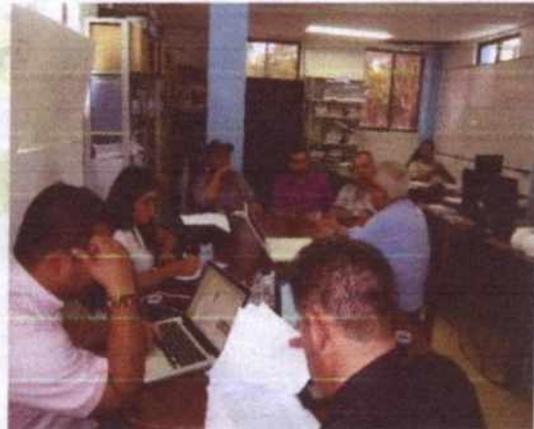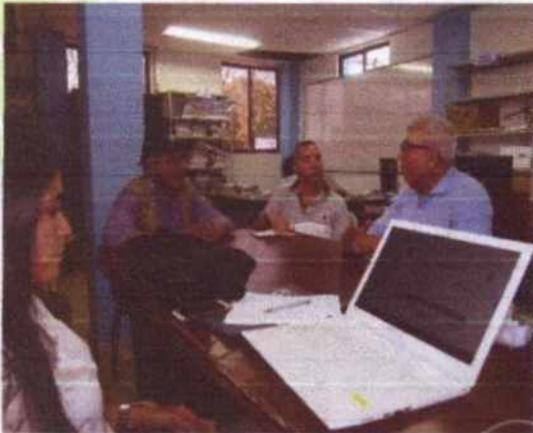

Seguimiento Control de Consultoría

En la Tabla No. 5 se relacionan las reuniones llevadas a cabo durante el periodo comprendido entre el 01 de septiembre y el 01 de octubre de 2017:

Tabla 5 Actas de reunión

Concepto	Nombre y apellido	Cargo	Firma
Elaboró	Blanca Flor Carvajal Becerra	Apoyo Administrativo Servicios Profesionales PAP-PDA	
Revisión contractual	Jhon Freddy Ríos Flórez	Apoyo Técnico Servicios Profesionales PAP-PDA	
Revisión Jurídica	Diego Fernando Jaramillo Alvira	Apoyo jurídico Servicios Profesionales PAP-PDA	

Página 12 de 30

Con usted hacemos más por el Caquetá

Carrera 13 Calle 15 Esquina – Teléfono: (098) 4358240-4361144 Fax: 4353367

www.caqueta.gov.co – infraestructura@caqueta.gov.co

www.pdacaqueta.gov.co – apoyogestor@pdacaqueta.gov.co

Florencia – Caquetá – Colombia



 <p>GOBERNACIÓN DE CAQUETA MUNICIPIO DE CAQUETA</p>	INFORME BIMENSUAL DEL AVANCE DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA DE CAQUETÁ PAP-PDA PAEI 2017	 <p>Con Usted Hacemos Más por Caquetá</p>
---	---	--

NIT.800.091.594-4
SI/PDA-40

CARPETA DE UBICACIÓN	FECHA DE REUNIÓN	OBSERVACIONES
4. Grupo de proceso y seguimiento	12 de septiembre	Instalación del software integrim a satisfacción, municipio La Montañita
4. Grupo de proceso y seguimiento	13 de septiembre	Socialización de la naturaleza jurídica de la empresa a la alcaldesa y subgerente Municipio El Doncello
4. Grupo de proceso y seguimiento	12 de septiembre	Socialización de la naturaleza jurídica de la empresa y análisis de aspectos legales Municipio El Paujil
4. Grupo de proceso y seguimiento	14 de septiembre	Explicación de la naturaleza jurídica de la empresa y análisis del POI municipio San Vicente del Caguán
4. Grupo de proceso y seguimiento	13 de septiembre	La interventoría recomienda la alternativa de transformación para la empresa, se presentó el especialista NIIF y la consultoría entregó el estudio tarifario de acueducto, alcantarillado y aseo


La consultoría U.T. Aseguramiento Caquetá 2016, de acuerdo al cronograma aprobado le falta por entregar lo que se relaciona a continuación:

Municipio de solano

ITEM	ACTIVIDAD	ENTREGADO
2	Implementación de la adopción de las normas internacionales de la información financiera NIIF	NO
3	Revisar, ajustar y actualizar el catastro de usuarios de la ESP	NO
6	Brindar la asistencia técnica al municipio o a la entidad prestadora en la optimización de la operación, capacitar al personal de la empresa en el control de la calidad del agua, implementando los registros pertinentes que den cumplimiento a los reportes	NO
	Implementación de un procedimiento para el seguimiento y control de la calidad del agua suministrada. Cursos de capacitación sobre los requisitos técnicos y procedimientos definidos en el RAS- 2000.	NO

Municipio El Doncello

ITEM	ACTIVIDAD	ENTREGADO
7	Brindar la asistencia técnica al municipio o a la entidad prestadora en la optimización de la operación, capacitar al personal de la empresa en el control de la calidad del agua, implementando los registros pertinentes que den cumplimiento a los reportes	NO

Concepto	Nombre y apellido	Cargo	Firma
Elaboró	Blanca Flor Carvajal Becerra	Apoyo Administrativo Servicios Profesionales PAP-PDA	
Revisión contractual	Jhon Freddy Rios Flórez	Apoyo Técnico Servicios Profesionales PAP-PDA	
Revisión Jurídica	Diego Fernando Jaramillo Avira	Apoyo jurídico Servicios Profesionales PAP-PDA	

Página 13 de 30

Con usted hacemos más por el Caquetá

Carrera 13 Calle 15 Esquina – Teléfono: (098) 4358240-4361144 Fax: 4353367

www.caqueta.gov.co – infraestructura@caqueta.gov.co

www.pdacaqueta.gov.co – apoyogestor@pdacaqueta.gov.co

Florencia – Caquetá – Colombia



	INFORME BIMENSUAL DEL AVANCE DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA DE CAQUETÁ PAP-PDA PAEI 2017	
---	---	---

NIT.800.091.594-4
SI/PDA-40

	Implementación de un procedimiento para el seguimiento y control de la calidad del agua suministrada. Cursos de capacitación sobre los requisitos técnicos y procedimientos definidos en el RAS- 2000.	
--	--	--

Municipio de El Paujil

ITEM	ACTIVIDAD	ENTREGADO
3	Implementación de la adopción de las normas internacionales de la información financiera NIIF	NO
7	Brindar la asistencia técnica al municipio o a la entidad prestadora en la optimización de la operación, capacitar al personal de la empresa en el control de la calidad del agua, implementando los registros pertinentes que den cumplimiento a los reportes Implementación de un procedimiento para el seguimiento y control de la calidad del agua suministrada.	NO
	Cursos de capacitación sobre los requisitos técnicos y procedimientos definidos en el RAS- 2000.	

Municipio San Vicente de Caguán


ITEM	ACTIVIDAD	ENTREGADO
3	Implementación de la adopción de las normas internacionales de la información financiera NIIF	NO

Municipio de solita

ITEM	ACTIVIDAD	ENTREGADO
3	Implementación de la adopción de las normas internacionales de la información financiera NIIF	NO

A treinta de septiembre del 2017 la consultoría no ha cumplido con sus compromisos en su totalidad y en la tabla No 20 presentamos los porcentajes de avance de cada una de las actividades:

Tabla 20 Porcentajes de dedicación

ITEM	ACTIVIDAD	PRODUCTO	PORCENTAJE	AVANCE
USUARIOS				
1	Revisión Y Ajuste De Los Actos Legales Para La Constitución De La Esp.	Ajustes Y/O Elaboración Del Contrato De Operación Firmado Por Las Partes E Inclusión Y/O Revisión De Metas Del Municipio Y/O Acto Administrativo Entre El Municipio Y La Empresa De Servicios Públicos.	4%	4%
2	Revisión, Ajuste Y/O Elaboración De Los Procesos De Los Diferentes	Documento Con El Estudio De Costos Y Tarifas De Los Servicios Que Se Debe Aplicar Para La	25%	21%
Concepto	Nombre y apellido	Cargo	Firma	
Elaboró	Bianca Flor Carvajal Becerra	Apoyo Administrativo Servicios Profesionales PAP-PDA		
Revisión contractual	Jhon Freddy Ríos Flórez	Apoyo Técnico Servicios Profesionales PAP-PDA		
Revisión Jurídica	Diego Fernando Jaramillo Alvira	Apoyo jurídico Servicios Profesionales PAP-PDA		

Página 14 de 30

Con usted hacemos más por el Caquetá

Carerra 13 Calle 15 Esquina – Teléfono: (098) 4358240-4361144 Fax: 4353367

www.caqueta.gov.co – infraestructura@caqueta.gov.co

www.pdacaqueta.gov.co – apoyogestor@pdacaqueta.gov.co

Florencia – Caquetá – Colombia





**INFORME BIMENSUAL DEL AVANCE DEL PLAN
DEPARTAMENTAL DE AGUA DE CAQUETÁ PAP-PDA
PAEI 2017**



NIT 800.091.594-4
SI/PDA-40

Componentes.	Prestación De Los Servicios De Acueducto, Alcantarillado Y Aseo, Que Incorpore El Resumen De Los Costos De Referencia Y Este Ajustado A La Normatividad Vigente. (Constancias De Socialización Con La Comunidad).		
3	Implementación De La Adopción De Las Normas Internacionales De La Información Financiera NIIF	Estado De La Situación Financiera De Apertura (ESFA), Políticas Contables.	8% 0%
4	Revisar, Ajustar Y Actualizar El Catastro De Usuarios De La ESP	Implementar Y/O Actualizar El Catastro De Usuarios Geo Referenciado Y Catastro De Redes De Los Sistemas De Acueducto Y Alcantarillado Determinando Procedimientos Para Su Actualización Permanente.	30% 12%
5	Realizar La Verificación La Legalidad Del Contrato De Condiciones Uniformes Existente Y Apoyar Requerimientos.	Elaborar O Ajustar El Modelo De Contrato Con Condiciones Uniformes De Los Servicios De Acueducto, Alcantarillado Y Aseo Y Presentación Ante La Cra.	7% 7%
6	Realizar El Diagnóstico De La Información Cargada Por El Municipio Y Del Operador	Cargue Del 100% De La Información Al Sui A La Fecha De Terminación De Elaboración De Los Procedimientos Para El Efecto	8% 4%
7	Brindar La Asistencia Técnica Al Municipio O A La Entidad Prestadora En La Optimización De La Operación, Capacitar Al Personal De La Empresa En El Control De La Calidad Del Agua, Implementando Los Registros Pertinentes Que Den Cumplimiento A Los Reportes Mensuales Que Indica El Decreto 1575 De 2007.	Entregar Los Procedimientos Establecidos Debidamente Identificados Y Documentados Que Conllevan A La Optimización De La Operación Y Al Mantenimiento Preventivo Del Sistema.	6% 0%
	Implementación De Un Procedimiento Para El Seguimiento Y Control De La Calidad Del Agua Suministrada.	Procedimientos Para El Control De La Calidad De Agua, Planes De Inversión, Estos Deben Incluir Las Inversiones A Realizar Dentro De Cada Vigencia Fiscal Para Asegurar La Operatividad Y Ampliación De Los Servicios De Acuerdo Con Las Necesidades Identificadas.	
	Cursos De Capacitación Sobre Los Requisitos Técnicos Y Procedimientos Definidos En El Ras-2000.	Evidencia De La Capacitación Sobre Ras-2000 Al Personal Técnico De La Empresa.	
8	Servicio Software Comercial, Los Prestadores Con Menos De 2.500 Suscriptores, La Consultoría Apoyara La Implementación Del Software Y De Todo El Proceso Comercial Y Las Empresas Con Más De 2.500 Suscriptores Se Les Gestionara El Servicio De Software Comercial Con Las Opciones Que Proporcione Este Mercado Que Más Se Ajuste A Sus Necesidades Comercial.	Suministro, Instalación Y Puesta En Marcha Del Software De Servicios Públicos Domiciliarios A.A.A. - Contabilidad- Presupuestal Y Tesorería	5% 2%
9	Revisión Y Actualización Del Programa Y Uso Eficiente Y Ahorro De Agua (PUEAA)	Revisión Y/O Elaboración Y/O Actualización Del Programas Y Uso Eficiente Y Ahorro De Agua (PUEAA)	1% 1%
10	Reducir El Índice De Agua No Contabilizada En La Prestación Del Servicio De Acueducto Del Municipio.	Programas Recuperación De Perdidas En Usuarios Dispersos, Comunidades, Sectores Y Servicios	6% 0%
SUB TOTALES			100% 51%

Concepto	Nombre y apellido	Cargo	Firma
Elaboró	Blanca Flor Carvajal Becerra	Apoyo Administrativo Servicios Profesionales PAP-PDA	
Revisión contractual	Jhon Freddy Ríos Flórez	Apoyo Técnico Servicios Profesionales PAP-PDA	
Revisión Jurídica	Diego Fernando Jaramillo Alvira	Apoyo jurídico Servicios Profesionales PAP-PDA	

Página 15 de 30

Con usted hacemos más por el Caquetá

Carrera 13 Calle 15 Esquina - Teléfono: (098) 4358240-4361144 Fax: 4353367

www.caqueta.gov.co - infraestructura@caqueta.gov.co

www.pdacaqueta.gov.co - apoyogestor@pdacaqueta.gov.co

Florencia - Caquetá - Colombia



Como se puede observar el avance después de haber transcurrido ocho meses de la consultoría, es de un 51%.

ACCIONES DESDE LA SUPERVISION


La Gobernación del Departamento a través de la Secretaría de Infraestructura y que tiene a su responsabilidad la implementación del Plan Departamental de Agua, en cabeza del secretario quien es el Gestor y que, a su vez, es el Supervisor del contrato No. 033 de 2017 cuyo objeto es la interventoría para la implementación del Plan de Aseguramiento de la Prestación de los Servicios Públicos en el Departamento del Caquetá 2016, el cual debe velar por la ejecución del contrato No. 017 de 2017 cuyo objeto es "Implementación del Plan de Aseguramiento de la Prestación de los Servicios Públicos en el Departamento del Caquetá 2016", ha venido prestado todo el apoyo incondicional a la interventoría representada por el Ingeniero Jairo José Granados Triana en lo que respecta al acompañamiento en todas las actividades programadas por la consultoría e interventoría, iniciando con:

1. Socializaciones en los 15 municipios beneficiados del proyecto, en el mes de marzo de los corrientes.
2. Asistiendo a las diferentes reuniones convocadas por la interventoría, con el propósito de realizar seguimiento a los avances de la consultoría, como se puede evidenciar en las actas firmadas por las partes, las cuales reposan en la carpeta del proceso.
3. Convocando a visita técnica al consultor e interventor con sea requerido por parte de los entes nacionales.
4. Tramitando en el menor tiempo posible el pago de la factura radicada por el consultor y certificada por la interventoría, para que no se presente el desequilibrio económico en la ejecución del contrato, igualmente se ha dado el mismo trato a la interventoría.
5. Con diferentes oficios la supervisión ha dado apoyo a la interventoría en recordarle a la consultoría los compromisos establecidos en el contrato y en las actas elaboradas con la interventoría para su cumplimiento.

La Supervisión no ha tenido inconveniente en acatar las recomendaciones y advertencias realizadas por la interventoría.

3. EL PLAN DE GESTION SOCIAL PAP-PDA

EL PLAN DE GESTION SOCIAL PAP-PDA Caquetá, cuenta con tres (03) componentes, como son: comunicación, Capacitación y Participación Ciudadana en el PGS PAP-PDA que acompañará y efectuará la difusión de la Política Pública Agua para la Prosperidad, mediante el Programa del Plan Departamental de Agua. Cada una de las líneas tiene valores independientes y están enfocadas en el cumplimiento de las actividades programadas en el Plan de Gestión Social – PGS – Programa Cultura del Agua del PAP-PDA del Caquetá, y se ejecutaron las siguientes líneas:

Concepto	Nombre y apellido	Cargo	Firma
Elaboró	Bianca Flor Carvajal Becerra	Apoyo Administrativo Servicios Profesionales PAP-PDA	
Revisión contractual	Jhon Freddy Ríos Flórez	Apoyo Técnico Servicios Profesionales PAP-PDA	
Revisión Jurídica	Diego Fernando Jaramillo Alvira	Apoyo jurídico Servicios Profesionales PAP-PDA	

Página 16 de 30

Con usted hacemos más por el Caquetá

Carrera 13 Calle 15 Esquina – Teléfono: (098) 4358240-4361144 Fax: 4353367

www.caqueta.gov.co – infraestructura@caqueta.gov.co
www.pdacaqueta.gov.co – apoyogestor@pdacaqueta.gov.co

Florencia – Caquetá – Colombia

NIT.800.091.594-4
SI/PDA-40

3.1. LINEA DE COMUNICACIÓN

El objetivo principal es divulgar e informar a la comunidad sobre los proyectos de acueducto y saneamiento básico a ejecutar en los municipios, y las gestiones y actividades que realiza el PAP PDA del Caquetá, para la gestión, implementación y seguimiento al Plan General Estratégico y de Inversiones PGEI y los Planes Anuales Estratégicos y de Inversiones PAEI aprobados por el Comité Directivo del PAP-PDA.

Para el desarrollo de este objetivo, se cuenta con la página WEB; la cual permitirá que la comunidad esté informada de las actividades realizadas por el PAP PDA. De igual forma, se realizó procesos de contratación de medios de comunicación para reforzar la divulgación de lo desarrollado por el Plan Departamental de Agua PAP PDA Caquetá. Para el momento estos son los medios que siguen de los 12 que se tenían contratados:


RCN	RADIO
LINDA STEREO	RADIO
ARMONIAS DEL CAQUETÁ	RADIO
JORGE ALBERTO ROJAS VARAS	PUBLICIDAD

3.2. LINEA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CAPACITACIÓN

Estos dos componentes tienen como objetivo dar a conocer a la comunidad los espacios con que cuentan y que están creados por norma, para lograr el empoderamiento, conocimiento y sentido de pertenencia hacia las obras que desde el Plan Departamental de Agua del Caquetá se realicen.

Para el cumplimiento de este propósito se han adelantado las siguientes actividades:

- Se realizó la socialización del contrato No. 556 del 2017 "Rehabilitación Reposición Tramos de Alcantarillado en el área Urbana de la Cabecera Municipal de Currillo Departamento del Caquetá".
- Se apoyó en la creación de la veeduría del contrato No. 556 del 2017.
- Se realizó capacitación sobre Cargue SUI, Tarifa y Manual de Contratación dirigida a las Empresas públicas del departamento y Alcaldes del Departamento.
- Se realizó en el municipio de Puerto Milán la jornada de limpieza sanitaria.
- Se entregó 3 puntos ecológicos para el Municipio de Puerto Milán.
- Se apoyó en la realización de la capacitación sobre la resolución 1063 de 2016 y 0672 de 2015.
- Se apoyó en la socialización del contrato No. 518 del 2017 "Construcción del sistema de alcantarillado en diferentes zonas urbanas del Municipio de Puerto Rico, Departamento del Caquetá".
- Se apoyó en la creación de la veeduría del contrato No. 518 del 2017.
- Se apoyó en la socialización del contrato No. 524 del 2017 "Construcción red de alcantarillado pluvial del barrio la alternativa de todos, Municipio de La Montañita, Departamento del Caquetá".
- Se apoyó en la creación de la veeduría del contrato No. 524 del 2017
- Se realizó en el municipio de Puerto Milán la campaña de Sensibilización Ciudadana para la Promoción del Reciclaje
- Seguimiento y capacitación a los Clubes de Agua conformados
- Se han realizado visitas técnicas sociales a las siguientes obras:

Concepto	Nombre y apellido	Cargo	Firma
Elaboró	Bianca Flor Carvajal Becerra	Apoyo Administrativo Servicios Profesionales PAP-PDA	
Revisión contractual	Jhon Freddy Ríos Flórez	Apoyo Técnico Servicios Profesionales PAP-PDA	
Revisión Jurídica	Diego Fernando Jaramillo Alvira	Apoyo jurídico Servicios Profesionales PAP-PDA	

Página 17 de 30

Con usted hacemos más por el Caquetá

Carretera 13 Calle 15 Esquina - Teléfono: (098) 4358240-4361144 Fax: 4353367

www.caqueta.gov.co - infraestructura@caqueta.gov.co

www.pdacaqueta.gov.co - apoyogestor@pdacaqueta.gov.co

Florencia - Caquetá - Colombia



INFORME BIMENSUAL DEL AVANCE DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA DE CAQUETÁ PAP-PDA PAEI 2017



NIT.800.091.594-4
SVPDA-40

- ✓ Obra No. 524 "Construcción red de alcantarillado pluvial del barrio la alternativa de todos, Municipio de La Montañita, Departamento del Caquetá".
- ✓ Obra No. 518 Puerto Rico "Construcción del sistema de alcantarillado en diferentes zonas urbanas del Municipio de Puerto Rico, Departamento del Caquetá".
- ✓ Obra No. 556 del 2017 "Rehabilitación Reposición Tramos de Alcantarillado en el área Urbana de la Cabecera Municipal de Currillo Departamento del Caquetá".



Concepto	Nombre y apellido	Cargo	Firma
Elaboró	Bianca Flor Carvajal Becerra	Apoyo Administrativo Servicios Profesionales PAP-PDA	
Revisión contractual	Jhon Freddy Ríos Flórez	Apoyo Técnico Servicios Profesionales PAP-PDA	
Revisión Jurídica	Diego Fernando Jaramillo Alvira	Apoyo jurídico Servicios Profesionales PAP-PDA	

Página 18 de 30

Con usted hacemos más por el Caquetá

Carrera 13 Calle 15 Esquina – Teléfono: (098) 4358240-4361144 Fax: 4353367

www.caqueta.gov.co – infraestructura@caqueta.gov.co

www.pdacaqueta.gov.co – apoyogestor@pdacaqueta.gov.co

Florencia – Caquetá – Colombia





**INFORME BIMENSUAL DEL AVANCE DEL PLAN
DEPARTAMENTAL DE AGUA DE CAQUETÁ PAP-PDA
PAEI 2017**



NIT 800.091.594-4
SI/PDA-40

3.3. PAGINA WEB

El Gestor del PAP PDA Caquetá, contrató el rediseño y puesta en funcionamiento del sitio Web www.pdacaqueta.gov.co, por medio de un Contrato de Mínima Cuantía, publicado en el SECOP con el código SI-PDA-MC-002-017; cuyo objeto corresponde a "Rediseñar el sitio web www.pdacaqueta.gov.co, con la finalidad de cumplir con los principios de publicidad y transparencia de la gestión pública y difundir las gestiones y actividades del PAP-PDA Caquetá". Al desarrollarse el proceso de contratación, se seleccionó le mejor oferta, la cual corresponde a la firma GOPHER GROUP S.A.S., identificada con el NIT No. 900425485.

El sitio web, es un espacio virtual, en donde el Gestor PDA realiza la publicación en forma periódica de las actividades, las experiencias e investigaciones desarrolladas en ejercicios de sus funciones y en el marco de sus competencias. Además, busca ser una ventada de comunicación entre el Gestor PAP-PDA y la comunidad en general, ofreciendo noticias, novedades, información de las empresas de servicios públicos vinculados al PDA, presentando invitaciones a eventos próximos a realizarse y los correspondientes informes de actividades.

<p>Presentación de la pantalla principal del sitio web del PDA.</p> <p>Dirección del sitio: www.pdacaqueta.gov.co</p>	
<p>Al sitio se ha publicado la información de gestión del PDA. Adecuando cada uno de los espacios.</p>	

Concepto	Nombre y apellido	Cargo	Firma
Elaboró	Blanca Flor Carvajal Becerra	Apoyo Administrativo Servicios Profesionales PAP-PDA	
Revisión contractual	Jhon Freddy Ríos Flórez	Apoyo Técnico Servicios Profesionales PAP-PDA	
Revisión Jurídica	Diego Fernando Jaramillo Alvira	Apoyo jurídico Servicios Profesionales PAP-PDA	





**INFORME BIMENSUAL DEL AVANCE DEL PLAN
DEPARTAMENTAL DE AGUA DE CAQUETÁ PAP-PDA
PAEI 2017**



NIT.800.091.594-4
SI/PDA-40

Con la publicación de nuevo diseño del sitio web www.pdacaqueta.gov.co; se ha iniciado con la promoción de su uso, la invitación a participar y el incluir a cada una de las alcaldías municipales y a los gerentes de las empresas de servicios público, para que hagan uso de ella y realicen sus aportes. También, podrán contar los alcaldes municipales, con un correo institucional del PDA, para su uso.

Evento de socialización de la página web, sus recursos en pantalla, alcances y participación en su estructuración.


Se presenta la socialización de la página, con el representante de la empresa de servicios públicos del municipio de El Doncello.



En cada una de las reuniones que el Equipo Gestor del PDA, que ha convocado; se ha participado promoviendo el uso del sitio web, ante los alcaldes municipales, gerentes de empresas de servicios públicos y personal de los municipios.



Pantalla de inicio del Sitio Web, proyectado por video beam, listo para realizar iniciar la presentación.

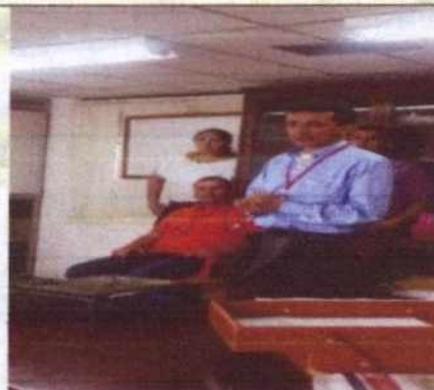

Funcionario del PAP-PDA, realizando la presentación del sitio.

Concepto	Nombre y apellido	Cargo	Firma
Elaboró	Blanca Flor Carvajal Becerra	Apoyo Administrativo Servicios Profesionales PAP-PDA	
Revisión contractual	Jhon Freddy Rios Flórez	Apoyo Técnico Servicios Profesionales PAP-PDA	
Revisión Jurídica	Diego Fernando Jaramillo Alvira	Apoyo jurídico Servicios Profesionales PAP-PDA	

Página 20 de 30

Con usted hacemos más por el Caquetá

Carrera 13 Calle 15 Esquina - Teléfono: (098) 4358240-4361144 Fax: 4353367

www.caqueta.gov.co - infraestructura@caqueta.gov.co

www.pdacaqueta.gov.co - apoyogestor@pdacaqueta.gov.co

Florencia - Caquetá - Colombia





INFORME BIMENSUAL DEL AVANCE DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA DE CAQUETÁ PAP-PDA PAEI 2017



NIT.800.091.594-4
SVPDA-40



Reunión I: Participación de los gerentes de empresas de servicios públicos; de izquierda a derecha tenemos Gerente del Municipio de Morelia, Municipio de Solita, Municipio de Puerto Rico y el Municipio de San José del Fragua.



Reunión II: Participación del señor alcalde del municipio de Curillo, gerente de la empresa de servicios públicos de Curillo, Secretaria de Planeación de Albania y el Gerente de la empresa de servicios públicos de Albania.

En cada una de las reuniones, se ha invitado a los señores alcaldes y Gerentes de empresas de servicios públicos a participar, a remitir información que tenga que ver con su quehacer y el quehacer PAP-PDA.

Una de las inquietudes del gerente de la Empresa de Servicios Públicos de Morelia, es el poder contar con un subdominio; que sea administrado por los funcionarios de la empresa de Morelia, dado que cada E. S. P, debe contar con un portal web para la atención de las PQR.

En cuanto a la divulgación a través del sitio web www.pdacaqueta.gov.co, se ha presentado la información de los eventos que se han realizado en el periodo:

En la capacitación "Reunión solicitada por los gerentes de las ESP para tratar los temas del Plan de Aseguramiento y Plan Ambiental", donde participaron los gerentes de las empresas de servicios públicos de los municipios del departamento del Caquetá; se presentó el sitio web y en la opción del menú Componentes – Fortalecimiento Institucional, se publicó la presentación PowerPoint presentada, para que los interesados la puedan descargar.



Concepto	Nombre y apellido	Cargo	Firma
Elaboró	Blanca Flor Carvajal Becerra	Apoyo Administrativo Servicios Profesionales PAP-PDA	
Revisión contractual	Jhon Freddy Rios Flórez	Apoyo Técnico Servicios Profesionales PAP-PDA	
Revisión Jurídica	Diego Fernando Jaramillo Alvira	Apoyo jurídico Servicios Profesionales PAP-PDA	

Página 21 de 30

Con usted hacemos más por el Caquetá

Carrera 13 Calle 15 Esquina – Teléfono: (098) 4358240-4361144 Fax: 4353367

www.caqueta.gov.co – infraestructura@caqueta.gov.co

www.pdacaqueta.gov.co – apoyogestor@pdacaqueta.gov.co

Florencia – Caquetá – Colombia





**INFORME BIMENSUAL DEL AVANCE DEL PLAN
DEPARTAMENTAL DE AGUA DE CAQUETÁ PAP-PDA
PAEI 2017**



NIT.800.091.594-4
SI/PDA-40

1. Los visitantes pueden realizar la descarga de la información, correspondiente.



En la capacitación "Socialización y Taller en Normas del Sector de Agua Potable", del 24 de octubre; donde participaron los gerentes de las empresas de servicios públicos de los municipios del departamento del Caquetá; se presenta un informe del desarrollo de la actividad, con su correspondiente registro fotográfico.



4. COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA, OBRAS Y SERVICIOS.

Las necesidades sectoriales hacen referencia a las inversiones que se requieren para adelantar los estudios y diseños, gestión predial, suministro de bienes y servicios y la ejecución de las obras de infraestructura necesarias para garantizar la prestación eficiente de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en el área urbana y área rural de los municipios vinculados al PAP PDA, de acuerdo con el diagnóstico integral sectorial y el diagnóstico que se realizó, incluyendo los planes de acción los cuales servirán de base al gobierno departamental para dar continuidad a los procesos.

4.1. PROYECTOS PRESENTADOS EN SESION COMITÉ VENTANILLA ÚNICA DEL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ.

Mediante el Decreto 000370 del 05 de abril de 2016 se adoptó el Mecanismo de la Ventanilla Única Departamental de que trata el Decreto Nacional 1077 de 2015, adscrita a la Secretaría de Planeación Departamental, financiada con recursos del Plan Departamental de Agua, Caquetá.

Concepto	Nombre y apellido	Cargo	Firma
Elaboró	Blanca Flor Carvajal Becerra	Apoyo Administrativo Servicios Profesionales PAP-PDA	
Revisión contractual	Jhon Freddy Ríos Flórez	Apoyo Técnico Servicios Profesionales PAP-PDA	
Revisión Jurídica	Diego Fernando Jaramillo Alvira	Apoyo jurídico Servicios Profesionales PAP-PDA	





**INFORME BIMENSUAL DEL AVANCE DEL PLAN
DEPARTAMENTAL DE AGUA DE CAQUETÁ PAP-PDA
PAEI 2017**



NIT.800.091.594-4
S/PPDA-40

El día 08 de septiembre de 2017, se llevó a cabo Comité Técnico viabilización de proyectos en la ventanilla única regional, en el cual el evaluador ingeniero RONALD CAMILO RAMIREZ MARTINEZ/ Representante Legal de INGENIERIA ROCA S.A.S., llevo a feliz término la socialización del proyecto ante los integrantes del Comité, el cual fue aprobado, se describe:

OBJETO	CONCEPTO TECNICO DE VIABILIDAD	ESTADO
CONSTRUCCIÓN DE CELDA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL RELLENO SANITARIO PARA LA DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS ORDINARIOS GENERADOS EN LA INSPECCION DE SAN ANTONIO DE GETUCHA Y LA CABECERA MUNICIPAL DE MILAN- CAQUETÁ	VIABILIDAD POSITIVO	ELABORACION ESTUDIOS PREVIOS

REGISTO FOTOGRAFICO:



4.2. ESTADO DE AVANCE OBRAS E INTERVENTORÍA

4.2.1. AVANCE DE LA EJECUCIÓN Y ESTADO ACTUAL DE LOS PROYECTOS INVERSIÓN DE PAP-PDA CAQUETÁ

Concepto	Nombre y apellido	Cargo	Firma
Elaboró	Blanca Flor Carvajal Becerra	Apoyo Administrativo Servicios Profesionales PAP-PDA	
Revisión contractual	Jhon Freddy Ríos Flórez	Apoyo Técnico Servicios Profesionales PAP-PDA	
Revisión Jurídica	Diego Fernando Jaramillo Alvira	Apoyo jurídico Servicios Profesionales PAP-PDA	

Página 23 de 30

Con usted hacemos más por el Caquetá

Carrera 13 Calle 15 Esquina – Teléfono: (098) 4358240–4361144 Fax: 4353367

www.caqueta.gov.co – infraestructura@caqueta.gov.co

www.pdacaqueta.gov.co – apoyogestor@pdacaqueta.gov.co

Florencia – Caquetá – Colombia






**INFORME BIMENSUAL DEL AVANCE DEL PLAN
DEPARTAMENTAL DE AGUA DE CAQUETÁ PAP-PDA
PAEI 2017**



NIT.800.091.594-4
SI/PDA-40

PROYECTOS VIABILIZADOS MEDIANTE SESIÓN DE COMITÉ TÉCNICO DEPARTAMENTAL DE PROYECTOS, ya están en ejecución los siguientes:

Contrato de Obra No. 518 de 2107, cuyo objeto es: **“CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN DIFERENTES ZONAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO RICO-CAQUETÁ”**, el proyecto inicio el 04 de agosto de 2017, el contrato se encuentra en un 24,41 % de ejecución técnica. Se han intervenido los tramos: CO-22, CO-29, CO-54, CO-23, CO-87, CO-88, CO-89, CO-35 y CO-48, en tres diferentes sectores del proyecto del municipio de Puerto Rico. El clima en la región ha sido un factor determinante en la ejecución de la obra, algunos tramos se han demorado más lo programado para poder rellenarlos, compactarlos y finalmente estabilizarlos. Según el cronograma de trabajo se proyecta el primer corte de obra para el mes de septiembre 2017, en cuanto al Contrato de Interventoría No. 517 de 2017, se contabiliza por meses laborados, a la fecha ha transcurrido el primer mes de los cinco meses presupuestados, actualmente tenemos un 20% de ejecución técnica. Se han realizado una reunión de socialización con la comunidad beneficiaria, los funcionarios de la alcaldía municipal de Puerto Rico y el Gerente de la empresa de servicios públicos (AGUA RICA S.A. E.S.P.) en la cual se expusieron los alcances del proyecto y posteriormente se realizó una visita técnica, con el objetivo de verificar el avance y las condiciones de las obras ejecutadas por el contratista, contando con la compañía de la veeduría. Se programa el primer informe de obra para el mes de septiembre 2017.

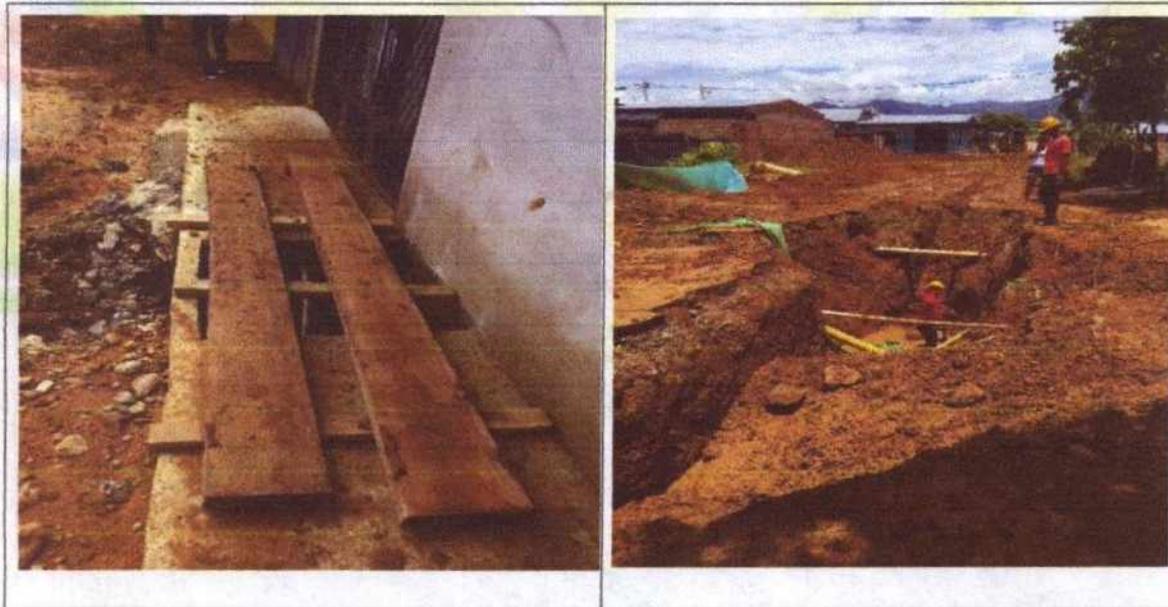

Excavación en cruce calle 2 sur con carrera 10 y domiciliarias Barrio El Oasis. 31 agosto 2017.

Concepto	Nombre y apellido	Cargo	Firma
Elaboró	Blanca Flor Carvajal Becerra	Apoyo Administrativo Servicios Profesionales PAP-PDA	
Revisión contractual	Jhon Freddy Ríos Flórez	Apoyo Técnico Servicios Profesionales PAP-PDA	
Revisión Jurídica	Diego Fernando Jaramillo Alvira	Apoyo jurídico Servicios Profesionales PAP-PDA	

Página 24 de 30

Con usted hacemos más por el Caquetá

Carrera 13 Calle 15 Esquina – Teléfono: (098) 4358240–4361144 Fax: 4353367

www.caqueta.gov.co – infraestructura@caqueta.gov.co

www.pdacaqueta.gov.co – apoyogestor@pdacaqueta.gov.co

Florencia – Caquetá – Colombia





**INFORME BIMENSUAL DEL AVANCE DEL PLAN
DEPARTAMENTAL DE AGUA DE CAQUETÁ PAP-PDA
PAEI 2017**




NIT.800.091.594-4
SVPDA-40



Construcción de pozo No. 79. 31 agosto 2017.



Estado de Tramo PZ-12 a PZ-13. 31 agosto 2017.

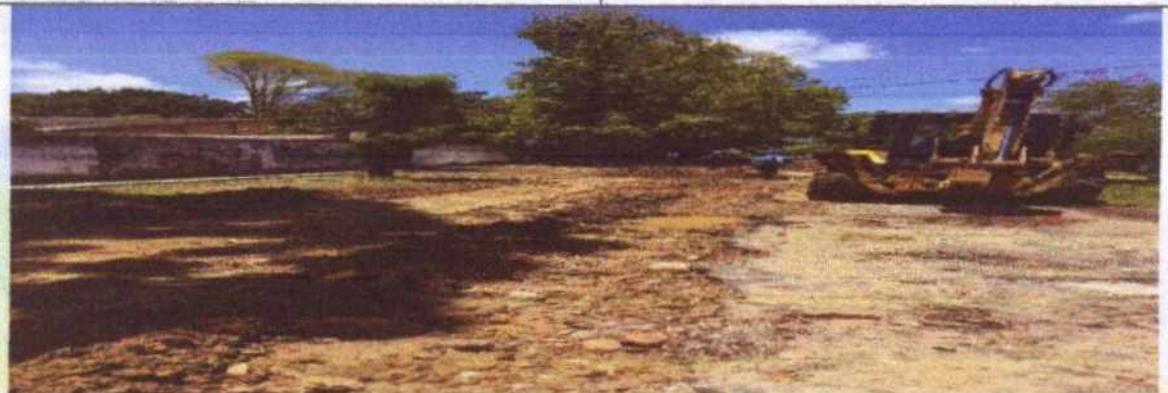

Estado de Tramo PZ 121 a PZ122. 31 agosto 2017.

- ✦ Contrato de Obra No. 524 de 2107 y Contrato de Interventoría No. 489 de 2017, cuyo objeto es: **"CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL BARRIO ALTERNATIVA DE TODOS, MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ"**, el proyecto está previsto para iniciar en el mes de septiembre de 2107.
- ✦ Proceso Licitación Pública No. SI-PDA-LP-003-2017, cuyo objeto es: **"CONSTRUCCIÓN 2A ETAPA DEL COLECTOR-INTERCEPTOR Y EMISARIO FINAL DE AGUAS RESIDUALES SOBRE LA QUEBRADA EL IGUA DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PUERTO RICO CAQUETA"**, publicado en la página del secop, estado Resolución de adjudicación No. 002091 del 12 de octubre de 2017.
- ✦ El proceso Concurso de Méritos No. SI-PDA-CMA-005-2017, cuyo objeto es: **"INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, JURIDICA Y AMBIENTAL) AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO: "CONSTRUCCIÓN 2ª ETAPA DEL COLECTOR-INTERCEPTOR Y EMISARIO FINAL DE AGUAS RESIDUALES SOBRE LA QUEBRADA EL IGUÁ DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PUERTO**

Concepto	Nombre y apellido	Cargo	Firma
Elaboró	Blanca Flor Carvajal Becerra	Apoyo Administrativo Servicios Profesionales PAP-PDA	
Revisión contractual	Jhon Freddy Ríos Flórez	Apoyo Técnico Servicios Profesionales PAP-PDA	
Revisión Jurídica	Diego Fernando Jaramillo Alvira	Apoyo jurídico Servicios Profesionales PAP-PDA	

Página 25 de 30

Con usted hacemos más por el Caquetá

Carrera 13 Calle 15 Esquina - Teléfono: (098) 4358240-4361144 Fax: 4353367

www.caqueta.gov.co - infraestructura@caqueta.gov.co

www.pdacaqueta.gov.co - apoyogestor@pdacaqueta.gov.co

Florencia - Caquetá - Colombia





**INFORME BIMENSUAL DEL AVANCE DEL PLAN
DEPARTAMENTAL DE AGUA DE CAQUETÁ PAP-PDA
PAEI 2017**



NIT.800.091.594-4
SI/PDA-40

RICO, CAQUETÁ, mediante el cual se generó el contrato de interventoría No. 662 del 17 de octubre de 2017, el cual está en proceso de inicio hasta que inicie el contrato de obra.

- ✚ Proceso Licitación Pública No. SI-PDA-LP-004-2017, cuyo objeto es: **"CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PTAR EN LA INSPECCION DE ZABAleta, ETAPA II MUNICIPIO DE SAN JOSE DE FRAGUA, DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ"**, proceso publicado en la página del secop, estado Audiencia asignación de riesgos, según cronograma del proceso.
- ✚ Proceso Concurso de Méritos Abierto No. SI-PDA-CMA-006-2017, cuyo objeto es: **"REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA) DEL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PTAR PARA LA INSPECCION DE ZABAleta DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA – ETAPA II"**, proceso publicado en la página del secop, estado Observación al Pliego de Condiciones, según cronograma del proceso.
- ✚ Proceso Licitación Pública No. SI-PDA-LP-005-2017, cuyo objeto es: **"CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR BARRIOS LAS PALMERAS Y LIMONAR DEL MUNICIPIO DE CARTAGENA DEL CHAIRA"**, proceso publicado en la página del secop, estado publicación Estudios previos, pre pliegos y aviso convocatoria, según cronograma del proceso.
- ✚ Proceso Concurso de Méritos Abierto No. SI-PDA-CMA-007-2017, cuyo objeto es: **"INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL) AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO: "CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR BARRIOS LAS PALMERAS Y LIMONAR DEL MUNICIPIO DE CARTAGENA DEL CHAIRA"**, proceso publicado en la página del secop, estado publicación Estudios previos, pre pliegos y aviso convocatoria, según cronograma del proceso.

PROYECTOS QUE VIENEN CONTRATADOS DESDE EL AÑO 2013

- ✚ El Contrato de Obra No. 111-25-13-06 del 22 de octubre de 2013 y Contrato de Interventoría No. 030 de 2013, cuyo objeto es: **"OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO (ADECUACIÓN BOCATOMA, DESARENADOR, CAMBIO RED DE CONDUCCIÓN, ADECUACIÓN PTAP) PARA EL MUNICIPIO DE BÉLEN DE LOS ANDAQUÍES – CAQUETÁ"**, en ejecución Activo, se autorizó el cambio de tubería RDE 26 en lugar de RDE 32.5 sin incremento del presupuesto de obra. Se construyó línea de conducción entre abscisas KM03+800 al KM12+200, en tubería PVCØ 8" (RDE 21, RDE 26 y RDE 32.5). Pendientes pasos elevados, su avance en obra es del 55%.

Registro fotográfico.

Concepto	Nombre y apellido	Cargo	Firma
Elaboró	Bianca Flor Carvajal Becerra	Apoyo Administrativo Servicios Profesionales PAP-PDA	
Revisión contractual	Jhon Freddy Ríos Flórez	Apoyo Técnico Servicios Profesionales PAP-PDA	
Revisión Jurídica	Diego Fernando Jaramillo Alvira	Apoyo jurídico Servicios Profesionales PAP-PDA	

Página 26 de 30

Con usted hacemos más por el Caquetá

Carrera 13 Calle 15 Esquina – Teléfono: (098) 4358240-4361144 Fax: 4353367

www.caqueta.gov.co – infraestructura@caqueta.gov.co

www.pdacaqueta.gov.co – apoyogestor@pdacaqueta.gov.co

Florencia – Caquetá – Colombia






**INFORME BIMENSUAL DEL AVANCE DEL PLAN
DEPARTAMENTAL DE AGUA DE CAQUETÁ PAP-PDA
PAEI 2017**



NIT.800.091.594-4
SIVPDA-40

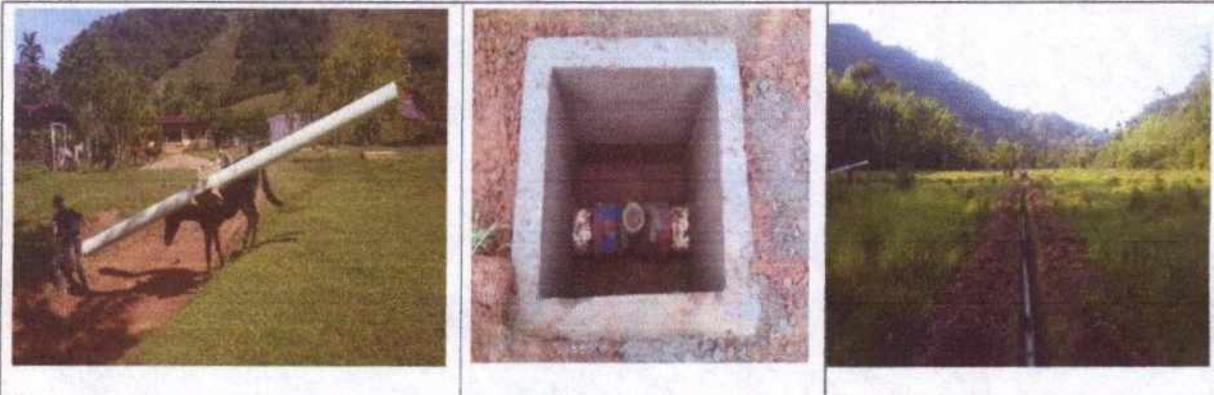

✚ El Contrato de Obra No. 01 del 12 de abril de 2013 y el Contrato de Interventoría No. 032 Del 14 de noviembre de 2013, cuyo objeto es: **"CONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL PARA LOS MUNICIPIOS DE ALBANIA, SAN JOSE DEL FRAGUA Y CURILLO FASE I"**, la ejecución del contrato se encuentra suspendido, por derecho de servidumbre para instalación de 1880 m. de tubería de 12", entre el desarenador y la abscesa KM01+880. En espera de pago judicial del derecho de servidumbre (en proceso). El resto de obra ya está ejecutada, su avance en obra es del 95%.

Registro fotográfico.



PROYECTOS CONTRATADOS EN EL 2017

✚ El Contrato de Obra No. 004 de 2017 y el Contrato de Interventoría No. 005 de 2017, cuyo objeto es: **"OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PUERTO RICO, CAQUETA"**, se encuentra terminado, en trámite liquidación, con un avance de obra del 95 %.

Registro fotográfico

Concepto	Nombre y apellido	Cargo	Firma
Elaboró	Bianca Flor Carvajal Becerra	Apoyo Administrativo Servicios Profesionales PAP-PDA	
Revisión contractual	Jhon Freddy Ríos Flórez	Apoyo Técnico Servicios Profesionales PAP-PDA	
Revisión Jurídica	Diego Fernando Jaramillo Alvira	Apoyo jurídico Servicios Profesionales PAP-PDA	

Página 27 de 30

Con usted hacemos más por el Caquetá

Carrera 13 Calle 15 Esquina – Teléfono: (098) 4358240-4361144 Fax: 4353367

www.caqueta.gov.co – infraestructura@caqueta.gov.co

www.pdacaqueta.gov.co – apoyogestor@pdacaqueta.gov.co

Florencia – Caquetá – Colombia





**INFORME BIMENSUAL DEL AVANCE DEL PLAN
DEPARTAMENTAL DE AGUA DE CAQUETÁ PAP-PDA
PAEI 2017**



NIT 800.091.594-4
SI/PDA-40



Actualización y/o formulación Actualización y/o formulación Actualización y/o formulación
Planes de Gestión Integ Programas de Uso Eficiente y Ah Planes de Saneamiento y Ma
Residuos Sólidos (PGIRS) Agua (PUEAA) en los Municipios de: Vertimientos (PSMV) de los Mu
Municipios de:

- | | | |
|----------------|-----------------|---------------------------|
| 1. El Paujil | 1. Milán | 1. Milán |
| 2. El Doncello | 2. El Paujil | 2. Solano |
| | 3. La Montañita | 3. Curillo |
| | 4. Solita | 4. Albania |
| | 5. Valparaíso | 5. Solita |
| | | 6. La Montañita |
| | | 7. Valparaíso |
| | | 8. Puerto Rico |
| | | 9. San José del Fragua |
| | | 10. San Vicente del Caguá |

6. COMPONENTE AMBIENTAL.

En cumplimiento a los compromisos establecidos en el Plan anual estratégico de inversiones 2017 PAP-PDA, y de acuerdo al Instrumento de Planeación Plan Ambiental 2017-2019, se informa lo siguiente:

Que de acuerdo al presupuesto 2017 por un valor de \$1.460.000.000, se logró ejecutar \$1.360.000.000 para la actualización y/o formulación de los mínimos ambientales de los siguientes municipios.

Que para dicha ejecución se contrató una interventoría y consultoría que se menciona a continuación, mediante la modalidad de selección de concurso de méritos, dando inició su ejecución el día 07 de Julio del presente año.

- Interventoría FUNDACIÓN AMBIENTAL PARA LA SOSTENIBILIDAD TERRITORIAL – FUNASOT. N°476
- Consultoría UNIÓN TEMPORAL MINIMOS AMBIENTALES N°483

Para los contratos mencionados se establecieron los siguientes presupuestos y plazos de ejecución:

- Interventoría: \$95.128.600 - Plazo de ejecución: siete (7) meses

Concepto	Nombre y apellido	Cargo	Firma
Elaboró	Blanca Flor Carvajal Becerra	Apoyo Administrativo Servicios Profesionales PAP-PDA	
Revisión contractual	Jhon Freddy Ríos Flórez	Apoyo Técnico Servicios Profesionales PAP-PDA	
Revisión Jurídica	Diego Fernando Jaramillo Alvira	Apoyo jurídico Servicios Profesionales PAP-PDA	

Página 28 de 30

Con usted hacemos más por el Caquetá

Carrera 13 Calle 15 Esquina – Teléfono: (098) 4358240–4361144 Fax: 4353367

www.caqueta.gov.co – infraestructura@caqueta.gov.co

www.pdacaqueta.gov.co – apoyogestor@pdacaqueta.gov.co

Florencia – Caquetá – Colombia





**INFORME BIMENSUAL DEL AVANCE DEL PLAN
DEPARTAMENTAL DE AGUA DE CAQUETÁ PAP-PDA
PAEI 2017**



NIT 800.091.594-4
SI/PDA-40

- Consultoría: 1.264.799.999- Plazo de ejecución: seis (6) meses

Actualmente los dos contratos se encuentran en proceso de ejecución del 50% con terminación para el año 2018.



Fotografía 1,2,3,4. Ejecución Interventoría

Respecto a los \$100.000.000 sin ejecutar del componente ambiental para el año 2017, cuyo proyecto es la implementación de los programas de reducción de pérdidas y macromedición definidos en el Programa de Uso eficiente y ahorro de agua (PUEAA) del Municipio de Cartagena del Chaira en el Departamento de Caquetá, se iniciará el proceso de contratación para el año 2018 junto con los proyectos establecidos en Plan Ambiental para ese mismo año.

Concepto	Nombre y apellido	Cargo	Firma
Elaboró	Bianca Flor Carvajal Becerra	Apoyo Administrativo Servicios Profesionales PAP-PDA	
Revisión contractual	Jhon Freddy Ríos Flórez	Apoyo Técnico Servicios Profesionales PAP-PDA	
Revisión Jurídica	Diego Fernando Jaramillo Alvira	Apoyo jurídico Servicios Profesionales PAP-PDA	

Página 29 de 30

Con usted hacemos más por el Caquetá

Carrera 13 Calle 15 Esquina - Teléfono: (098) 4358240-4361144 Fax: 4353367

www.caqueta.gov.co - infraestructura@caqueta.gov.co

www.pdacaqueta.gov.co - apoyogestor@pdacaqueta.gov.co

Florencia - Caquetá - Colombia




NIT.800.091.594-4
SIVPDA-40

1. COMPONENTE GESTIÓN DE RIESGO SECTORIAL.

De acuerdo al cumplimiento del PAEI 2017, se estructuró el documento de Gestión de Riesgo en Agua potable y Saneamiento básico. Dicho documento fue enviado por email el día 12 de septiembre del presente año para su respectiva aprobación. A la fecha el equipo técnico del Viceministerio de Agua potable y Saneamiento Básico no ha dado respuesta, por tal motivo no se ha dado inicio a la ejecución de los proyectos establecidos.


Se firma a los veintiocho (28) días del mes de noviembre de 2017.

Atentamente,



DIEGO RAMIREZ OSORIO
Secretario de Infraestructura
Gestor PAP-PDA Caquetá

Se anexa cuadro Productos del Gestor PAP-PDA Caquetá

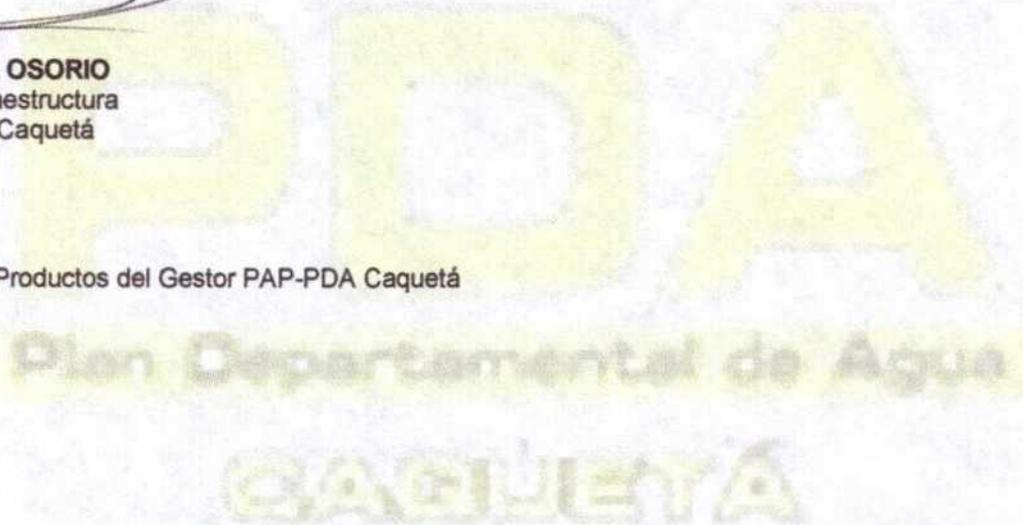

Concepto	Nombre y apellido	Cargo	Firma
Elaboró	Bianca Fior Carvajal Becerra	Apoyo Administrativo Servicios Profesionales PAP-PDA	
Revisión contractual	Jhon Freddy Ríos Flórez	Apoyo Técnico Servicios Profesionales PAP-PDA	
Revisión Jurídica	Diego Fernando Jaramillo Alvira	Apoyo jurídico Servicios Profesionales PAP-PDA	

Página 30 de 30

Con usted hacemos más por el Caquetá

Carretera 13 Calle 15 Esquina – Teléfono: (098) 4358240-4361144 Fax: 4353367

www.caqueta.gov.co – infraestructura@caqueta.gov.co

www.pdacaqueta.gov.co – apoyogestor@pdacaqueta.gov.co

Florencia – Caquetá – Colombia



Productos del Gasto 2017

COMPONENTE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	ACTIVIDADES REALIZADAS	META (PRODUCTO)	ACTIVIDADES (CUMPLIDAS)	ACTIVIDADES (EN EJECUCIÓN)	% AVANCE CUMPLIMIENTO	
Implementación del Programa Agua para la Prosperidad	Realizar seguimiento a los informes mensuales presentados por el esquema fiduciario, en relación a rendimientos, comisiones, ingresos y egresos de cada uno de los actores vinculados al FIA y elaboración de informe financiero semestral para los aportantes	11 informes mensuales de control, seguimiento contable, presupuestal, cierres financieros y tributarios a los recursos administrados por el Consorcio FIA.	Desde la aprobación del PAEI 2017, se han realizado 8 informes mensuales, revisados conforme a la información suministrada por el Consorcio FIA.	11	9	0	82%	
		3 informes Trimestrales de los Planes de pagos actualizado para cada uno de los contratos que se suscriba en el desarrollo del PDA-PAP	Desde la aprobación del PAEI 2017, Se ha desarrollado dos (2) Informes del Plan de Pagos realizado a corte del 30 de junio de 2017	3	2	0	67%	
		2 informes financiero semestral para los aportantes, reflejando su situación en el patrimonio autónomo del PDA Caquetá en el Consorcio FIA.	A la fecha no se ha efectuado aún Informe semestral.	2	1	1	50%	
	Ordenar al FIA pagos por conceptos de contratos de obra, Interventoría, consultorías y demás celebrados en el marco del PDA- PAP	PDA Caquetá, en la que se refleje su movimiento financiero desde la suscripción del acta de inicio hasta la liquidación, con especificación mínima del valor del contrato, el CDR causado (por fuente), el anticipo (con su amortización) y pagos realizados con sus respectivos descuentos Elaboración de una matriz, mediante la cual se lleve a cabo el seguimiento y control de los CDR expedidos, causados y anulados, con indicación mínimo de su valor, fuente de financiación y vencimiento		Al corte de este informe bimensual, se ha realizado una Matriz, la cual es actualizada mensualmente. A la fecha se encuentra actualizada al 30 de septiembre del año 2017 dando a conocer estas características.	1	1	0	100%
	Control del presupuesto de los recursos que están en el Consorcio FIA en el marco del PDA-PAP	Elaboración de una matriz, mediante la cual se lleve a cabo el seguimiento y control de los CDR expedidos, causados y anulados, con indicación mínimo de su valor, fuente de financiación y vencimiento		Al corte de este informe bimensual, se ha realizado una Matriz la cual es actualizada mensualmente sobre el control de CDR's mostrando su fuente, vencimiento, valor.	1	1	0	100%
	Elaborar informes periódicos a los organismos de control, entidades y corporaciones del Orden Nacional, Departamental y Municipal sobre la ejecución del PAP PDA Caquetá	Informes entregados a solicitud de los organismos de control, entidades y corporaciones del Orden Nacional, Departamental y Municipal		En este corte bimensual no se efectuó ninguna entrega de información a entes de control, por lo tanto se continúa con Dos (2) Informes entregados a la Contraloría General	2	2	0	100%
				Cuatro (4) informe entregado al MVCT, respecto a subsidios APSB.	4	4	0	100%
	Organizar y programar los comités directivos	No. De Comités Requeridos, Convocados, realizados y Actas Elaboradas con sus respectivos soportes.		Cuatro (4) sesiones de Comité Directivo del PAP-PDA, con su respectiva Acta.	4	4	0	100%
	Estructurar y ajustar el PAEI 2017 para ser presentado al Comité Directivo del PAP - PDA	PAEI actualizado y ajustado cuando se requiera		Tres (3) actualizaciones y ajuste al PAEI 2017, en la sesión de Comité Directivo Virtual No. 23, 24 y 25 del PAP-PDA	3	3	0	100%
	Modificaciones a los Convenios de Vinculación de los municipios del Departamento del Caquetá al esquema del Programa AGUAS PARA LA PROSPERIDAD PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA y patrimonio autónomo	Elaboración de la base de datos que contenga la existencia de infraestructura de agua potable y saneamiento básico urbana competencia del PAP PDA Caquetá	1 Actas de liquidación y 1 nuevo convenio celebrados para la vinculación al PAP- PDA Caquetá	Desarrollada 1 acta de liquidación al CCAF de 2010 y suscrito un nuevo CCAF de vinculación al PDA correspondiente al municipio de Cartagena del Chairá	1	1	0	100%
15 actas modificatorias a los Convenios de la vinculación de los municipios al PAP PDA y patrimonio autónomo con forma a lo establecido en decreto 1077 de 2015			Suscritas 12 modificaciones a los CCAF correspondiente a los municipios de Albania, Belén de los Andaquíes, Curillo, El Doncello, Florencia, La Montañita, Milán, Morelia, Puerto Rico, Valparaíso, Solano y San José del Fragua.	15	12	0	80%	
Actualización de la línea base de la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillo y aseo de la zona urbana y rural de los Municipios vinculados al PAP-PDA Caquetá		12 municipios visitados y verificados en su infraestructura de agua potable y saneamiento básico	Tres (3) municipios (San José del Fragua, Albania y Curillo) visitados y verificados en su infraestructura de APSB.		12	3	0	25%
		Matriz compilatoria de la información recolectada respecto de la prestación de los servicios A.A.A. en la zona urbana	Se realizó matriz compilatoria para retroalimentar la información de los servicios A.A.A. en la zona urbana. Se actualizaron los hallazgos técnicos presentados en los municipios de San José, Albania y Curillo		1	1	0	100%
		Matriz compilatoria de la información recolectada respecto de la prestación de los servicios A.A.A. en la zona rural	Se realizó matriz compilatoria para retroalimentar la información en la zona rural (Centros poblados de los municipios: San Vicente del Caguán (Inspección de Campo Hermoso), Valparaíso (Inspección de Playa Rica), Paujil (Inspección de Bolivia), Montañita (Inspección de La Unión Peneya, El Triunfo y Mateguadua), Puerto Rico (Inspección de Río Negro, Lusitania y La Chipa), Doncello (Inspección de Puerto Manrique y Maguaré), San José del Fragua (Zabaleta)		1	1	0	100%
	10 municipios acompañados en la puesta en marcha y/o creación del FSRI	En Proceso de Estructuración del Cronograma de Acompañamiento y selección de los municipios.		10	10	0	100%	

Fortalecimiento, acompañamiento y seguimiento a los municipios y operadores de los servicios públicos domiciliarios en el Departamento del Caquetá	Ocho (08) municipios en proceso de entrega de las obras terminadas y ejecutadas en el PAP- PDA	El Proyecto del Acueducto del Municipio de Puerto Rico, será el primero en terminarse en esta vigencia, aproximadamente el contratista espera entregar la obra el día 29 de septiembre al PDA. Se está coordinando realizar la entrega al Municipio con la participación del Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, el Señor Gobernador y el Gestor del PDA.	8	1	1	13%	
	8 prestadores rurales acompañados para implementar los aspectos financieros, administrativos y comerciales de conformidad con los lineamientos de la Superservicios	Actualmente se está desarrollando el levantamiento de información para determinar el prestador de los servicios públicos que aplique, de conformidad con la ejecución de los proyectos en las zonas rurales, donde se iniciara con el acompañamiento a los prestadores rurales de la Inspección de Playa Rica e Inspección de Bolivia, donde actualmente cuentan con infraestructura en buena funcionalidad y con sistema de tratamiento para el suministro de agua potable	8	0	0	0%	
	4 informes trimestrales en los que se evidencia el acompañamiento	Se cuenta con (2) informes	4	2	0	50%	
	4 capacitaciones a ESP en los Municipios del Departamento del Caquetá.	se realizo cuatro (4) capacitaciones sobre: Mecanismos para Proceder en Caso de Conexiones Fraudulentas, Procedimientos Legales que les Permita Realizar el Cobro de Cartera Morosa a las Empresas de Servicios Públicos. Implementación de los fondos de solidaridad y recursos y reintegros y Asesoría para estructurar un modelo de planeación y gestión de las empresas prestadoras de agua potable y saneamiento básico.	4	4	0	100%	
	Seguimiento y Coordinación en el avance del PAP- PDA Caquetá	Supervisión al cumplimiento de productos contratados y ejecutados por el gestor en temas relacionados con el fortalecimiento institucional.	En cumplimiento a la supervisión del contrato No. 033 de 2017, el Interventor a entregado 4 Informes correspondientes a los meses de julio, agosto, septiembre y octubre de los corrientes. Con la entrega de los Informes se realiza seguimiento y control de la ejecución de la Implementación del Plan de Aseguramiento de la Prestación de los Servicios Públicos del Departamento del Caquetá.	1	1	0	100%
		3 informe final	El alcance del informe No. 9, la Interventoría presenta el estado de ejecución de la consultoría con respecto al cumplimiento del cronograma de entrega de los productos que presenta una ejecución baja.	1	0	1	0%
			El Informe final de la Implementación del Plan de Aseguramiento está previsto al término del contrato que se contempla para el día 8 de diciembre de 2017.	2	0	2	0%
	Acompañamiento y seguimiento en los procesos de Gestión y fortalecimiento Empresarial.	Municipios en su proceso de certificación ante la SSPD de conformidad con la Ley 1176/07 y el Decreto 1077/15 y demás normas vigentes.	Se espera la entrega total de los actos administrativos por parte de la Superservicios, para la identificación de los municipios con riesgo de descertificarse, para Iniciar el proceso de acompañamiento al nuevo proceso de certificación vigencia 2017.	2	1	1	50%
		Acompañamiento a los 4 municipios del Departamento que están descertificados, para que se certifiquen	La alcaldesa del Municipios de Milán, allega Resolución No. SSPD 20174010137185 del 8 de agosto de los corrientes, donde la SSPD descertifica al municipio respecto a la vigencia 2016. El PDA inicio trámite para apoyar en la estructuración del recurso de reposición, el cual se debe presentar antes de 10 de días hábiles desde el momento de notificación. NOTA ACLARANDO META: Se tenía como producto 4 municipios, de los cuales el municipio de Cartagena del Chaira y Solano colocaron recurso de apelacionan del acto administrativo que decertificaba ante la SSPD y se certificaron; es por eso que se registra como Meta producto el	2	2	2	100%
		Procesos de empalme con los 4 municipios descertificados	Un (1) proceso de empalme con el municipio de Solano, en virtud de la certificación para la administración de los recursos del SGP-ASPB correspondiente a la vigencia 2015, en aras de la entrega formal de los movimientos presupuestales realizados por el Departamento e información generada en los procesos de entrega de proyectos pendientes por ejecutar para el cumplimiento de acciones constitucionales y necesidades reportadas por el municipio. NOTA: Se ajusta la Meta Producto, de acuerdo al planteamiento del inciso anterior Lo anterior se evidencia mediante acta, la cual reposa en el expediente del referido municipio.	2	2	0	100%
Acompañamiento a los municipios y operadores de los servicios públicos domiciliarios en los procesos de certificación anual en SGP - ASPB y asistencia al	15 operadores de servicios públicos domiciliarios apoyados en reporte en el sistema único de información - SUI de la SSPD	Socialización de la implantación del Plan de Aseguramiento, consultor, interventor y PDA Caquetá, actividad se evidencia en los Informes de Interventoría	15	15		100%	

reporte de la información al SUI.	Decreto de Incorporación de los recursos del SGP - APSB	La gobernación a través del PDA, asumió la administración de los recursos de los municipios descertificados, por el incumplimiento de los requisitos establecidos en el Decreto 1077 de 2015, pero para esta vigencia no hubo otro municipio descertificado, por lo que se continúa trabajando con los municipios de Curillo y Milán buscando su certificación.	2	2		100%
	Informes de Cargue al FUT de los recursos de los municipios descertificados	Consultada la plataforma CHIP de la Contaduría General de la Nación, se puede establecer que el área de presupuesto del Departamento realizó los reportes correspondientes al tercer trimestre de los municipios descertificados de Milán y Curillo.	2	2		100%
	3 capacitaciones	Dos (2) capacitaciones simultáneas en dos temáticas: Contratación dirigida a E.S.P.D. y Seguimiento y Monitoreo de los recursos del SGP-APSB, en aras de acoplar municipios de la zona sur (Curillo, Albania, San José del Fragua, Belén de los Andaquíes, Morelia, Solita Florencia y Valparaiso) y municipios de la zona norte (San Vicente del Caguán, Puerto Rico, El Doncello, El Paujil, La Montañita, Cartagena del Chalra, Milán y Solano); fue dirigida a Secretarios de Planeación, Hacienda, Gerente de las E.S.P.D. y Concejales. Lo anterior se realizó en el Municipio de Belén de los Andaquíes (Sur) y municipio de El Paujil (Norte) El día 21 de septiembre se realizó la capacitación de las resoluciones 1063 de 2016 y 0672 de 2015, normatividad y reglamentación vigente para la viabilización de proyectos en el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico. Realizada en Florencia con presencia de la Ing. Martha Gutiérrez del MVCT.	3	4	0	133%
	2 capacitaciones	Se realizaron capacitaciones a las empresas de servicios públicos de los 15 municipios en los temas de Manual de Contratación, Estudios de Costos y Tarifas y Cargue de Información al SUI, durante el mes de agosto y septiembre de los corrientes.	15	15	0	100%
	Proyectos revisados y listos para viabilizar por Ventanilla Dptal.	<p>Seis (6) proyectos viabilizados en Ventanilla Única Departamental, mediante Acta de Comité Técnico No: 02 del 21 de abril de 2017, No. 03 del 14 de julio de 2017 y la No. 04 del 08 de septiembre de 2017:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Construcción Alcantarillado Sanitario y PTAR para la Inspección de Zabaleta en el Municipio de San José del Fragua. (Viabilizado) 2. Construcción de la Red de Alcantarillado Pluvial del Barrio La Alternativa de Todos, Municipio de La Montañita, Departamento del Caquetá. (Viabilizado) 3. Construcción del Sistema de Alcantarillado en Diferentes Zonas Urbanas del Municipio de Puerto Rico - Departamento del Caquetá. (Viabilizado). 4. CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR BARRIOS LAS PALMERAS Y LIMONAR DEL MUNICIPIO DE CARTAGENA DEL CHAIRA". 5. CONSTRUCCIÓN 2ª ETAPA DEL COLECTOR- INTERCEPTOR Y EMISARIO FINAL DE AGUAS RESIDUALES SOBRE LA QUEBRADA EL IGUÁ DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PUERTO RICO, CAQUETÁ 6. CONSTRUCCIÓN DE CELDA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL RELLENO SANITARIO PARA LA DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS ORDINARIOS GENERADOS EN LA INSPECCION DE SAN ANTONIO DE GETUCHA Y LA CABECERA MUNICIPAL DE MILAN- CAQUETÁ 7. RECONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SUMINISTRO DE AGUA Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA INSPECCION DE MONONGUETE DEL MUNICIPIO DE SOLANO (CAQUETÁ) 8. CONSTRUCCION DE BOX COULVERT DE CANAL CERRADO EN EL CAÑO BRISAS DEL HACHA UBICADO EN LA COMUNA NORTE DEL MUNICIPIO DE FLORENCIA. 9. REHABILITACION Y CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN Y ACCESO A CASETA DE BOMBEO SOBRE EL RIO BODOQUERO CAPTACION DE AGUA SUPERFICIAL DEL ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MORELIA, CAQUETÁ 		9	4	

<p>revisar y ajustar los proyectos para su presentación ante el MVCT y Ventanilla Dptal. (15)</p>		<p>10. CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO NO CONVENCIONAL -TIPO CONDOMINIAL SIN ARRASTRE DE SOLIDOS EN LOS SECTORES PERIURBANOS DE TIERRA SANTA Y LA ISLA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA</p> <p>11. Optimización sistema de acueducto en sus componentes de captación, aducción, desarenador, conducción, PTAP, tanque de almacenamiento y redes de distribución para el municipio de Solano</p> <p>12. Optimización de la PTAP y ampliación de cobertura del acueducto del corregimiento de San Antonio de Getuchá, municipio de Milán - Departamento del Caquetá</p> <p>13. Construcción del alcantarillado, incluye PTAR de la vereda Campoalegre Km 18 del municipio de Valparaiso</p>	15			93%
<p>Estructuración en la revisión, ajustes, presentación y ejecución de proyectos.</p>	<p>Proyectos revisados y listos para viabilizar por MVCT</p>	<p>1. Un (1) proyecto revisado y presentado al MVCT, denominado "Construcción segunda fase acueducto regional para los municipios de San José del Fragua, Albania y Curillo del Departamento del Caquetá.</p> <p>2. CONSTRUCCION NUEVA LINEA DE CONDUCCION DEL ACUEDUCTO CARAÑO PTAP EL DIVISO- FLORENCIA.</p> <p>3. OPTIMIZACION Y TERMINACION ACUEDUCTO REGIONAL DE MORROSECO MUNICIPIOS DE PUERTO RICO Y SAN VICENTE DEL CAGUAN, CAQUETÁ.</p> <p>4. CONSTRUCCION SISTEMA DE ABASTECIMIENTO RURAL DE GRANO DE ORO EN LA INSPECCION DE LA ESMERALDA, MUNICIPIPI DE PUERTO RICO, CAQUETÁ. ESTE PROYECTO SE SOLICITO EL RETIRO DEL MVCT.</p> <p>5. Optimización sistema de acueducto en sus componentes de captación, aducción, desarenador, conducción, PTAP, tanque de almacenamiento y red de distribución para el municipio de El Paujil - Caquetá Primera FASE</p> <p>6. Estudio y diseño para la construcción red de acueducto y planta de tratamiento de agua potable para el casco urbano del municipio de Morelia".</p>		5	0	
<p>Presentar proyectos para atender los componentes rurales, indígenas del departamento.</p>	<p>4 proyectos revisados y listos para viabilizar por MVCT y Ventanilla Dptal.</p>	<p>Se encuentran seis (6) proyectos en revisión y proceso de ajustes:</p> <p>1. Construcción de Acueducto por Bombeo y Planta de Tratamiento para la Inspección de Campo Alegre municipio de Solano, Caquetá. (Retiro por parte del Municipio).</p> <p>2. Construcción acueducto de las veredas El Recreo, Carmen, Reforma, Bocana Luna y Matecaña del municipio de San José de Fragua y Salamina del municipio de Curillo.</p> <p>3. Optimización del acueducto del corregimiento de Granario en el municipio de Milán del departamento del Caquetá.</p> <p>4. Optimización del acueducto del corregimiento de La Ilusión en el municipio de Milán del departamento del Caquetá Construcción del acueducto y alcantarillado para la población indígena de Gorgonia en el municipio de Milán del departamento del Caquetá.</p> <p>5. Optimización del acueducto del corregimiento de La Ilusión en el municipio de Milán del departamento del Caquetá Construcción del acueducto y alcantarillado para la población indígena de Gorgonia en el municipio de Milán del departamento del Caquetá.</p> <p>6. Diseño de Alcantarillado Sanitario y Sistema de Tratamiento para las aguas residuales para el centro poblado de Campoalegre del municipio de Solano Departamento de Caquetá. (en ajustes por parte de la Entidad).</p> <p>7. Estudios y Diseños para la Construcción del Sistema de Alcantarillado incluyendo tratamiento, para la Inspección de Bolivia municipio del Paujil, Departamento del Caquetá. (Devuelto al Municipio para ajustes).</p>	4	0	6	0%
<p>Atención de emergencias locales en los sistemas de acueducto, alcantarillado y aseo de los municipios vinculados.</p>	<p>Informes de visitas (escrito y registro fotográfico), recepción y revisión de proyectos de emergencia</p>	<p>No se ha presentado emergencias</p>	0	0	0	
		<p>1. Visita técnica y socialización del proyecto acueducto regional segunda fase. (1 vista técnica)</p>				

	Supervisión, monitoreo y seguimiento a los proyectos de Agua potable y saneamiento básico.	25 visitas técnicas de verificación y ajuste a los proyectos.	2. Visita técnica y socialización del proyecto Mejoramiento del Sistema de Acueducto del Corregimiento La Esmeralda del Municipio de Puerto Rico - Caquetá. (2 vistas técnicas) 3. Visita técnica al proyecto de Optimización sistema de acueducto en sus componentes de captación, desarenador, conducción, PTAP, tanque de almacenamiento y red de distribución para el municipio de El Paujil - Caquetá <u>Primera FASE (1 vista técnica)</u> 4. Visita técnica al proyecto de Optimización sistema de acueducto en sus componentes de captación, aducción, desarenador, conducción, PTAP, tanque de almacenamiento y redes de distribución para el municipio de Solano. (1 vista técnica) 5. Visita técnica al proyecto de Construcción de celda y obras complementarias en el relleno sanitario para la disposición final de residuos sólidos ordinarios generados en la inspección de San Antonio de Getuchá y cabecera municipal de Millán - Caquetá (1 vista técnica) 6. Visita técnica y socialización del proyecto Estudios y Diseños para la Construcción de Red de Acueducto y Planta de Tratamiento de Agua Potable para el Casco Urbano del Municipio de Morelia. (2 vistas técnicas)	25	8	0	32%
	Supervisión, monitoreo y seguimiento a la ejecución de la contratación de obras, interventorías y consultorías desarrolladas en el marco del PAP PDA del Caquetá	10 supervisiones realizadas a los contratos 8 obras o acciones entregadas a la comunidad en funcionamiento	Se están llevando a cabo ocho (8) supervisiones a contratos en ejecución, No se han entregado obras hasta el momento	10 8	8 0	0 1	80% 0%
	Elaboración de los pre pliegos y pliegos definitivos para la contratación de los estudios, diseños, obras e Interventorías que formen parte del PAP PDA Caquetá de conformidad con las aprobaciones y demás conceptos impartidos por el Comité Directivo	Realización de trece (13) procesos de selección para contratar lo proyectado	Se llevó a cabo seis (6) procesos de selección para contratar los proyectados: Licitación e Interventoría. 1. Construcción del Sistema de Alcantarillado en Diferentes Zonas Urbanas del Municipio de Puerto Rico-Caquetá", (obra e interventoría). 2. Construcción de Red de Alcantarillado Pluvial del Barrio Alternativa de Todos, Municipio de La Montañita Departamento de Caquetá, (obra e interventoría). 3. Consultoría para la Actualización y/o Formulación de los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (Psmv), Actualización de Los Programas para El Uso Eficiente y Ahorro Del Agua (Pueaa) y Actualización de los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos (Pgirs), en el Marco del Plan Ambiental del PAP-PDA Caquetá. (consultoría e interventoría) 4. Construcción Alcantarillado Sanitario y PTAR para la Inspección de Zabaleta en el Municipio de San José del Fragua. (Viabilizado) 5. CONSTRUCCIÓN 2ª ETAPA DEL COLECTOR- INTERCEPTOR Y EMISARIO FINAL DE AGUAS RESIDUALES SOBRE LA QUEBRADA EL IGUÁ DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PUERTO RICO, CAQUETÁ" 6. CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR BARRIOS LAS PALMERAS Y LIMONAR DEL MUNICIPIO DE CARTAGENA DEL CAQUETÁ (12) Centros poblados verificados y complementados en la base de datos Mateguadua, triunfo, unión Peneya (La Montañita) Bolivia (Paujil) Maguare, Puerto Manrique (El Doncello) Rionegro, Lusitania, La Chipa (Puerto Rico) Campo hermoso (San Vicente del Caguán) Playa Rica (Valparaiso) Zabaleta (San José del Fragua).	13	12	0	92%
	Complementar la base de datos que contenga la existencia de infraestructura de agua potable y saneamiento básico de los centros Poblados de competencia del PAP PDA Caquetá.	8 centros poblados verificados y en base de datos.	datos Mateguadua, triunfo, unión Peneya (La Montañita) Bolivia (Paujil) Maguare, Puerto Manrique (El Doncello) Rionegro, Lusitania, La Chipa (Puerto Rico) Campo hermoso (San Vicente del Caguán) Playa Rica (Valparaiso) Zabaleta (San José del Fragua).	8	12	0	150%
	Elaborar los planes de acción por municipios en concertación con los alcaldes, para establecer las necesidades básicas en el sector	15 Planes de acción elaborados y concertados con cada uno de los municipios	Trece (13) Planes de Acción elaborados, concertados, quedando pendiente los municipios de San Vicente, Solita y Albania.	15	13	1	87%
	Diseñar de acuerdo a la Res. 1063/2015 los indicadores para el sector de Agua Potable y Saneamiento Básico	Diseño de matriz que establezca los lineamientos para formulación de las metas de cobertura, calidad y continuidad en la prestación de los servicios públicos de AAA	Diseñada una (1) matriz con la información, de acuerdo a la normatividad vigente	1	1	0	100%
	Ajuste, actualización y seguimiento de plan anual estratégico y de inversiones del PAP PDA Caquetá.	Informe bimensuales del PAEI 2017 ante el Comité Directivo	Un (1) informe Tres (3) informes bimensuales que evidencia el seguimiento al PAEI 2017 y al cumplimiento de las actividades para su ejecución.	6	3	0	50%
	Preparar instrumentos de planeación y modificación a los mismos de ser necesarios	Plan de Aseguramiento (control), concertados para ser presentados al comité directivo para su aprobación	El ejecutor del Plan de Aseguramiento estructura modificadorio al Anexo Técnico de las actividades y productos.	1	1	0	100%
Socialización y divulgación de los planes, programas y proyectos del PDA y de las políticas del PAP	Rediseñar y/o Actualizada la Pagina Web del PAP PDA	Página Actualizada	Se rediseño y se actualizo el sitio web.	1	1	0	100%
	Implementar una estrategia comunicacional efectiva entre el PAP - PDA Caquetá y los actores vinculados	Realizar 16 socializaciones a los municipios vinculados al PAP-PDA Caquetá, respecto del uso del correo institucional a través de la página Web del PAP-PDA Caquetá	Realizar 16 socializaciones a los municipios vinculados al PAP-PDA Caquetá.	16	16	0	100%

Social y logística

<p>Visitas de obras y presentación de resultados</p>	<p>15 reuniones informativas con la comunidad.</p>	<p>Se realizó cuatro (4) reunión con la comunidad beneficiada del proyecto "Construcción del Sistema de Alcantarillado en Diferentes Zonas Urbanas del Municipio de Puerto Rico Departamento del Caquetá".</p> <p>Se realizó dos (2) reunión con la comunidad beneficiada del proyecto: OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO (ADECUACION BOCATOMA, DESARENADOR, CAMBIO DE RED DE CONDUCCION, ADECUACION PTAP) PARA EL MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES- CAQUETÁ</p> <p>Se realizó dos (2) reunión con la comunidad beneficiada del proyecto: OPTIMIZACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PUERTO RICO- CAQUETA</p> <p>Se realizó cuatro (4) reunión con la comunidad beneficiada del proyecto: Se realizó una (1) reunión con algunos miembros de la comunidad del proyecto "Construcción Red de Alcantarillado Pluvial del Barrio la Alternativa de Todos, Municipio de La Montañita - Caquetá"</p>	<p>15</p>	<p>13</p>	<p>0</p>	<p>87%</p>
<p>Divulgar e informar a la comunidad de los proyectos de acueductos y saneamiento básico a ejecutar en los municipios que pertenecen al PAP- PDA Caquetá</p>	<p>Realizar 15 reuniones en las comunidades en donde el PAP PDA del Caquetá realizará inversiones.</p>	<p>Se realizó una (1) reunión con la comunidad que se beneficiara con el proyecto: "Construcción del Sistema de Alcantarillado en Diferentes Zonas Urbanas del Municipio de Puerto Rico Departamento del Caquetá".</p> <p>Se realizó una (1) reunión con la comunidad que se beneficiara con el proyecto: "Construcción Red de Alcantarillado Pluvial del Barrio la Alternativa de Todos, Municipio de La Montañita - Caquetá"</p> <p>Se realizó diecinueve (19) visitas:</p>	<p>15</p>	<p>2</p>	<p>0</p>	<p>13%</p>
<p>Visitas técnicas, sociales, de fortalecimiento institucional, ambientales y jurídicas a los Municipios Vinculados y en especial donde se ejecutan obras</p>	<p>Número de visitas realizadas a los Municipios, corregimientos y sector rural del Departamento, participantes del PAP- PDA CAQUETA</p>	<p>contrato de interventoría No. 030 de 2013 "Optimización del Sistema de Acueducto para el Municipio de Belén de los Andaquíes".</p> <p>Contrato No. 518 "Construcción del sistema de alcantarillado en diferentes zonas urbanas del Municipio de Puerto Rico, Departamento del Caquetá".</p> <p>Contrato de obra No. 004 de 2017 "Optimización y ampliación del sistema de acueducto del casco urbano del municipio de Puerto Rico - Caquetá".</p> <p>Contrato No. 524 "Construcción red de alcantarillado pluvial del barrio la alternativa de todos, Municipio de La Montañita, Departamento del Caquetá"</p>	<p>25</p>	<p>19</p>	<p>0</p>	<p>76%</p>
<p>Participación del Gestor y su equipo a nivel nacional e internacional</p>	<p>Número de visitas realizas</p>	<p>Dos (2) visita realizadas: Participación del Gestor en el Congreso Nacional de ACODAL y encuentro de Gestores en la ciudad de Bogotá.</p>	<p>2</p>	<p>2</p>	<p>0</p>	<p>100%</p>
<p>Acompañamiento en las Capacitaciones que realice el MVCT, Entidades de cualquier orden, del sector y/o por los Entes de Control.</p>	<p>Número de capacitaciones realizadas</p>	<p>Cinco (5) acompañamientos en la estructuración, revisión y aprobación del PLAN AMBIENTAL, PLAN DE GESTION SOCIAL 2017-2019 y Capacitación en Manejo de la información cargada al SI OBSERVA a los Entes Territoriales y empresas de Servicios públicos con el acompañamiento de la Contraloría Departamental (Acta). y capacitación por parte del MVCT sobre la presentación de proyectos de la Ventanilla Única Regional y la Resolución 330</p>	<p>6</p>	<p>6</p>	<p>0</p>	<p>100%</p>
<p>Realización de actividades para el fortalecimiento e Integración de los actores participantes del PAP- PDA Caquetá</p>	<p>Número de talleres, foros, seminarios y capacitaciones</p>	<p>Una (1) actividad de información e integración para el fortalecimiento de los actores vinculados (Rendición de cuentas).</p> <p>Se realizó dos (2) campaña socio ambiental para la promoción del reciclaje y separación en la fuente en los Municipios de San José del Fragua y Puerto Milán</p> <p>Y una (1) jornada de limpieza el Municipio de Puerto Milán.</p>	<p>4</p>	<p>4</p>	<p>0</p>	<p>100%</p>
<p>Fortalecimiento y seguimiento al cumplimiento de las metas del PAP- PDA Caquetá</p>	<p>Número de jornadas de trabajo realizadas</p>	<p>Doce (12) jornadas de trabajo y seguimiento con el equipo del Gestor para evaluación al cumplimiento de las metas.</p>	<p>12</p>	<p>10</p>	<p>0</p>	<p>83%</p>

Socialización de proyectos	Número de proyectos socializados	<p>Se realizó la socialización de cinco (5) Proyecto de obra de alcantarillado:</p> <p>"Construcción del Sistema de Alcantarillado en Diferentes Zonas Urbanas del Municipio de Puerto Rico Departamento del Caquetá".</p> <p>"Construcción Red de Alcantarillado Pluvial del Barrio la Alternativa de Todos, Municipio de La Montañita - Caquetá"</p> <p>OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO (ADECUACION BOCATOMA, DESARENADOR, CAMBIO DE RED DE CONDUCCION, ADECUACION PTAP) PARA EL MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES- CAQUETÁ.</p> <p>Optimización y ampliación del sistema de acueducto del casco urbano del municipio de Puerto Rico - Caquetá".</p>	10	5	0	50%
Seguimiento Clubes defensores del agua	Numero de seguimientos	<p>Se realiza seguimiento a los clubes defensores del agua de los municipios de La Montañita, Puerto Rico, Cartagena del Chaira, El Paujil, Puerto Milán, Morelia, Belen de los Andaquies.</p> <p>Institución Educativa Rural Palma Arriba del Municipio de La Montañita.</p> <p>Tres (3) reuniones con la Secretaria de Salud Departamental.</p> <p>Institucion Educativa Agroecologico Amazonico El Paujil</p> <p>Institución Educativa Gabriela Mistral Belen de los Andaquies</p> <p>Internado Rural La Anguilla Puerto Milán</p> <p>Institucion Educativa Acevedo y Gomez Puerto Rico</p> <p>Institución Educativa 7 de Agosto sede primaria Municipio de Cartagena del Chaira</p>	7	7	0	100%
Mesas del Agua	Numero de reuniones de mesas del agua	Se ha realizado tres (3) Mesas de Agua	5	3	0	60%
TOTAL PORCENTAJE DE EJECUCION PRODUCTOS DEL GESTOR PAP-PDA CAQUETÁ 2017.			366	266		73%
